

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SECURITÉ ALIMENTAIRE

**PROGRAMME NATIONAL
DE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE**



MANUEL DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DU PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Rapport final

24/11/2024

Tiana Rambeloma

TABLE DES MATIÈRES

Liste des acronymes.....	6
I. Introduction.....	7
I.1 Objectifs du manuel de suivi-évaluation	7
I.2 Importance du s&e dans le cadre du pnda.....	7
I.2.1 Objectifs du s&e.....	7
I.2.2 Le mécanisme de suivi-évaluation.....	9
I.3 Les principaux concepts utilisés.....	10
II. Cadre de référence.....	12
II.1 Contexte.....	12
II.1.1 Les objectifs du programme	12
II.1.2 Les acteurs principaux et les parties prenantes du programme.....	13
II.1.3 Les bénéficiaires.....	14
II.2 Cadre logique du programme.....	15
II.3 Théorie des changements.....	17
II.4 Cadre des résultats et valeurs cibles du programme.....	20
III. Plan de suivi.....	23
III.1 Planification du suivi.....	23
III.1.1 Suivi des indicateurs de performance.....	23
III.1.2 Suivi des indicateurs environnemental et social	30
III.2 Circuit de la circulation de l'information.....	32
III.3 Rôles des acteurs du pnda dans le suivi et évaluation.....	32
III.4 Gestion des risques.....	33
III.4.1 Identification des risques.....	34
III.4.3 Planification des réponses aux risques et gestion	35
III.4.4 Suivi et contrôle.....	37
IV. Plan d'évaluation.....	38
IV.1 Types d'évaluations	38
IV.2 Questions d'évaluation clés.....	39
IV.3 Méthodes d'évaluation.....	39
IV.3.1 Groupes de discussion (focus groups).....	40
IV.3.2 Études de cas.....	40
IV.3.3 Entretiens avec les parties prenantes	Erreur ! Signet non défini.

IV.3.4	Enquêtes auprès des bénéficiaires	40
IV.3.5	Analyse d'impact.....	40
IV.3.6	Analyse coûts-bénéfices (ACB).....	40
IV.4	Calendrier des évaluations.....	41
V.	Méthodologie de suivi-évaluation	41
V.1	Enquêtes.....	41
V.1.1	Enquête de référence (baseline).....	42
V.1.2	Enquête sur la production	42
V.1.3	Enquête auprès des bénéficiaires	48
V.1.4	Observations directes.....	49
V.1.5	Groupe de discussion (focus group).....	50
V.1.6	Enquête socio-économique auprès des ménages.....	50
V.2	Outils de collecte d'informations.....	52
V.2.1	Questionnaires	52
V.2.2	Crtographie et les systèmes d'information géographique (SIG).....	52
V.2.3	Applications mobiles : Kobocollect	54
V.2.4	Photographies et vidéos	56
V.2.1	Drones	56
V.3	Analyse des données	58
V.3.1	Types de données à analyser.....	58
V.3.2	Différentes techniques d'analyse des données.....	58
V.3.3	Logiciels.....	59
VI.	Mécanisme de suivi-évaluation.....	60
VI.1	Mécanisme de rapportage	60
VI.2	Planification et le rapportage	62
VI.2.1	Plan de travail et budget annuel et les rapports de gestion connexes	62
VI.2.2	Rapports de suivi	64
VI.2.3	Production des rapports	68
VII.	Gestion du suivi-évaluation	69
VII.1	Gestion du système de S&E	69
VII.2	Système d'information automatisé (SIA)	70
VII.3	Système de gestion des données et des documents	71
VII.3.1	Format de données.....	71
VII.3.2	Organisation des données et des documents.....	71

VII.3.3	Stockage de données sur drive	72
VII.4	Capacité de suivi-évaluation : renforcement et planification des compétences	73
VII.4.1	Formations de mise à niveau	73
VII.4.2	Formations spécifiques.....	75
VII.4.3	Renforcement continu des compétences	75
VIII.	Communication et gestion des connaissances.....	77
VIII.1	Capitaliser les expériences et ressortir les bonnes pratiques.....	77
VIII.2	Diffusion des rapports et partage des bonnes pratiques.....	78
VIII.2.1	Diffusion des rapports de suivi et d'évaluation.....	78
VIII.2.2	Partage des bonnes pratiques.....	78
VIII.3	Gestion des connaissances (Knowledge Management) et système d'information intégré.....	79
VIII.3.1	Système d'information intégré (SII).....	80
VIII.3.2	Gestion des connaissances (Knowledge Management)	82
ANNEXES		84
Annexe 1 :	Personnes rencontrées lors de la 1 ^{ère} mission	85
Annexe 2 :	Chronogramme du S&E.....	87
Annexe 3 :	Questionnaire type pour l'enquête sur la production	89
Annexe 4 :	Les étapes de la création d'un questionnaire sur kobotoolbox	92
Annexe 5 :	Les GPS pour le calcul des superficies des champs agricoles	94
Annexe 6 :	Exemple de guide d'entretiens auprès des agriculteurs bénéficiaires	98
Annexe 7 :	Exemple de guide d'entretiens auprès des utilisateurs des infrastructures rurales.....	101
Annexe 8 :	Exemple de guide d'entretiens auprès des mpme agro-industrielles bénéficiaires	105
Annexe 9 :	Exemple de guide d'entretiens auprès des organisations paysannes bénéficiaires.....	108
Annexe 10 :	Exemple de questions pour les focus groupe	111
Annexe 11:	Cadre de mesure des resultats et fiches des indicateurs	113
Annexe 12:	Canevas du PTBA	114
Annexe 13 :	Tableau de bord du PTBA	131
Annexe 14 :	Canevas du rapport de suivi trimestriel.....	132
Annexe 15:	Canevas du rapport annuel.....	144
Annexe 16:	Exemple d'un rapport de capitalisation des expériences.....	159

LISTE DES TABLEAUX

TABEAU 1 : CADRE LOGIQUE	15
TABEAU 2 : CADRE DE RESULTAT ET VALEURS CIBLES DE NIVEAU ODP	20
TABEAU 3: CADRE DE RESULTATS INTERMEDIAIRES ET VALEURS CIBLES	21
TABEAU 4 : PLAN DE SUIVI DES INDICATEURS	23
TABEAU 5: LES INDICATEURS POUR LE VOLET ENVIRONNEMENT ET VBG/EAS/HS.....	30
TABEAU 6: ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS DU PNDA DANS LE SUIVI ET L'EVALUATION	33
TABEAU 7: RISQUES CLES DU PROGRAMME ET MESURES D'ATTENUATION.....	37
TABEAU 8 : CALENDRIER DES EVALUATIONS	41
TABEAU 9 : TAILLE DE L'ECHANTILLON DES AGRICULTEURS BENEFICIAIRES POUR L'ENQUETE SUR LA PRODUCTION	43
TABEAU 8: INSTRUMENTS DE PLANIFICATION ET DE RAPPORTAGE.....	62
TABEAU 11: LES RAPPORTS DE SUIVI	64
TABEAU 12: EXEMPLE DE CALCUL DE TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE GLOBAL D'UNE COMPOSANTE	66
TABEAU 13: EXEMPLE DE CALCUL DE TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE GLOBAL DU PROGRAMME	67
TABEAU 14 : LES FORMATIONS DE MISE A NIVEAU	74
TABEAU 15 : LES FORMATIONS SPECIFIQUES	75
TABEAU 16 : ATELIERS SUR LE RENFORCEMENT CONTINU DES COMPETENCES.....	76
TABEAU 17 : LES OUTILS DE CAPITALISATION ADAPTES AU PNDA	77
TABEAU 18 : LES DIFFERENTS TYPES DE DOCUMENTS RESULTANT DE LA CAPITALISATION	83

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1: LES ACTEURS DU PROGRAMME	14
FIGURE 2 : THEORIE DE CHANGEMENT	19
FIGURE 3 : SCHEMA DE LA CIRCULATION DE L'INFORMATION	32
FIGURE 4 : CRITERES D'EVALUATION DES RISQUES	35
FIGURE 5 : CALENDRIER DE LA COLLECTE DES DONNEES SUR LES RENDEMENTS ET DE L'ENQUETE SUR LA PRODUCTION	48
FIGURE 6 : LES ETAPES DE LA COLLECTE DES DONNEES VIA KOBOCOLLECT	56
FIGURE 7 : LE MECANISME DE SUIVI EVALUATION DU PNDA	61

LISTE DES ACRONYMES

CERC :	Composante d'Intervention d'Urgence
CLER :	Comités Locaux d'Entretien des Routes
CNCT :	Comité National de Coordination Technique
CPCS :	Comité Provinciale de Coordination et de Suivi
CTN :	Comité Technique national
DANTICS :	Direction Archives et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
EAS :	Exploitation et Abus Sexuels
EIES :	Etude d'Impact Environnemental et Social
E&S :	Environnemental et social
FONER :	Fond National d'Entretien Routier
GC :	Gestion des connaissances
INERA :	Institut National d'Etudes et de Recherche Agricoles
MEDD	ministère de l'Environnement et Développement Durable
MinAgri :	ministère de l'Agriculture
MINDER :	Ministère du Développement Rural
MINPEL :	ministère de la Pêche et de l'Elevage
MPME :	Micro, Petite et Moyenne Entreprise
AIN :	Agriculture Intelligent à la Nutrition (AIN)
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OPA :	Organisations des Producteurs Agricoles
OVDA :	Office des Voies de Dessertes agricoles
PNDA :	Programme National de Développement Agricole
PPA	Plan en faveur des Populations Autochtones
RDC :	République Démocratique du Congo
RNA :	Registre National d'Agriculteurs
RPM	Responsable de Passation des Marchés
SENASEM :	Service National des Semences
SENAPEFIC :	Service national de l'élevage familial et intrant connexe
SII :	Système d'information intégré
SFI :	Société Financière Internationale
SNSA :	Service national des statistiques agricoles
SSE :	Spécialiste en Sauvegarde Environnementale
SSS :	Spécialiste en Sauvegarde Sociale
SST :	Santé et Sécurité au Travail
SVBG :	Spécialiste en Violence Basée sur le Genre
UNCP :	Unité Nationale de Coordination du Programme
UPEP :	Unité Provinciale d'Exécution du Programme
VBG :	Violences Basées sur le Genre

I. INTRODUCTION

I.1 Objectifs du manuel de suivi-évaluation

Pour la mise en œuvre du PNDA, il est indispensable d'élaborer un manuel de suivi-évaluation (S&E).

Les objectifs du présent manuel sont de

- **Fournir un cadre méthodologique** : Ce manuel décrit les méthodes et outils de suivi-évaluation qui seront utilisés tout au long du Programme, notamment pour la collecte de données, l'analyse, le rapportage et l'utilisation des résultats.
- **Assurer la cohérence et l'uniformité** : Il établit des procédures standardisées pour toutes les parties prenantes concernant le suivi des activités et des résultats, garantissant ainsi que les informations sont comparables et fiables.
- **Prendre des décisions informées** : En fournissant des données précises et actualisées sur la mise en œuvre du Programme, le manuel permet de rendre compte des succès et des échecs, et aide les gestionnaires à prendre des décisions éclairées pour ajuster les actions en cours si nécessaire.
- **Améliorer la transparence et la responsabilisation** : Il précise les rôles, les tâches et les responsabilités des différents intervenants dans le processus de suivi-évaluation, ainsi que le circuit de gestion, afin de renforcer la transparence et la responsabilisation.

Le manuel de suivi-évaluation est un outil clé pour assurer que les activités du Programme sont bien gérées, les objectifs sont atteints, et que les parties prenantes disposent des informations nécessaires pour améliorer continuellement leurs interventions.

Il s'agit de produire un document simple, efficace et pratique qui doit être pleinement opérationnel, c'est-à-dire facile à utiliser par chaque acteur. Il va être mis à disposition à tous les acteurs au niveau national, provincial et local.

I.2 Importance du S&E dans le cadre du PNDA

I.2.1 Objectifs du S&E

Le suivi et l'évaluation jouent un rôle crucial dans le cadre du PNDA pour plusieurs raisons :

Assurer la mise en œuvre efficace du Programme

- **Contrôle de la conformité** : Le S&E permet de vérifier que les activités du PNDA sont mises en œuvre conformément aux plans et aux objectifs fixés. Cela aide à identifier et à corriger les écarts avant qu'ils n'affectent gravement le Programme.
- **Optimisation des ressources** : En surveillant régulièrement les dépenses et les activités, le S&E aide à garantir que les ressources soient utilisées de manière efficace et qu'elles atteignent les résultats souhaités.

Mesurer les progrès et les résultats

- Évaluation des performances : Le S&E fournit des données pour évaluer les progrès du Programme par rapport aux objectifs établis. Cela aide à déterminer si le PNDA atteint les résultats escomptés en matière de productivité agricole, d'accès aux marchés, et de soutien aux petits exploitants.
- Identification des résultats : Il permet de repérer les aspects du Programme qui fonctionnent bien et les bonnes pratiques qui peuvent être étendues ou reproduites dans d'autres contextes.

Informar les décisions stratégiques

- Adaptation des interventions : Les données de S&E fournissent des informations essentielles pour ajuster les stratégies et les activités du Programme en fonction des besoins changeants et des résultats observés.
- Planification future : Les résultats de S&E aident à formuler des recommandations pour la planification future du Programme, en identifiant les leçons apprises et les domaines nécessitant des améliorations.

Assurer la responsabilité et la transparence

- Justification des dépenses : Le S&E aide à garantir que les fonds sont utilisés de manière appropriée et conformément aux objectifs du Programme, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des donateurs et des parties prenantes.
- Rapport aux partenaires : Il fournit des bases solides pour les rapports aux partenaires financiers et aux autres parties prenantes, assurant la transparence et la responsabilité dans la gestion du Programme.

Améliorer l'impact et la durabilité

- Évaluation des impacts : Le S&E permet d'évaluer l'impact réel du Programme sur les bénéficiaires, y compris les changements dans la productivité agricole, les revenus, et la qualité de vie des petits exploitants.
- Renforcement de la durabilité : En identifiant les succès et les défis, le S&E contribue à renforcer la durabilité des interventions en ajustant les pratiques et en consolidant les acquis.

Faciliter la participation des bénéficiaires

- Engagement des communautés : Le S&E encourage la participation active des bénéficiaires dans le processus de suivi et d'évaluation, ce qui améliore la pertinence des interventions et l'adhésion des communautés aux activités du Programme.
- Recueil de feedback : Il fournit un mécanisme pour recueillir les retours des bénéficiaires, ce qui permet d'adapter les interventions aux besoins réels et aux attentes des populations ciblées.

Promouvoir l'apprentissage et l'innovation

- Capitalisation des leçons apprises : Le S&E aide à documenter les leçons apprises et à partager les connaissances acquises avec les parties prenantes et les autres Programmes.
- Encouragement de l'innovation : En identifiant les défis et les opportunités, le S&E stimule l'innovation et l'amélioration continue des pratiques agricoles et des interventions du Programme.

Renforcer la coordination et la collaboration

- Harmonisation des efforts : Le S&E facilite la coordination entre les différents acteurs du Programme, y compris les ministères, les agences locales, et les partenaires internationaux, assurant une approche intégrée et cohérente.
- Partage de l'information : Il permet de partager les informations et les résultats avec toutes les parties prenantes, favorisant une collaboration efficace et une prise de décision collective.

En résumé, le suivi et l'évaluation sont essentiels pour garantir que le PNDA atteigne ses objectifs, utilise les ressources de manière efficace, et a un impact positif durable sur les communautés agricoles. Ils assurent la transparence, la responsabilité, et l'amélioration continue du Programme.

I.2.2 Le mécanisme de suivi-évaluation

Le mécanisme de suivi-évaluation comprend plusieurs étapes clés qui permettent de garantir que les objectifs du Programme soient atteints de manière efficace et efficiente.

Étape 1 : Planification

- *Définition des objectifs* : Identifier les objectifs du Programme agricole et déterminer ce qui doit être surveillé et évalué.
- *Identification des indicateurs* : Sélectionner les indicateurs de performance clés qui permettront de mesurer les progrès vers les objectifs.
- *Élaboration du plan de suivi-évaluation* : Créer un plan détaillé qui définit les méthodes de collecte de données, les responsabilités, les fréquences de collecte, et les ressources nécessaires.

Étape 2 : Suivi des indicateurs, collecte des données

- *Mise en place des outils de collecte de données* : Développer ou adapter des outils tels que des questionnaires, des formulaires d'enquête, des registres, ou des systèmes de suivi numérique.
- *Collecte des données*

Étape 3 : Analyse des données

- *Analyse des résultats* : Utiliser des méthodes statistiques et autres outils analytiques pour interpréter les données en fonction des objectifs et des indicateurs définis.

- *Identification des écarts* : Comparer les résultats obtenus avec les objectifs prévus pour identifier les écarts et les domaines nécessitant une attention particulière.

Étape 4 : Rapportage

- *Rédaction des rapports de suivi* : Produire des rapports périodiques qui présentent les résultats des analyses, les progrès réalisés, et les écarts identifiés.
- *Communication des résultats* : Partager les résultats avec les parties prenantes concernées à travers des présentations, des réunions, ou des publications.

Étape 5 : Prise de décision et ajustements

- *Feedback et recommandations* : Utiliser les résultats du suivi-évaluation pour fournir des recommandations sur les ajustements nécessaires dans la mise en œuvre du Programme.
- *Adaptation du Programme* : Réviser les stratégies, les activités ou les ressources du Programme en fonction des recommandations issues du suivi-évaluation pour améliorer son efficacité.

Étape 6 : Évaluation

- *Évaluation sommative* : À la fin du Programme, mener une évaluation globale pour mesurer l'impact du Programme, évaluer la durabilité des résultats, et tirer des leçons pour de futures interventions.
- *Apprentissage et capitalisation* : Documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises pour améliorer la conception et la mise en œuvre des futurs Programmes agricoles.

Étape 7 : Communication et gestion des connaissances

- *Conservation des données et des rapports* : Organiser et archiver les données collectées, les analyses, et les rapports pour une utilisation future.
- *Diffusion des leçons apprises* : Partager les leçons et les bonnes pratiques avec une plus large communauté pour influencer les politiques agricoles et améliorer d'autres Programmes.

I.3 Les principaux concepts utilisés

Voici les principaux termes fréquemment utilisés dans ce manuel :

- **Le Système de Suivi-Évaluation (S&E)** est défini comme un processus de collecte systématique, d'analyse et d'exploitation des données visant à améliorer la gestion et la mise en œuvre du Programme en fournissant les informations utiles à l'appréciation de l'état d'avancement, des performances et de l'impact des actions de ce projet.
- **L'objectif** traduit un état souhaité que le Programme se propose d'atteindre dans une durée déterminée.
- **L'objectif de développement du Programme (ODP)** décrit le résultat global ou l'impact que le Programme vise à atteindre à long terme. Cet objectif répond à la question "Pourquoi

réalisons-nous ce Programme ?" Il se concentre sur les bénéfices ou les changements que le projet apportera à un niveau global ou communautaire.

- **L'objectif spécifique** est une déclaration plus précise et concrète qui définit ce que le Programme doit accomplir à court ou moyen terme pour contribuer à l'objectif de développement. Cet objectif est généralement mesurable et réalisable dans le cadre du Programme. Il est directement lié aux activités du projet et doit répondre à la question "Qu'est-ce que nous devons accomplir pour atteindre notre objectif de développement ?"
- **Le Système de Suivi-Évaluation** est défini comme un ensemble intégré qui englobe les processus de planification, de collecte systématique de données, d'analyse, d'exploitation, de synthèse, et de circulation de l'information, et qui prévoit les moyens et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre le système en vue d'améliorer la base de prise de décision dans le cadre de la gestion et la mise en œuvre du projet ou de la capitalisation de ses expériences.
- **Le cadre logique (ou Cadre des résultats)** est un outil de planification et de gestion qui identifie les objectifs du Programme, les résultats attendus, les activités, et les indicateurs associés.
- **Les activités** sont des actions entreprises ou travaux menés en vue de produire des réalisations spécifiques. L'activité mobilise des ressources telles que des fonds, une assistance technique et d'autres types de moyens.
- **Les résultats intermédiaires** sont les effets ou les changements mesurables qui se produisent avant l'atteinte des résultats finaux ou des objectifs globaux du projet. Contrairement aux résultats finaux qui peuvent prendre des années à se concrétiser, les résultats intermédiaires peuvent être observés dans des délais plus courts, souvent pendant la durée de vie du projet.
- **La théorie du changement** explique en détails le comment et le pourquoi un ensemble d'activités et d'interventions spécifiques devrait entraîner les résultats désirés et à un impact à long terme. C'est une représentation visuelle ou narrative des hypothèses et des liens logiques entre les actions du Programme et les changements attendus.
- **Un indicateur** est un outil de mesure quantitatif ou qualitatif utilisé pour évaluer l'avancement et l'efficacité du Programme. Les indicateurs permettent de suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés, d'identifier les succès ou les problèmes, et de guider les décisions futures.
- **Les indicateurs de résultats** mesurent les effets immédiats des activités
- **Les indicateurs d'impact** mesurent les effets à long terme ou les changements globaux
- **Le plan de suivi et d'évaluation** est un tableau qui s'appuie sur le cadre logique du Programme pour détailler les principales exigences en ce qui concerne le suivi et l'évaluation de chaque indicateur et hypothèse. Les principales informations détaillant la façon de mesurer les indicateurs clés sont résumées dans le tableau : définition détaillée des données, sources, méthodes et calendrier de la collecte, personnes responsables et public ciblé, et utilisation des données.
- **Les parties prenantes** sont un groupe de personnes ayant un rôle ou un intérêt direct ou indirect dans les objectifs et la mise en œuvre du Programme et/ou son évaluation.

- **La situation de référence (Baseline)** est la situation initiale ou point de référence à partir duquel les progrès sont mesurés.
- **Les résultats immédiats ou les produits (Outputs)** sont les produits ou services directement issus des activités du Programme. Ils sont des résultats immédiats, tangibles et mesurables après la mise en œuvre. Les outputs sont ce que le Programme produit directement.
- **Les résultats à moyen terme (Outcomes)** représentent les changements ou les effets à moyen terme découlant de l'utilisation des outputs. Ils sont souvent plus difficiles à mesurer car ils impliquent des changements de comportement, d'attitude, ou de conditions. Les outcomes sont influencés par les outputs, mais ne sont pas totalement sous le contrôle du Programme, car ils peuvent être affectés par des facteurs externes.
- **L'impact** décrit les effets à long terme ou les changements durables causés par le Programme.
- **La technologie AIN** (Agriculture Intelligente face au Climat) fait référence à un ensemble de pratiques agricoles innovantes visant à augmenter la productivité agricole tout en réduisant les impacts environnementaux négatifs. Elle cherche à renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux effets du changement climatique.
- **La technologie AIC** (Agriculture Intelligente face au Climat) se concentre sur l'adaptation des pratiques agricoles aux changements climatiques, tout en augmentant la productivité et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Tout comme l'Agriculture Intelligente face au Climat (AIN), l'AIC fait partie des approches modernes pour assurer un développement agricole durable dans un contexte de changements climatiques.
- **La technologie améliorée** fait référence à des pratiques, des outils et des variétés de cultures qui visent à accroître la productivité et l'efficacité des exploitations agricoles. Cela peut inclure les semences améliorées, les techniques de culture avancées, l'accès à des ressources et services financiers et la formation et sensibilisation ...

II. CADRE DE RÉFÉRENCE

II.1 Contexte

II.1.1 Les objectifs du Programme

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a mis en œuvre, depuis 2022, le Programme National de Développement Agricole (PNDA), sous la conduite du ministère de l'Agriculture pour un financement de la Banque Mondiale de l'ordre de 280 millions de dollars américains pendant une durée de 5 ans renouvelable. Il est exécuté dans les Provinces Kwilu, Kongo-Central, Kasai-Central et Kasai.

Les objectifs spécifiques du Programme se déclinent comme suit :

- i. Soutenir la croissance de la productivité agricole au niveau de l'exploitation ;

- ii. Permettre aux petits exploitants agricoles d'accroître leurs actifs et leur production, puis d'intervenir pour favoriser l'accès au marché et l'intégration productive de ces petits exploitants dans les chaînes d'approvisionnement agricoles ;
- iii. Soutenir par des investissements importants dans la fourniture de biens et services publics agricoles aux niveaux national et local, notamment la recherche et le développement agricoles, la santé animale et végétale et les infrastructures ;
- iv. Renforcer les capacités des du secteur public en particulier du ministère de l'Agriculture, ministère de la Pêche et Elevage et du ministère du Développement Rural en vue de la fourniture des biens et services publics agricoles de base dans la zone du projet et renforcer la gestion du Programme et le suivi et évaluation aux niveaux national et provincial dans les provinces participantes et ;
- v. Renforcer les interventions d'urgence dans le secteur de l'Agriculture.

Le Programme s'articule autour de quatre composantes :


1. *La composante 1* : « améliorer la productivité agricole (y compris les cultures, l'élevage et la pêche) » des petites exploitations agricoles (de cultures et de produits animaux) à travers l'adoption des technologies, des pratiques améliorées et l'accès au financement.
 - Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants
 - Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants
2. *La composante 2* : « améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles »
 - Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales
 - Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur
3. *La composante 3* : « fournir des biens et services publics agricoles ».
 - Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles
 - Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme
4. *Composante 4* : Réponse aux urgences agricoles

II.1.2 Les acteurs principaux et les parties prenantes du Programme

Le Programme est ancré au ministère de l'Agriculture (MinAgri) en étroite collaboration avec les ministères de la Pêche et de l'Élevage, du Développement Rural et de la Recherche Scientifique et Technologique. L'exécution du Programme est sous la supervision et la coordination de l'Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP), il sera appuyé par le Comité National de Coordination Technique (CNCT) composé principalement par les Directions des Études et Planifications (DEP) des 3 ministères clés. Au niveau provincial, il y a les Unités Provinciales d'Exécution du Programme (UPEP) et les ministères provinciaux des ministères clés, le Service National des Statistiques agricoles (SNSA), les institutions financières et les différentes es parties prenantes (INERA, SENASEM, OVDA, SENAPIC...).

Au niveau territorial ou du village, à part les bénéficiaires directs (les petits exploitants agricoles, les organisations paysannes, les agro MPME et les fournisseurs d'intrants et de services agricoles) il y a les Opérateurs Techniques (OT), qui sont responsables des opérations sur le terrain.

Figure 1: Les acteurs du Programme

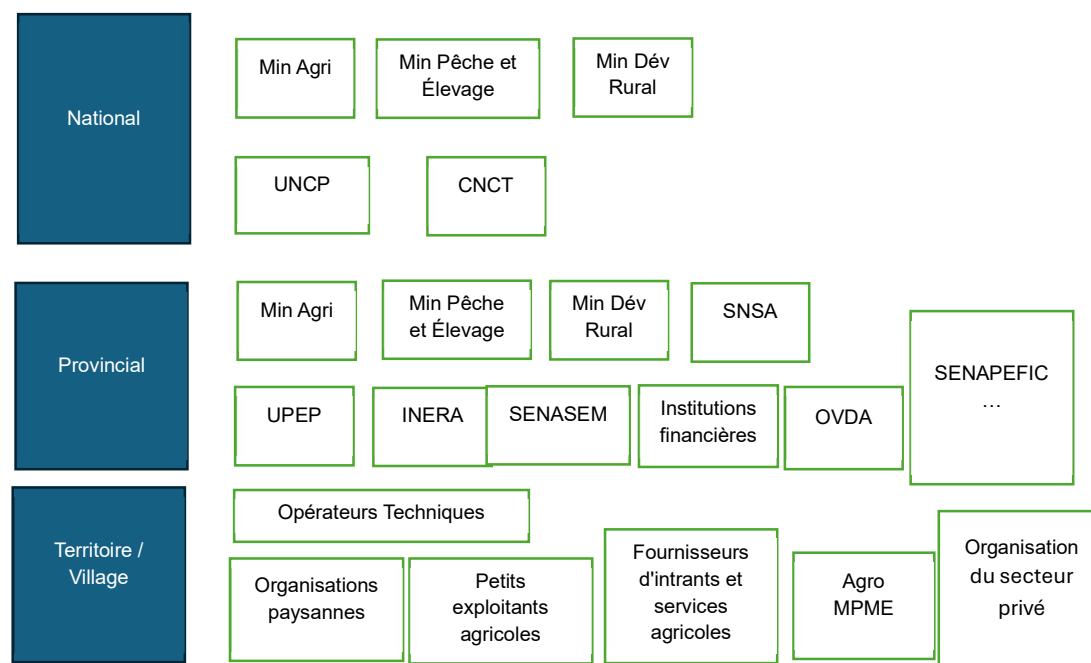

II.1.3 Les bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du Programme sont :

- Les petits exploitants agricoles
- Les MPME agro-industrielles
- Les organisations agricoles
- Les organisations du secteur privé
- Les entrepreneurs et les travailleurs journaliers travaillant dans des projets d'infrastructure rurale
- Les utilisateurs des routes et autres infrastructures rurales
- Les institutions financières participantes
- Les prestataires de services de développement des affaires (BDS)
- Les prestataires de services publics d'appui à l'agriculture

Les bénéficiaires indirectes sont :

- Les ménages de petits exploitants
- Les MPME Agribusiness

- Les Institutions financières
- Les ménages dans les zones d'intervention (utilisateurs des routes réhabilitées, les ménages bénéficiant des retombées économiques du Programme)

II.2 Le cadre logique du Programme

Les tableaux suivants reprennent la hiérarchie des objectifs et les indicateurs du PNDA

Tableau 1 : Cadre logique

Objectif de Développement du Projet	Indicateur de Résultats	Hypothèse critique
ODP1. Améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les zones du projet	IODP1.1 Hausse des ventes de produits agricoles et alimentaires sur les marchés formels par les petits exploitants bénéficiaires du programme	• Non-adhésion de l'OT ou les petits exploitants eux-mêmes • Non-adoption des technologies agricoles améliorées par les petits exploitants
ODP2. Augmenter la productivité agricole des petits exploitants agricoles dans les zones du projet	IODP2.1 Nombre de petits exploitants ayant adopté une technologie agricole améliorée	• Non-adhésion de l'OT ou les petits exploitants eux-mêmes
	IODP2.2 Nombre de petits exploitants femmes ayant adopté une technologie agricole améliorée	
	IODP2.3 Hausse du rendement de maïs à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	• Non-adoption des technologies agricoles améliorées par les petits exploitants
	IODP2.4 Hausse du rendement de manioc à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	
	IODP2.5 Hausse du rendement de l'arachide à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	
	IODP2.6 Réduction du taux de mortalité animale au niveau des petits exploitants cibles	Non adoption des campagnes de vaccination par les petits exploitants agricoles (éleveurs)
ODP3. Renforcer la capacité du secteur public dans la réponse aux urgences agricoles éligibles	IODP3.1 Nombre de plans de contingence pour les risques liés au secteur agricole (y compris le COVID-19)	Non implication des services publics de l'Etat.
	IODP3.2 Nombre de provinces ciblées ayant soumis des plans de maintenance annuelle des routes	Non implication des autorités provinciales
	IODP3.3 Nombre des bénéficiaires directs du projet	Non adhésion des bénéficiaires au programme
	IODP3.4 Nombre des femmes bénéficiaires directs du projet	Non adhésion des femmes bénéficiaires au programme
Objectif spécifique	Indicateur de résultat intermédiaire	Hypothèse critique
Composant 1 : Amélioration de la productivité agricole		
R1.1. Appui direct aux exploitants	IR1.1.1. Nombre des petits exploitants agricoles atteints avec des actifs ou des services agricoles	Non adhésion des petits exploitants agricoles
	IR1.1.2. Nombre des femmes petits exploitants agricoles atteintes par des actifs ou des services agricoles	

	IR1.1.3. Nombre des fournisseurs d'intrants et de services agricoles offrant des technologies AIC ou AIN	Non adhésion des fournisseurs aux technologies AIC et AIN
	IR1.1.4. Nombre des petits exploitants enregistrés dans le RNA	Non adhésion des petits exploitants agricoles
	IR1.1.5. Nombre des femmes petits exploitants enregistrés dans le RNA	
	IR1.1.6. Superficie sous pratiques agricoles intelligentes face au climat dans les provinces ciblées	Non utilisation d'intrants et services du Ptech par les petits exploitants
Composant 2 : Accès aux marchés des petits exploitants		
R2.1. Voies de dessertes agricoles rurales dans les zones ciblées	IR2.1.1. Nombre de kilomètres de routes réhabilitées	Manque de main d'œuvre pour exécuter les travaux de réhabilitation des routes
	IR2.1.2. Nombre de kilomètres de routes de desserte agricole réhabilitées par le programme.	
	IR2.1.4. Nombre de CLER fonctionnels	• Pas d'adhésion de la population locale • Pas de structuration des CLER
	IR2.1.5. Nombre de provinces sélectionnées ayant soumis des plans annuels d'entretien routier au FONER	• Pas d'implication des autorités provinciales • Manque de disponibilité des fonds alloués aux provinces ciblées par le FONER
R2.2. Appui à l'exclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur	IR2.2.1. Nombre des bénéficiaires atteints par les services financiers	Non accès de petits exploitants aux services financiers.
	IR2.2.2. Nombre des femmes bénéficiaires atteints par les services financiers	
	IR2.2.3. Nombre des jeunes bénéficiaires atteints par les services financiers	
	IR2.2.4. Nombre d'adultes précédemment non bancarisés possédant un compte de transaction	Refus d'ouvrir des comptes bancaires
	IR2.2.5. Nombre de PME ayant obtenu un prêt ou une marge de crédit	Aucune PME ne formule une demande de crédit
	IR2.2.6. Nombre de PME dirigé par des femmes ayant obtenu un prêt ou une marge de crédit	
	IR2.2.7. Nombre de personnes avec les polices de méso assurance	Manque de personne ayant souscrit pour une méso police d'assurance dans la zone du programme.
	IR2.2.8. Nombre de femmes avec les polices de méso assurance	
	IR2.2.9. Nombre d'organisations ayant soumis des plans d'affaires	Non élaboration des plans d'affaires par les organisations
	IR2.2.10. Nombre d'organisations d'agriculteurs et agro-MPME ayant eu une assistance technique pour l'administration des affaires	Aucune adhésion d'OP et de MPME
	IR2.2.11. Nombre d'organisations fermières et agro-MPME dirigées par des femmes	Aucune organisation fermière et de MPME dirigée par des femmes.
	IR2.2.12. Nombre de prestataires de services financiers (AVEC) atteints avec une assistance technique	Aucune organisation fermière et de MPME dirigée par des femmes
	IR2.2.13. Volume de prêts au moyen de lignes de crédit accordées par le programme aux provinces ciblées	Aucune PME ne formule une demande de crédit
Composant 3 : Biens et services agricoles		

R3.1. Capacités pour la fourniture de services publics agricoles renforcées	IR3.1.1. Nombre de campagnes de vaccination animale dans les provinces ciblées	Absence de Cheptel chez les Petits Exploitants
	IR3.1.2. Nombre de programmes de R&D agricole sur l'AIC et l'AIN	Absence de recherche pour le développement de variétés de semences retenues dans le cadre du Projet
	IR3.1.3. Opérationnalisation du registre national d'agriculteurs	Non recours au RNA pour l'enregistrement des Petits Exploitants dans le Registre National Agricole
	IR3.1.4. Pourcentage des traitements des réclamations du Service de réparation des griefs dans les délais requis (GRM)	Absence de réclamation adressées auprès de service de réparations des griefs
	IR3.1.5. Pourcentage des cas d'exploitation et d'abus sexuels/de harcèlement sexuel traité au service	Absence de renseignement de cas d'exploitation et abus sexuels au service
	IR3.1.6. Nombre de modules de formation fournis à l'unité genre du ministère de l'Agriculture	Non Fourniture de modules de formation à l'unité genre du Ministère de l'Agriculture
	IR3.1.7. Pourcentage des fermiers ayant reçu des appuis pour l'adoption des Ptech sont satisfaits	Non adoption de Ptech par des fermiers
Composante 4: Intervention d'urgence agricole		
R 4. Intervention d'urgence agricole	IR4.1. Nombre de plans de contingence des risques agricoles préparés et approuvés	Absence de plan de contingence

II.3 La théorie des changements

La théorie du changement du Programme décrit comment et pourquoi l'ensemble d'activités conduit aux résultats attendus et à l'impact de long terme. Le schéma dans le document du Programme est repris dans le schéma ci-après. L'enchaînement de chaque étape de cette théorie de changement, la réalisation des objectifs dans ce schéma dépendent entre autres des hypothèses.

Ces hypothèses constituent des conditions nécessaires au succès des interventions du PNDA et doivent être suivies de près.

Adoption des technologies et pratiques agricoles

Hypothèse : Les petits exploitants agricoles adopteront les nouvelles technologies, les pratiques agricoles améliorées et les intrants dans le cadre du Programme.

Justification : L'amélioration de la productivité dépend de l'acceptation et de la mise en œuvre de ces innovations par les agriculteurs.

Disponibilité des ressources financières et techniques

Hypothèse : Les ressources financières, matérielles et techniques (semences, engrais, équipements agricoles, etc.) seront disponibles à temps et en quantité suffisante pour soutenir les bénéficiaires.

Justification : Le succès du PNDA repose sur la disponibilité constante de ces ressources pour éviter les retards dans la mise en œuvre.

Participation active des parties prenantes locales

Hypothèse : Les parties prenantes, y compris les communautés locales, les autorités provinciales et locales, les organisations paysannes, et les MPME agro-industrielles participeront activement à la mise en œuvre du Programme.

Justification : Une coordination efficace et une appropriation locale sont essentielles pour garantir la durabilité et le succès à long terme du Programme.

Stabilité politique et institutionnelle

Hypothèse : Le contexte politique et institutionnel du pays restera relativement stable pendant la durée du Programme, permettant une mise en œuvre sans perturbations majeures.

Justification : Les changements politiques, conflits ou instabilités institutionnelles pourraient ralentir ou entraver les activités du Programme.

Capacité renforcée des institutions publiques

Hypothèse : Les capacités des ministères partenaires (ministère de l'Agriculture, ministère des Pêches et Élevage, Ministère du Développement Rural) seront renforcées à travers le Programme, permettant une meilleure gouvernance et une gestion efficace.

Justification : La mise en œuvre des politiques agricoles dépend de la capacité des institutions à fournir des services de qualité, y compris la formation, la supervision et la gestion des risques.

Résilience aux chocs climatiques et environnementaux

Hypothèse : Les techniques et pratiques résilientes au climat mises en œuvre dans le Programme atténueront les impacts des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations) sur la productivité agricole.

Justification : Les aléas climatiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur les récoltes et les moyens de subsistance agricoles. La résilience climatique est donc essentielle à la durabilité du Programme.

Disponibilité des services de vulgarisation agricole

Hypothèse : Les services de vulgarisation et de conseil agricole seront fournis de manière régulière et efficace, permettant aux agriculteurs d'accéder à des informations techniques et à des formations sur les meilleures pratiques agricoles.

Justification : L'absence de soutien technique ou de formation adéquate pourrait limiter l'adoption des pratiques promues par le Programme.

Sécurité dans les zones de mise en œuvre

Hypothèse : Les zones ciblées pour la mise en œuvre du PNDA resteront sécurisées, permettant aux bénéficiaires de travailler et de se déplacer sans risque.


Justification : L'insécurité ou les conflits dans certaines zones pourraient restreindre l'accès des agriculteurs à leurs terres, aux marchés et aux services publics.

Marché favorable pour les produits agricoles

Hypothèse : Les prix des produits agricoles sur les marchés locaux et régionaux resteront relativement stables ou croîtront, ce qui encouragera les petits exploitants à produire plus et à vendre leurs surplus.

Justification : Les fluctuations des prix agricoles peuvent décourager la production, notamment lorsque les prix sont trop bas pour permettre un revenu décent.

Figure 2 : Théorie de changement

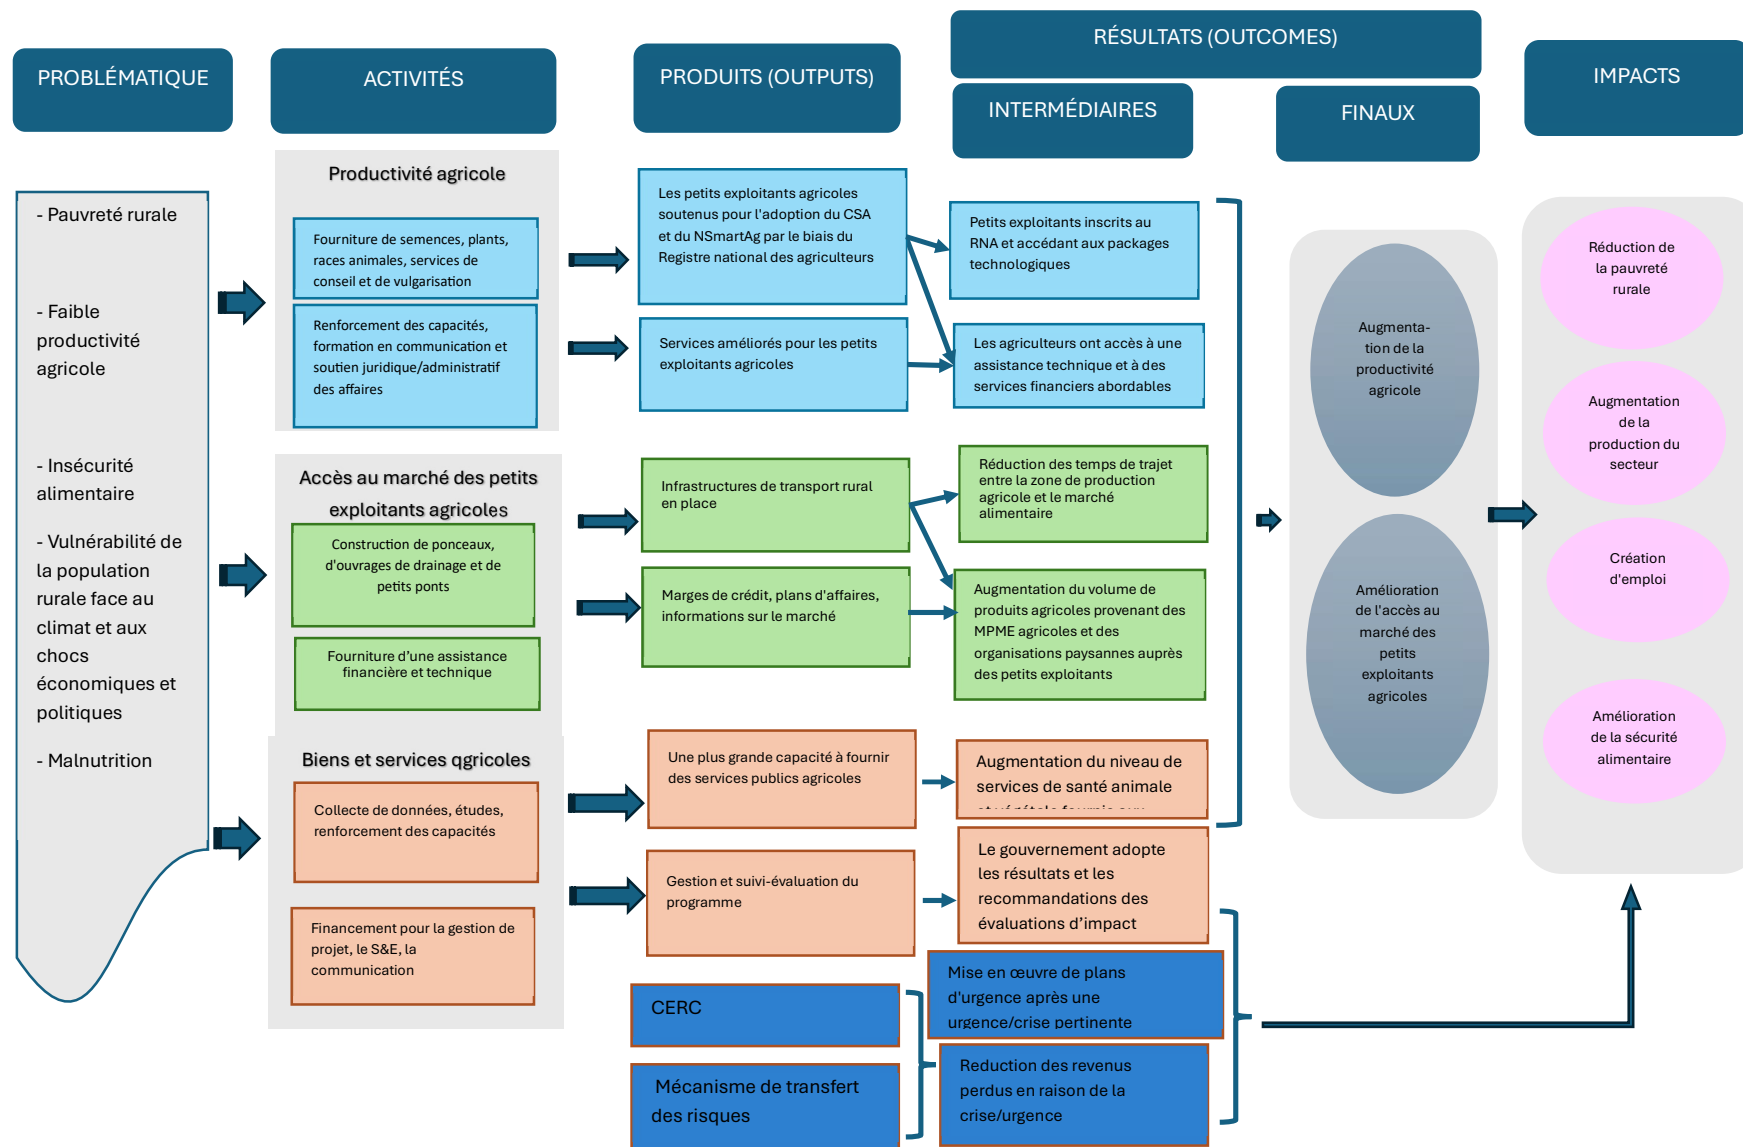

II.4 Cadre des résultats et valeurs cibles du Programme

La conception du Programme a été orientée par un cadre de résultats qui joue un rôle essentiel dans sa gestion et sa mise en œuvre, ainsi que dans la revue et la supervision des activités. Ce cadre est centré à la fois sur l'Objectif de Développement du Programme (ODP) à atteindre et sur les résultats intermédiaires attendus, chacun étant associé à des indicateurs spécifiques, à savoir les indicateurs du cadre de résultats et ceux des résultats intermédiaires.

Tableau 2 : Cadre de résultat et valeurs cibles de niveau ODP

Indicateurs de l'ODP	Unité de Mesure	Valeur de référence	Valeurs Cibles				
			2023	2024	2025	2026	Final
Indicateurs d'objectif de développement de projet							
IODP1. Améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les zones du projet							
IODP1.1. Ventes de produits agricoles et alimentaires par les petits exploitants	%	0	0	5	10	20	30
IOPP2. Augmenter la productivité agricole des petits exploitants agricoles dans les zones du projet							
IODP2.1 Nombre de petits exploitants ayant adopté une technologie agricole améliorée	Nombre	0	0	20 000	130 000	300 000	300 000
IODP2.2 Nombre de petits exploitants femmes ayant adopté une technologie agricole améliorée	Nombre	0	0	10 000	65 000	150 000	150 000
IODP2.3 Hausse du rendement de maïs à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	%	0	0	30	60	80	100
IODP2.4 Hausse du rendement de manioc à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	%	0	0	0	25	40	50
IODP2.5 Hausse du rendement de l'arachide à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	%	0	0	0	25	40	50
IODP2.6 Réduction du taux de mortalité animale au niveau des petits exploitants cibles	%	0	0	0	30	40	50
ODP3. Renforcer la capacité du secteur public dans la réponse aux urgences agricoles éligibles							
IODP3.1 Nombre de plans de contingence pour les risques liés au secteur agricole (y compris le COVID-19)	Nombre	0	1	2	2	5	5
IODP3.2 Nombre de provinces ciblées ayant soumis des plans de maintenance annuelle des routes	Nombre	0	0	0	2	4	4
IODP3.3 Nombre des bénéficiaires directs du projet	Nombre	0	0	20 000	180 000	420 000	600 000
IODP3.4 Nombre des femmes bénéficiaires directs du projet	Nombre	0	0	10 000	90 000	210 000	300 000

Tableau 3: Cadre de résultats intermédiaires et valeurs cibles

Indicateurs de résultats intermédiaires	Unité de Mesure	Valeur de référence	Valeurs Cibles				
			2023	2024	2025	2026	Final
Composante 1. Amélioration de la productivité agricole							
IR1.1. Appui aux petits exploitants							
IR1.1.1. Nombre des petits exploitants agricoles atteints avec des actifs ou des services agricoles	Nombre	0	0	20 000	130 000	300 000	300 000
IR1.1.2. Nombre des femmes petits exploitants agricoles atteintes par des actifs ou des services agricoles	Nombre	0	0	10 000	65 000	150 000	150 000
IR1.1.3. Nombre des fournisseurs d'intrants et de services agricoles offrant des technologies AIC ou AIN	Nombre	4	4	0	10	20	25
IR1.1.4. Nombre des petits exploitants enregistrés dans le RNA	Nombre	0	0	20 000	130 000	300 000	300 000
IR1.1.5. Nombre des femmes petits exploitants enregistrés dans le RNA	Nombre		0	10 000	65 000	150 000	150 000
IR1.1.6. Superficie sous pratiques agricoles intelligentes face au climat dans les provinces ciblées	Ha	0	0	10 000	65 000	150 000	150 000
Composante 2: Accès des petits exploitants au marché							
IR2.1 : Infrastructures rurales							
IR2.1.1. Nombre de kilomètres de routes réhabilitées	Km	0	0	0	600	1 200	1 800
IR2.1.2. Nombre de kilomètres de routes de desserte agricole réhabilitées par le programme.	Km	0	0	0	600	1 200	1 800
IR2.1.3. Nombre de CLER fonctionnels	Nombre	0	0	0	24	48	72
IR2.1.4. Nombre de provinces sélectionnées ayant soumis des plans annuels d'entretien routier au FONER	Nombre	0	0	0	2	4	4
IR 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur							
IR2.2.1.Nombre des bénéficiaires atteints par les services financiers	Nombre	0	0	20 000	130 000	300 000	300 000
IR2.2.2 Nombre des femmes bénéficiaires atteints par les services financiers				10 000	65 000	150 000	150 000
IR2.2.3. Nombre des jeunes bénéficiaires atteints par les services financiers				2 000	13 000	30 000	30 000
IR2.2.4. Nombre d'adultes précédemment non bancarisés possédant un compte de transaction	Nombre	0	0	5 000	17 500	35 000	50 000
IR2.2.5. Nombre de PME ayant un prêt ou une marge de crédit (CRI, nombre)	Nombre			10	30	70	100
IR1.2.6 Nombre de PME dirigé par des femmes ayant obtenu un prêt ou une marge de crédit	Nombre	0	0	5	15	35	50
IR1.2.7. Nombre de personnes avec les polices de méso assurance	Nombre	0	0	20 000	130 000	300 000	300 000
IR1.2.8. Nombre de femmes avec les polices de méso assurance	Nombre	0	0	10 000	65 000	150 000	150 000
IR1.2.9. Nombre d'organisations ayant soumis des plans d'affaires	Nombre			50	100	200	300
IR2.2.1 Nombre d'organisations d'agriculteurs et agro-MPME ayant eu une assistance technique pour l'administration des affaires	Nombre	0	0	14	28	42	56

IR2.2.2 Nombre d'organisations fermières et agro-MPME dirigées par des femmes	Nombre	0	0	7	14	21	28
IR2.2.3 Nombre de prestataires de services financiers (AVEC) atteints avec une assistance technique	Nombre	0	0	200	400	600	600
IR2.2.4 Volume de prêts au moyen de lignes de crédit accordées par le programme aux provinces ciblées	Montant	0	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
Composante 3: Biens et services publics agricoles							
IR 3.1 : Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles							
IR3.1.1. Nombre de campagnes de vaccination animale dans les provinces ciblées	Nombre	0	0	1	2	3	4
IR3.1.2. Nombre de programmes de R&D agricole sur l'AIC et l'AIN	Nombre	0	0	3	8	18	28
IR3.1.3. Opérationnalisation du registre national d'agriculteurs	Oui/Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IR3.1.4. Pourcentage des traitements des réclamations du Service de réparation des griefs dans les délais requis (GRM)	%	0	0	100	100	100	100
IR3.1.5. Pourcentage des cas d'exploitation et d'abus sexuels/de harcèlement sexuel traité au service	%	0	100	100	100	100	100
IR3.1.6. Nombre de modules de formation fournis à l'unité genre du ministère de l'Agriculture	Nombre	0	2	4	6	8	10
IR3.1.7. Pourcentage des fermiers ayant reçu des appuis pour l'adoption des Ptech, qui sont satisfaits	%	0	0	70	70	70	70
Composante 4 : Intervention d'urgence agricole							
IR4.1. Nombre de plans de contingence des risques agricoles préparés et approuvés	Nombre	0	1	2	2	3	4

III. PLAN DE SUIVI

Cette section contient la planification du S&E, à savoir les données à collecter, la méthode de collecte et les outils, la fréquence de la collecte, les acteurs impliqués dans la collecte.

III.1 Planification du suivi

Afin de mesurer la performance du Programme, un plan de suivi-évaluation est mis en place. Il comprend les principaux indicateurs convenus qui permettraient d'évaluer l'atteinte de l'ODP et les résultats intermédiaires, les données de référence et les valeurs cibles à la fin du Programme, la fréquence pour la mise à jour, les sources de données et les responsables de la collecte des données.

III.1.1 Suivi des indicateurs de performance

Il comprend les principaux indicateurs convenus qui permettraient d'évaluer l'atteinte de l'ODP et les résultats intermédiaires, les données de référence et les valeurs cibles à la fin du Programme, la fréquence pour la mise à jour, les sources de données et les responsables de la collecte des données.

Tableau 4 : Plan de suivi des indicateurs

Indicateurs de l'ODP	Mode de calcul	Données de base à collecter	Fréquence de collecte	Méthodologie de Collecte	Responsable pour la collecte
Indicateurs d'objectif de développement de projet					
IODP1. Améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les zones du projet					
IODP1.1 Hausse des ventes de produits agricoles et alimentaires sur les marchés formels par les petits exploitants bénéficiaires du programme	$\% = ((\text{Surplus à l'année } t / \text{Surplus à l'année } 0) - 1) \times 100$	1. Quantité (kg) de produits vendus sur les marchés formels à l'année visée. 2. Prix unitaire de vente à l'année visée	Annuelle	Enquêtes sur la production des bénéficiaires	UNCP
IODP2. Augmenter la productivité agricole des petits exploitants agricoles dans les zones du projet					
IODP2.1 Nombre de petits exploitants ayant adopté une technologie agricole améliorée	Nb (t) = Somme cumulée des petits exploitants bénéficiaires jusqu'à l'année t	Nombre des petits exploitants ayant adopté la technologie améliorée	Annuelle	Enregistrement des petits exploitants	UNCP
IODP2.2 Nombre de petits exploitants femmes ayant adopté une technologie agricole améliorée	Nb (t) = Somme cumulée des femmes bénéficiaires jusqu'à l'année t	Nombre des petits exploitants femmes ayant adopté la technologie améliorée	Annuelle	Enregistrement des petits exploitants	UNCP
IODP2.3 Hausse du rendement de maïs à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	$\% = ((\text{Rendement maïs année } t - \text{Rendement maïs année } 0) / \text{Rendement maïs année } 0) \times 100$	1. La quantité globale de la production en cours; 2. La surface des champs de production cultivée correspondante.	Annuelle	Enquêtes sur la production des bénéficiaires	UNCP
IODP2.4 Hausse du rendement de manioc à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	$\% = ((\text{Rendement manioc année } t - \text{Rendement manioc année } 0) / \text{Rendement manioc année } 0) \times 100$	1. La quantité globale de la production en cours; 2. La surface des champs de production cultivée correspondante.	Annuelle	Enquêtes sur la production des bénéficiaires	UNCP
IODP2.5 Hausse du rendement de l'arachide à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	$\% = ((\text{Rendement arachide année } t - \text{Rendement arachide année } 0) / \text{Rendement arachide année } 0) \times 100$	1. La quantité globale de la production en cours; 2. La surface des champs de production cultivée correspondante.	Annuelle	Enquêtes sur la production des bénéficiaires	UNCP
IODP2.6 Réduction du taux de mortalité animale au niveau des petits exploitants cibles	$\% = (1 - \text{Taux de mortalité année } 0 / \text{Taux de mortalité année } t) \times 100$	1. Nombre d'animaux présents dans la ferme au début de l'année, en tenant compte des naissances ou des introductions d'animaux supplémentaires durant la période. 2. Le nombre d'animaux morts pendant la période	Annuelle	Enquête sur les bénéficiaires	UNCP

IODP3. Renforcer la capacité du secteur public dans la réponse aux urgences agricoles éligibles					
IODP3.1 Nombre de plans de contingence pour les risques liés au secteur agricole (y compris le COVID-19)	Nb= Nombre cumulé es plans de contingence approuvés à l'année t	Nombre de plans de contingence approuvés	Annuelle	Rapport d'activités du Programme	UNCP
IODP3.2 Nombre de provinces ciblées ayant soumis des plans de maintenance annuelle des routes	Nb = Somme des provinces ayant soumis des plans de maintenance à l'année t	Toutes les provinces qui ont soumis les plans de maintenance	Annuelle	Revue documentaire	OVDA
IODP3.3 Nombre des bénéficiaires directs du projet	Nb= Somme cumulée de tous les bénéficiaires du programme à l'année t	1. Nb des petits exploitants bénéficiaires du programme 2. Nb des entrepreneurs impliqués dans le programme. 3. Nombre des travailleurs locaux impliqués dans le projet d'infrastructure. 4. Nombre des institutions financières participantes. 5. Nb de tous les prestataires de services publics d'appui au programme. 6. Nb des prestataires de service des entreprises	Annuelle	Enregistrement des bénéficiaires directs	UNCP
IODP3.4 Nombre des femmes bénéficiaires directs du projet	Nb = Somme cumulée de tous les femmes bénéficiaires du projet à l'année t	Nombres des femmes impliquées directement dans le programmes	Annuelle	Enregistrement des bénéficiaires directs	UNCP
Indicateurs de Résultats Intermédiaires par Composante					
Composante 1: Amélioration de la productivité agricole					
Sous-composante 1.1 : Appui aux petits exploitants					
IR1.1.1. Nombre des petits exploitants agricoles atteints avec des actifs ou des services agricoles	Nb = Somme cumulée de tous les petits exploitants bénéficiaires d'actifs ou des services agricoles au semestre t	Nombre des petits exploitants agricoles atteints avec des actifs ou des services agricoles pendant la période visée	Semestrielle	Données collectées par l'OT sur bénéficiaires de subvention qui ont reçu au moins la première tranche	UNCP
IR1.1.2. Nombre des femmes petits exploitants agricoles atteintes par des actifs ou des services agricoles	Nb = Somme cumulée de tous les petits exploitants femmes bénéficiaires d'actifs ou des services agricoles au semestre t	Nombre de petits exploitants Femmes (Agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs) qui ont bénéficié d'actifs ou des services agricoles (les cultures, le bétail, etc) grâce à l'appui du programme	Semestrielle	Données collectées par l'OT sur bénéficiaires de subvention qui ont reçu au moins la première tranche	UNCP

IR1.1.3. Nombre des fournisseurs d'intrants et de services agricoles offrant des technologies AIC ou AIN	Nb = Somme cumulée de tous les fournisseurs d'intrants et de services agricoles au semestre t	Le nombre des fournisseurs d'intrants et de services agricoles offrant des technologies AIC ou AIN pendant la période visée	Semestrielle	Données collectées par l'OT sur les prestataires privés d'intrants et services qui sont sur le registre de subvention du PNDA	UNCP
IR1.1.4. Nombre des petits exploitants enregistrés dans le RNA	Nb = Somme cumulée des petits exploitants enregistrés dans le RNA au semestre t	Le nombre des petits exploitants agriculteurs (agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs) enregistrés dans le RNA	Semestrielle	Système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
IR1.1.5. Nombre des femmes petits exploitants enregistrés dans le RNA	Nb = Somme cumulée des petits exploitants femmes (agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs) enregistrés dans le RNA au semestre t	Le nombre des petits exploitants agricoles (agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs) femmes enregistrées dans le RNA	Semestrielle	Système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
IR1.1.6. Superficie sous pratiques agricoles intelligentes face au climat dans les provinces ciblées	Ha = Largeur x Longueur totale emblavée sous pratiques AIC et AIN	Superficie totale emblavée sous pratique AIC et AIN sous le programme	Semestrielle	Système d'information du RNA	UNCP
Composante 2: Accès des petits exploitants au marché					
Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales					
IR2.1.1. Nombre de kilomètres de routes réhabilitées	Km = Somme cumulée (km de routes Nationales + Kilomètres de routes Provinciales+ Kilomètres des routes de dessertes agricoles réhabilitées)	1. km linéaire de routes de desserte agricole réhabilitées par le programme. 2. km linéaire de routes Provinciales réhabilitées par le programme en milieu rural. 3 km linéaire de routes Nationales réhabilitées par le programme en milieu rural.	Annuelle	Les missions de contrôle, les Ingénieurs du programme (PNDA/OVDA/Office des Routes)	OVDA/UNCP
IR2.1.2. Nombre de kilomètres de routes de desserte agricole réhabilitées par le programme.	Km = Somme cumulée de kilomètres de route de desserte agricole réhabilitées par le programme à l'année t	km linéaire de routes de desserte agricole réhabilitées par le programme.	Annuelle	Les missions de contrôle, les Ingénieurs du programme (PNDA/OVDA/Office des Routes)	OVDA/UNCP
IR2.1.4. Nombre de CLER fonctionnels	Nb = Somme cumulée de CLER fonctionnels grâce au programme à l'année t	Tous les CLER fonctionnels grâce au programme à l'année visée (1 CLER pour 25km de route)	Annuelle	Supervision, Descente de terrain de l'OVDA/PNDA	OVDA/UNCP
IR2.1.5. Nombre de provinces sélectionnées ayant soumis des plans annuels d'entretien routier au FONER	Nb = Somme cumulée de provinces sélectionnées soumettant des plans annuels d'entretien à l'année t	Toutes les provinces ayant soumis des plans annuels d'entretien routier au FONER pendant l'année visée	Annuelle	Données collectées dans la convention de financement du Programme d'Entretien Routier de l'OVDA FONER	OVDA/UNCP

Composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur					
IR2.2.1. Nombre des bénéficiaires atteints par les services financiers	Nb = Somme cumulée de petits exploitants agricoles bénéficiaires de services financiers à l'année t	1. Le nombre de petits exploitants agricoles ayant été atteints par les services financiers. 2. Le nombre de Petits exploitants éleveurs ayant été atteints par les services financiers. 3. Le nombre de Petits exploitants agricoles pisciculteurs ayant été atteints par les services financiers	Annuelle	Compte du FGC	UNCP
IR2.2.2 Nombre des femmes bénéficiaires atteints par les services financiers	% = (Somme cumulée de petits exploitants de sexe féminin à l'année t / Somme de petits exploitants à l'année t) x 100	1. Nombre des petits exploitants agricoles femmes atteintes par les services financiers. 2.. Nombre total des petits exploitants agricoles atteints par les services financiers	Annuelle	Compte du FGC	UNCP
IR2.2.3. Nombre des jeunes bénéficiaires atteints par les services financiers	% = (Somme cumulée de petits exploitants jeune à l'année t / Somme de petits exploitants à l'année t) x 100	1. Nombre des petits exploitants agricoles femmes atteintes par les services financiers. 2. . Nombre total des petits exploitants agricoles atteints par les services financiers	Annuelle	Compte du FGC	UNCP
IR2.2.4. Nombre d'adultes précédemment non bancarisés possédant un compte de transaction	Nb = Somme cumulée d'adultes précédemment non bancarisés possédant un compte de transaction grâce au programme à l'année t	Le nombre d'adultes nouveaux détenteurs d'un compte de transaction grâce à l'appui du programme.	Annuelle	Données collectées par le système d'information sur les bénéficiaires	UNCP
IR2.2.5. Nombre de PME ayant un prêt ou une marge de crédit	Somme cumulée de PME ayant un prêt ou une marge de crédit durant le semestre t	Le nombre total de PME ayant eu un prêt ou une marge de crédit grâce au programme	Semestrielle	Comptes de BCC et UNCP	UNCP
IR2.2.6 Nombre de PME dirigé par des femmes ayant obtenu un prêt ou une marge de crédit	Somme cumulée de PME ayant un prêt ou une marge de crédit dirigé par des femmes durant le semestre t	Le nombre de PME dirigés par une femme ayant eu un prêt ou une marge de crédit grâce au programme.	Semestrielle	Comptes de BCC et UNCP	UNCP
IR2.2.7. Nombre de personnes avec les polices de méso assurance	Nb = Somme cumulée de petits exploitants possédant des polices de méso assurance grâce au programme à l'année t	Le nombre de petits exploitants (agriculteurs, éleveurs et les pisciculteurs) avec les polices de méso assurance grâce au programme	Annuelle	Données collectées par l'Opérateur technique sur les bénéficiaires de micro-assurance	UNCP
IR2.2.8. Nombre de femmes avec les polices de méso assurance	Nb = Somme cumulée de petits exploitants femmes possédant des polices de méso assurance grâce au programme à l'année t	Le nombre de petits exploitants femmes (agriculteurs, éleveurs et les pisciculteurs) avec les polices de méso assurance grâce au programme	Annuelle	Données collectées par l'Opérateur technique sur les bénéficiaires de micro-assurance	UNCP

IR2.2.9. Nombre d'organisations ayant soumis des plans d'affaires	Nb = Somme cumulée d'organisations paysannes ayant soumis des plans d'affaires à l'année t	Le nombre de toutes les organisations paysannes (production, transformation, stockage, commercialisation) ayant soumis des plans d'affaires au programme.	Annuelle	Données collectées par l'OT sur les organisations ayant soumis des plans d'affaire au programme	UNCP
IR2.2.10 Nombre d'organisations de producteurs et agro-MPME ayant eu une assistance technique pour l'administration des affaires	Nb = Somme cumulée d'Organisations de producteurs et agro-MPME bénéficiaires d'assistance technique à l'année t	Nombre d'Organisations de Producteurs et agro-MPME bénéficiant d'une assistance technique pour l'administration des affaires	Annuelle	Données collectées par l'Opérateur techniques sur les agriculteurs bénéficiaires de subvention	UNCP
IR2.2.11 Nombre d'organisations fermières et agro-MPME dirigées par des femmes	Nb = Somme cumulée d'Organisations paysannes et agro-MPME appuyées par le programme et dirigées par des femmes à l'année t	Nombre d'Organisations Paysannes et agro-MPME appuyées par le programme et qui sont dirigées par des femmes	Annuelle	Données collectées par l'Opérateur techniques sur les agriculteurs bénéficiaires de subvention, dirigées par les femmes	UNCP
IR2.2.12 Nombre de prestataires de services financiers (AVEC) atteints avec une assistance technique	Nb = Somme cumulée de prestataire de services financiers atteint avec une assistance technique à l'année t	Nombre de Prestataire de services financiers (AVEC) atteint avec une assistance technique du programme	Annuelle	Données collectées sur les AVEC bénéficiaires avec une assistance technique du programme de subvention	UNCP
IR2.2.13 Volume de prêts au moyen de lignes de crédit accordées par le programme aux provinces ciblées	\$US = Somme cumulée en \$US octroyée par le programme dans provinces ciblées en terme de prêts à l'année t	Les montants totaux prêts octroyés par le programme à l'année visée	Annuelle	BCC Système de gestion des crédits aux IFP	UNCP
Composante 3: Biens et services publics agricoles					
Sous-composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles					
IR3.1.1. Nombre de campagnes de vaccination animale dans les provinces ciblées	Nb = Somme cumulée de vaccinations de cheptel de bêtes dans les zones ciblées à l'année t	Nombre de vaccinations de cheptel de bêtes dans les zones ciblées du projet pendant l'année visée	Annuelle	Rapport Direction de la Santé Animale du ministère de l'Agriculture	UNCP
IR3.1.2. Nombre de programmes de R&D agricole sur l'AIC et l'AIN	Nb = Somme cumulée de programmes de recherche et dev. réalisés pour l'amélioration de variétés de semences agricoles à l'année t	Nombre de programmes de recherche et dev. réalisés pour l'amélioration de variétés de semences agricoles pendant l'année visée	Annuelle	Rapport INERA et visite sur le terrain par l'OT	INERA/UNCP
IR3.1.3. Opérationnalisation du registre national d'agriculteurs	Oui / Non	1. La liste des petits exploitants agricoles enregistrés. 2. Le registre national agricole	Annuelle	Système d'information du RNA	RNA/UNCP

IR3.1.4. Pourcentage des traitements des réclamations du Service de réparation des griefs dans les délais requis (GRM)	$\% = (\text{Nombre de réclamations traitées dans les délais durant l'année t} / \text{Nombre de réclamation reçue durant l'année t}) \times 100$	1. Nombre des réclamations traitées dans les délais durant l'année visée. 2. Nombre de réclamations reçues durant l'année visée	Annuelle	GRM Système d'information	OT/UNCP/UPEP
IR3.1.5. Pourcentage des cas d'exploitation et d'abus sexuels/de harcèlement sexuel traité au service	$\% = (\text{Nombre de cas d'exploitation, d'abus sexuels/harcèlement traités durant l'année t} / \text{Nombre de cas d'exploitation, d'abus sexuels/harcèlement rapportés durant l'année t}) \times 100$	1. Nombre de cas d'exploitations, d'abus sexuels/harcèlement traités durant l'année visée. 2. Nombre de cas d'exploitations, d'abus sexuels/harcèlement rapportés durant l'année visée	Annuelle	Données collectées par l'OT/UNCP/UPEP	OT/UNCP/UPEP
IR3.1.6. Nombre de modules de formation fournis à l'unité genre du ministère de l'Agriculture	Nb = Somme cumulée de modules de formation fournis durant l'année t	Les modules de formation sur le genre fournis au ministère de l'Agriculture	Annuelle	Décret Ministériel du ministère de l'Agriculture	UNCP
IR3.1.7. Pourcentage des fermiers ayant reçu des appuis pour l'adoption des Ptech, qui sont satisfaits	$\% = (\text{Nombre de fermiers satisfaits ayant adopté les Ptech durant l'année t} / \text{Nombre de fermiers ayant adopté les Ptech durant l'année t}) \times 100$	1. Nombre de fermiers disant satisfaits des Ptech durant l'année visée. 2. Nombre de fermiers ayant adopté les Ptech durant l'année visés	Annuelle	Enquête sur les bénéficiaires	OT/UNCP/UPEP
Composante 4 : Intervention d'urgence agricole					
IR4.1. Nombre de plans de contingence des risques agricoles préparés et approuvés	Nb = Somme cumulée du nombre de plans de contingence mis en place à l'année t	Le nombre de plans de contingence mis en place	Annuelle	Rapport Final du Manuel d'Intervention d'Urgence	UNCP/UPEP

III.1.2 Suivi des indicateurs environnemental et social

La mise en œuvre du PNDA pourrait entraîner des pertes de moyens de subsistance ou d'accès aux ressources pour certaines personnes, ainsi que des problèmes de sécurité dans des régions comme Kasai en raison de la présence de groupes armés. Les risques environnementaux du Programme sont liés aux travaux de réhabilitation des routes rurales et aux activités agricoles, incluant la gestion des pesticides, des ressources hydrauliques, et des terres arables, ainsi que des préoccupations de santé et sécurité au travail et des espèces envahissantes.

Ainsi, en plus des indicateurs de résultats clés, le Programme suit également les indicateurs d'impacts environnementaux et sociaux tels ceux des Violences Basées sur le Genre (VBG), Exploitation et Abus Sexuels/ Harcèlement Sexuel (EAS/HS) et VCE. Les spécialistes en sauvegarde environnementale, en sauvegarde sociale et en VGB à l'UNCP et le spécialiste de Suivi évaluation en collaboration avec les spécialistes de sauvegarde environnementale et sociale/VBG des provinces et les spécialistes de suivi évaluation au niveau des UPEP provinciales sont responsables du suivi-évaluation et du rapportage de ces indicateurs.

Tableau 5: Les indicateurs pour le volet Environnement et VBG/EAS/HS


Environnement
Pourcentage des entreprises respectant les dispositions environnementales et sociales dans leurs chantiers
Nombre d'acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale
Nombre de sous-projets ayant fait l'objet d'une ÉIES avec PGES mis en œuvre
Nombre de séances de formation/sensibilisation organisées
Plan de redevabilité et réponse
% des travailleurs et du personnel du projet qui ont signé le code de bonne conduite
Nombre des plaintes liées à l'EAHS qui sont reçues à travers le MGP (sans cible)
% de plaintes référées aux services de prise en charge
% des plaintes liées à l'EAHS qui sont résolues dans le délai prévu
Moyen du délai pour résoudre une plainte liée à l'EAHS
% de plaintes référées aux services de prise en charge
Nombre d'études de cartographie menées
Nombre de prestataires de services de prise en charge identifiés
Plan de formation et sensibilisation
Nombre des séances de formation tenues
Nombre des séances de sensibilisation tenues
Nombre de travailleurs / personnel formés et/ou sensibilisés (ventilés par sexe)
% des travailleurs et personnel formés qui obtiennent une note de 70% sur le post-test
Nombre de séances de sensibilisation organisées par province.
Nombre de consultations communautaires organisées

Nombre de participantes aux consultations (ventilés par sexe et âge) Nombre des séances de sensibilisation communautaires organisées Nombre de personnes sensibilisées (ventilés par sexe et âge)
Nombre de sensibilisations organisées Nombre de participant(e)s aux sensibilisations (ventilés par sexe et âge)
Note technique reprenant les critères d'identification des bénéficiaires élaborée par le projet et validée par l'UNCP Nombre d'unités de transformation des produits agricoles installées % des femmes participant à la gestion des unités de transformation
Nombre de journées de réflexion organisées Nombre des ateliers de formation organisés
% des femmes et filles participant aux instances de prise en décision Nombre et % des femmes impliquées dans le processus d'attribution d'intrants agricoles Nombre des outils de sensibilisation distribués et implantés Nombre et % des femmes qui siègent dans les instances de prise de décision dans les entreprises et dans des comités de gestion des plaintes
Nombre de journées de réflexion et d'ateliers de formation organisées Nombre de sensibilisations organisées Nombre de participant(e)s aux sensibilisations (ventilés par sexe) Nombre de personnel formés ou sensibilisés (ventilés par sexe) % de personnel formés qui obtiennent une note de 70% sur le post-test
Nombre de comités des femmes/ hommes résilient(e)s mises en place et fonctionnels

III.2 Circuit de la circulation de l'information

La Figure 3 présente le flux de données afin d'alimenter le mécanisme de suivi-évaluation du Programme. Les acteurs sont indiqués dans les boîtes et les traits montrent les réseaux d'échanges d'information, qui se font dans les deux sens. Certains échanges sont verbaux, d'autres sont écrits. Ces échanges écrits constituent les documents de gestion dans lesquels on trouve l'information utile pour le S&E du Programme. Le sens inverse représente aussi le circuit d'information pour la rétroaction.

Figure 3 : Schéma de la circulation de l'information

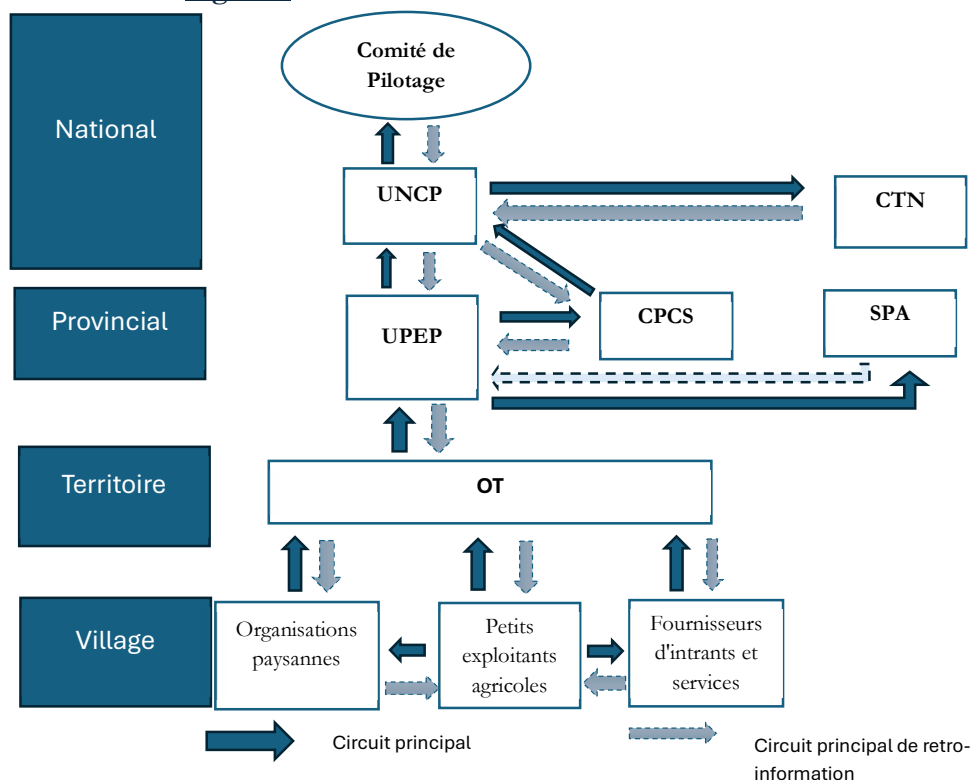

III.3 Le rôle des acteurs du PNDA dans le suivi et évaluation

Le suivi et évaluation du Programme repose sur une collaboration étroite entre plusieurs parties prenantes, chacune exerçant des responsabilités bien définies en fonction des composantes du Programme. L'UNCP joue un rôle central dans la coordination générale du suivi et évaluation. Les spécialistes de S&E, ainsi que les experts techniques, consolident les rapports des UPEP et les transmettent par la suite au Comité de Pilotage et à la Banque Mondiale. Le tableau suivant synthétise les responsabilités des acteurs du PNDA dans la production des rapports de suivi

Tableau 6: Rôle des différents acteurs du PNDA dans le suivi et l'évaluation


Entité	Principaux intervenants	Opérations	Supports
UNCP	Responsable de Suivi - Evaluation	Coordination générale Planification Supervision générale Consolidation des rapports des UPEP Transmission des rapports	Rapport de S&E Cadre des Résultats.
	Responsable de S&E Responsable communication et gestion du savoir	Diffusion des rapports	Rapport de S&E
	Tous les experts	Consolidation des rapports thématiques Suivi de terrain	Rapport de S&E Cadre des Résultats PTBA
UPEP	Tous les experts	Consolidation des rapports Suivi des indicateurs de résultats Suivi des activités Supervision des collectes de données sur le terrain	Cadre des Résultats Manuel de S&E Notes de terrain Rapports périodiques de S&E PTBA Résultats d'enquêtes Interviews
DEP, SNSA, SENAPEFIC... SENASEM, INERA, OVDA...	Les responsables	Élaborations des rapports Suivi des activités	Manuel de S&E Notes de terrain Rapports périodiques de S&E PTBA
DANTIC, SNSA, MinAgri, MinPêche Élevage	Les responsables des collectes des parties prenantes Les moniteurs agricoles Les techniciens vétérinaires	Collecte des données Rapports de terrain	Cadre des résultats Manuel de S&E Rapports périodiques de S&E PTBA
OT	OT	Suivi régulier des activités sur terrain Identification des risques Rapports de suivi	Cadre des résultats Manuel de S&E Rapports périodiques de S&E PTBA

III.4 La gestion des risques

Dans le cadre du PNDA, la gestion des risques revêt une importance particulière, compte tenu des multiples facteurs et internes qui pourraient entraver la mise en œuvre efficace du Programme. La gestion des risques consiste à identifier et évaluer les risques qui pourraient compromettre le bon déroulement du Programme tout en développant des stratégies pour les atténuer et assurer une continuité des activités.

Une fois identifiés, les risques sont classés par priorité selon leur nature, la probabilité de leur occurrence et l'impact potentiel sur le Programme. Il est donc essentiel d'évaluer les conséquences d'un incident lié à un risque pour en déterminer la gravité. En fonction de cette évaluation, un plan d'action est élaboré pour prévenir tout incident susceptible de perturber négativement et durablement le déroulement du Programme.

Voici une vue d'ensemble des principaux processus de gestion des risques, adaptés au Programme



III.4.1 Identification des risques

Pour le PNDA, l'identification des risques repose sur un processus rigoureux impliquant l'examen des documents du Programme, des rapports antérieurs, ainsi que des discussions approfondies avec les parties prenantes, telles que les petits exploitants agricoles, les différentes organisations et groupements locaux, les experts du secteur, et les gestionnaires régionaux etc.... Cette approche participative permet de mieux cerner les risques qui pourraient impacter la mise en œuvre des différentes composantes du Programme.

Il existe plusieurs types de risques pour le Programme

- *Risques de gestion* : Des écarts dans l'organisation des activités sur le terrain, des retards dans la distribution des intrants ou un manque de coordination entre les parties prenantes peuvent entraîner des retards significatifs, impactant directement les résultats du Programme.
- *Risques techniques* : Les erreurs dans la planification, comme une mauvaise estimation des besoins en semences de qualité ou des défaillances dans l'introduction des nouvelles technologies agricoles, peuvent entraîner des écarts de performance sur le terrain. Par exemple, la performance des semences testées en laboratoire pourrait ne pas correspondre à celle observée sur le terrain.
- *Risques politiques et institutionnels* : Une instabilité politique pourrait perturber la mise en œuvre du Programme. Les capacités limitées des institutions publiques pourraient affecter la qualité et la continuité des services fournis aux agriculteurs, notamment en matière de formation, d'encadrement et de gestion des urgences.
- *Risques socio-économiques* : Les petits exploitants pourraient être réticents à adopter de nouvelles technologies et pratiques agricoles en raison de traditions locales, de manque de confiance ou d'une méconnaissance des avantages. En outre, les fluctuations des prix des produits agricoles sur les marchés peuvent influencer les revenus des agriculteurs, rendant difficile la prévisibilité des gains financiers.
- *Risques environnementaux et climatiques* : Des phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, ou les tempêtes représentent une menace directe pour la production agricole.
- *Risques de santé et sécurité* : Les épidémies, telles que celles liées à des maladies affectant les cultures ou les animaux d'élevage, pourraient paralyser les activités agricoles dans certaines régions. De plus, les zones touchées par l'insécurité pourraient poser des difficultés d'accès pour les agriculteurs et limiter la mise en œuvre du Programme.

III.4.2 Évaluation des risques

Les risques identifiés sont évalués et classés par ordre d'importance en fonction de leur probabilité d'occurrence et leur impact. A chaque risque est associé un niveau de gravité. Plus l'impact sur le Programme d'un événement lié à un risque et les préjudices potentiels sont importants et plus sa gravité sera élevée. L'analyse des risques consiste à évaluer leurs causes et leurs conséquences sur le déroulement du Programme.

Figure 4 : Critères d'évaluation des risques

IMPACT	Élevée	Mesure d'atténuation et plan d'urgence	Mesure d'atténuation et plan d'urgence, surveillance étroite	Mesure d'atténuation et plan d'urgence, surveillance rigoureuse
	Moyenne	Tolérance et surveillance	Mesure d'atténuation et plan d'urgence	Mesure d'atténuation et plan d'urgence, surveillance étroite
	Faible	Tolérance, aucune mesure	Tolérance et surveillance	Mesure d'atténuation et plan d'urgence
		Faible	Moyenne	Élevée
		PROBABILITÉ		

III.4.3 Planification des réponses aux risques et gestion

Pour chaque risque identifié dans le cadre du PNDA, il est essentiel d'élaborer des stratégies ciblées afin de réduire soit la probabilité de survenue, soit l'impact négatif sur le Programme. Le plan d'atténuation repose sur une série de mesures adaptées aux types de risques identifiés, prenant en compte les réalités spécifiques des provinces ciblées et des villages.

Voici quelques exemples détaillés de plans d'atténuation de risques identifiés dans le cadre du PNDA.

1) Risques de gestion

Exemples de plan d'atténuation :

- *Optimisation des processus de gestion des activités* : Mettre en place des outils numériques de gestion des projets pour assurer le suivi en temps réel des activités et des ressources. Ces outils permettraient une meilleure traçabilité des intrants agricoles, des délais de livraison et de l'utilisation des ressources.

- *Renforcement de la formation des gestionnaires locaux* : Former les responsables des composantes et les agents de terrain sur la gestion de projet, la gestion des ressources et la coordination intersectorielle pour minimiser les retards dans l'exécution des activités.
- *Plan de continuité des activités* : Développer un plan de continuité des opérations en cas de perturbations imprévues dans la gestion, par exemple en cas d'absences prolongées de certains responsables clés ou d'indisponibilité des ressources humaines.

2) Risques techniques

Exemples de plan d'atténuation :

- *Assistance technique continue* : Travailler en étroite collaboration avec INÉRA et SENASEM pour les appuis constants aux agriculteurs par le biais de services de vulgarisation agricole pour éviter les erreurs dans la mise en œuvre des pratiques modernisées.

3) Risques politiques et institutionnels

Exemples de plan d'atténuation :

- *Dialogue politique renforcé* : Maintenir des échanges réguliers entre les autorités locales, provinciales et nationales pour harmoniser les priorités du gouvernement avec les objectifs du PNDA, et éviter tout changement abrupt qui pourrait perturber la mise en œuvre du Programme.
- *Soutien institutionnel aux services locaux* : Offrir des formations spécifiques aux cadres des ministères provinciaux et aux administrations locales sur la gestion des projets agricoles, pour renforcer leurs capacités à soutenir les activités du Programme en cas d'instabilité politique.
- *Accords interinstitutionnels formels* : Signer des accords de partenariat formels entre les différents ministères (Agriculture, Pêches et Élevage, et Développement Rural) afin de garantir la continuité des activités, même en cas de changement politique ou administratif.

4) Risques socio-économiques

Exemple de plan d'atténuation :

- *Programmes de sensibilisation communautaire* : Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour informer les petits exploitants agricoles des avantages des nouvelles technologies et pratiques agricoles. Ces campagnes devraient être adaptées aux spécificités culturelles et linguistiques des régions concernées.

5) Risques environnementaux et climatiques

Exemple de plan d'atténuation :

- *Systèmes d'alerte précoce* : Mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour informer les agriculteurs et les gestionnaires de Programme des conditions météorologiques extrêmes prévues (inondations, sécheresses) et des mesures à prendre pour protéger les récoltes et les infrastructures agricoles.

6) Risques de santé et sécurité

Exemple de plan d'atténuation :

- *Soutien aux régions en situation d'insécurité* : Travailler en collaboration avec les autorités locales et les ONG pour améliorer la sécurité dans les régions touchées par des conflits. Cela pourrait inclure des initiatives de médiation communautaire ou des programmes de développement économique ciblés pour les jeunes afin de réduire les causes sous-jacentes de l'insécurité.

III.4.4 Suivi et contrôle

Il s'agit de suivre les risques identifiés et les nouvelles menaces potentielles au cours du cycle de vie du Programme, et de mettre dans les rapports de suivi périodiques l'état des risques et les actions entreprises pour les gérer. Il est important de noter la date à laquelle le risque a été identifié pour la première fois, d'estimer son impact potentiel et la probabilité qu'il se concrétise, d'expliquer les mesures recommandées à prendre et par qui, et de noter quand le risque est fini.

Il est indispensable de mettre en place des systèmes d'alerte pour informer rapidement les gestionnaires du Programme en cas de risques émergents.

Voici quelques risques pour le Programme (cf Manuel des opérations du PNDA).

Tableau 7: Risques clés du Programme et mesures d'atténuation

Risque au niveau de l'agence d'exécution	Notation des Risques	Atténuation des Risques
Capacité Institutionnelle pour la mise en œuvre et pérennité	Substantiel	Renforcer la capacité de conception des politiques et le cadre réglementaire des agences de mise en œuvre. Soutenir la formulation de politiques, la législation / réglementation pour améliorer l'environnement réglementaire de l'agro-industrie et la fourniture de services.
Politique et Gouvernance	Elevé	Recrutement de spécialiste en passation des marchés au niveau de l'UNCP et des UPEP. Renforcement de l'examen de la mise en œuvre et l'appui de l'IDA. Examen préalable et postérieur des documents de passation des marchés.
Conception technique de projets ou Programmes	Substantiel	L'UNCP, les UPEP, les Services techniques du MinAgri et partenaires techniques vont élaborer un plan de mise en œuvre adéquat et adhéreront à une approche séquentielle de la mise en œuvre du Programme.
Social et Environnemental	Elevé	Mise en œuvre de gestion environnementales et sociales sera respectée et combinée à une surveillance régulière et étroite des activités.
Fiduciaire	Elevé	Recrutement d'experts qualifiés à l'UNCP, l'UPEP et formation du personnel dans les domaines fiduciaires, la mise en œuvre des plans d'atténuation, supervision étroite et appui personnalisé à l'équipe du Programme par des spécialistes concernés de la Banque (gestion financière et passation des marchés).

Suivi et Pérennité	Modéré	Mise en place d'un système de suivi-évaluation géographique et des cartes mises à jour disponibles en ligne et hors ligne. Implication des DEP du Min Agri, MINDER, MINPEL et des CPSP au S&E, à la collecte et gestion. Le Programme va mettre en place un système numérique de suivi et évaluation intégré.
Risque Global pour l'Exécution	Substantiel	

Source : « Manuel des opérations du PNDA » 2021

IV. PLAN D'ÉVALUATION

Les évaluations servent à améliorer la gestion du Programme en cours et à orienter la planification de futurs projets. Ils permettent également de fournir des preuves de la performance du Programme pour les bailleurs de fonds, les décideurs politiques, et les parties prenantes.

IV.1 Les types d'évaluations

Il existe différents types d'évaluation de programme, l'évaluation formative, l'évaluation sommative, l'évaluation ex ante et l'évaluation d'impact.

L'évaluation ex ante du programme consiste à analyser de manière prospective les résultats et impacts potentiels du programme avant sa mise en œuvre complète. Cette évaluation permet de s'assurer que les objectifs définis sont atteignables, de prévoir les impacts économiques, sociaux et environnementaux, et d'anticiper les risques ou obstacles qui pourraient compromettre l'efficacité du programme. Cette évaluation a été faite avant la mise en œuvre du Programme (un résumé de l'évaluation se trouve dans le document du Programme).

L'évaluation formative a lieu durant la mise en œuvre du Programme. Elle peut aussi être faite à mi-parcours. L'objectif principal est d'analyser le déroulement actuel du Programme, d'identifier les forces et faiblesses dans sa mise en œuvre, et de fournir des recommandations pour améliorer les activités en cours. Elle permet d'ajuster les stratégies, de réorienter les ressources si nécessaire, et d'optimiser les chances d'atteindre les objectifs finaux du Programme.

L'évaluation sommative est réalisée à la fin du Programme, à la fin des cinq ans de la mise en œuvre. Elle a pour but de fournir un jugement global sur les performances du Programme, en mesurant si les objectifs fixés ont été atteints et en analysant les impacts à long terme. Elle permet de déterminer si les activités menées ont généré les résultats attendus et de tirer des leçons pour des programmes ou projets agricoles futurs pour la RDC ou pour l'extension du PNDA.

L'évaluation d'impact se concentre sur les effets à long terme du Programme, notamment les changements structurels et les impacts sociaux ou économiques sur les ménages ruraux.

IV.2 Questions d'évaluation clés

Les évaluations formative et sommative du PNDA se concentreront sur plusieurs questions clés pour mesurer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, les impacts et la durabilité du Programme. En voici quelques exemples de questions clés.

La **pertinence** du Programme

- Le Programme répond-il aux besoins réels des agriculteurs, particulièrement dans les 4 provinces concernées ?
- Les objectifs du Programme sont-ils en adéquation avec les priorités agricoles nationales ?

L'**efficacité** du Programme

- Dans quelle mesure les activités prévues ont-elles été réalisées comme prévu ?
- Quelles sont les difficultés ou obstacles qui ont ralenti /freiné la mise en œuvre du Programme et comment ont-elles été surmontées ?

L'**efficience** du Programme

- Les ressources (financières, humaines et matérielles) ont-elles été utilisées de manière efficace et optimale pour obtenir les résultats attendus ?
- Les processus de gestion et de coordination entre les différents ministères (Agriculture, Pêche et Élevage, Développement Rural) sont-ils efficaces ?

Les **impacts** du Programme

- Quels sont les impacts directs du Programme sur la productivité agricole des petits exploitants ?
- Quels sont les impacts directs du Programme sur la sécurité alimentaire des ménages des petits exploitants ?
- Les agriculteurs bénéficiaires ont-ils observé une amélioration de leur accès aux marchés et aux services agricoles publics ?

La **durabilité** du Programme

- Les résultats obtenus sont-ils susceptibles de perdurer après la fin du financement ?
- Dans quelle mesure les capacités locales (agriculteurs, institutions publiques, etc.) ont-elles été renforcées pour maintenir les résultats à long terme ?

IV.3 Méthodes d'évaluation

Pour répondre aux questions clés d'évaluation décrites ci-dessus, une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives pourrait être utilisée. En combinant ces différentes méthodes, l'évaluation du PNDA sera à la fois rigoureuse et inclusive, capturant ainsi un éventail large et représentatif des effets du Programme.

IV.3.1 Groupes de discussion (Focus groups)

Les focus groups réuniront différents acteurs, tels que les agriculteurs, les agents gouvernementaux locaux et provinciaux, les ONG locales, les différentes organisations paysannes et les chefs des villages pour discuter des impacts et des défis du Programme.

Ces groupes permettront de recueillir des informations sur la perception locale du Programme et de mieux comprendre les dynamiques sociales et économiques influençant les résultats.

IV.3.2 Études de cas

Cette méthode permet d'analyser de manière approfondie des situations spécifiques dans les provinces ciblées. Elle met l'accent sur les expériences individuelles ou collectives pour comprendre les défis, succès, et innovations. Elle sera réalisée par des visites de terrain, des entretiens approfondis avec les agriculteurs, les agents de développement, et les responsables locaux pour recueillir des données qualitatives.

IV.3.3 Enquêtes auprès des bénéficiaires

C'est une enquête de satisfaction, réalisée pendant la mise en œuvre, auprès des bénéficiaires directs. Elle consiste à recueillir des retours sur l'expérience et la perception des bénéficiaires par rapport au Programme. Cette enquête permet d'évaluer leur niveau de satisfaction et d'identifier les améliorations potentielles.

IV.3.4 Analyse d'impact

Cette méthode vise à quantifier les changements observés grâce à la mise en œuvre du PNDA. Une approche « **avant-après** » ou « **avec-sans** » sera utilisée pour mesurer les impacts sur la productivité agricole, l'accès aux marchés, et les conditions de vie des agriculteurs.

La 1^{ère} approche consiste à comparer la situation de référence (ligne de base) avec la situation finale (après le Programme).

La seconde approche (« avec-sans ») implique l'utilisation de groupes témoins dans certaines zones non couvertes par le Programme pour comparer les résultats. Cela requiert de sélectionner des groupes témoins ayant des caractéristiques semblables le plus possible à celles du groupe expérimental (les bénéficiaires du Programme). L'analyse d'impact consiste à analyser les différences entre les 2 groupes sur les variables clés à mesurer.

IV.3.5 Analyse coûts-bénéfices (ACB)

Cette méthode permet d'évaluer l'efficacité du Programme en comparant les coûts associés à la mise en œuvre du Programme avec les bénéfices qu'il génère. Cela permet de savoir si les ressources ont été utilisées de manière optimale.

Tous les coûts économiques et environnementaux directs et indirects du Programme et tous les bénéfices que le Programme génère, à la fois économiques, sociaux et environnementaux doivent

être identifiés et quantifiés en termes monétaires. Par la suite, une analyse sur quelques indicateurs clés sera faite.

IV.4 Calendrier des évaluations

Le tableau ci-dessous décrit le calendrier des différentes évaluations à réaliser dans le cadre du PNDA. Il spécifie les années durant lesquelles chaque évaluation aura lieu.

Tableau 8 : Calendrier des évaluations

Évaluations	Année					Méthodologie	Responsables
	2023	2024	2025	2026	2027		
Auto-évaluation Évaluation périodique			X	X	X	Études des cas Focus group Enquêtes auprès des bénéficiaires	UNCP
Évaluation à mi-parcours			X			Évaluation formative	UNCP
Évaluation de fin de projet					X	Évaluation ex post (ACB)	UNCP, Cabinet externe
Évaluation d'impact					X	Analyse d'impact Focus group	UNCP, Cabinet externe

V. MÉTHODOLOGIE DE SUIVI-ÉVALUATION

Le suivi consiste en la collecte et l'analyse régulières d'information visant à faciliter la prise de décisions en temps opportun, à garantir la transparence et à fournir une base pour l'évaluation et la capitalisation des expériences. Il s'agit d'une fonction continue qui repose sur une collecte systématique de données afin d'informer les responsables et les acteurs de terrain sur l'état d'avancement du Programme en cours d'exécution, ainsi que sur la progression vers les objectifs fixés.

Le suivi technique est assuré par les partenaires locaux dans chaque province en charge de la mise en œuvre terrain des activités, les UPEP et les OT. Ces derniers ont pour mandat de suivre au quotidien la mise en œuvre des activités, les cibles à atteindre, d'identifier les risques pouvant impacter la mise en œuvre des activités, de rapporter et de capitaliser les expériences. L'UPEP prépare un rapport sur les résultats des suivis techniques.

Le suivi des résultats, relève de la compétence des équipes de mise en œuvre au niveau des UPEPs et de l'UNCP. Il a pour objectif de s'assurer que la mise en œuvre du Programme reste conforme à la planification initiale. Le suivi des résultats se base essentiellement sur les documents de programme y compris le cadre de mesure des résultats et les fiches des indicateurs. Le processus de suivi des résultats permet de disposer des rapports périodiques.

V.1 Enquêtes

Plusieurs types d'enquêtes peuvent être réalisées pour assurer le suivi des différents objectifs et résultats et pour évaluer le Programme.

V.1.1 Enquête de référence (Baseline)

Cette enquête sert à établir la situation de référence avant la mise en œuvre du Programme, et elle est réalisée durant l'année 0. Elle consiste à collecter des données sur les conditions initiales des petits exploitants agricoles, l'état des infrastructures existantes, l'accès aux marchés, ainsi que sur les services agricoles disponibles.

Son utilité réside dans le fait qu'elle permet d'évaluer les indicateurs d'objectifs et de performance tout au long du Programme, en comparant les résultats obtenus à cette situation de départ.

L'enquête est réalisée une seule fois, avant la mise en œuvre du Programme.

V.1.2 Enquête sur la production

Cette enquête vise à recueillir des données détaillées sur la production des petits exploitants agricoles dans le cadre PNDA. Elle permet d'évaluer l'impact des interventions du Programme sur l'adoption de nouvelles technologies agricoles, les bonnes pratiques. Elle s'intéresse également à la manière dont ces facteurs influencent l'accès aux marchés locaux pour les petits exploitants. Les résultats de cette enquête contribueront à l'évaluation des performances du Programme et à l'amélioration continue des activités du Programme

Les données recueillies serviront à renseigner les indicateurs de performance tels que :

- Rendement des cultures : Quantité de production par hectare pour les différentes cultures (ex. tonnes/ha pour le maïs amélioré).
- Taux d'adoption des nouvelles technologies : Pourcentage de petits exploitants agricoles ayant utilisé des semences améliorées, de la nouvelle technologie AIC et AIN.
- Taux de mortalité animale : Mesure des progrès réalisés dans la réduction du taux de mortalité animale.
- Ventes de produits agricoles : Quantité des produits agricoles vendus sur le marché formel et évolution du prix de vente.

V.1.2.1 Rendement des cultures

1) La collecte des données

Données à collecter :

- Type de culture (maïs, manioc, arachide, etc.).
- Surface cultivée (en hectares).
- Quantité totale produite (en kilogrammes ou tonnes).
- Méthodes de production utilisées (semences améliorées ou conventionnelles).

- Données sur les rendements avant PNDA dans la zone d'intervention (sources secondaires)

Méthode de collecte :

- Collecter les données de production directement auprès des exploitants via des questionnaires et des carnets de production.
- Utiliser la méthode par carré de rendement pour estimer la productivité à partir d'échantillons.

2) Échantillonnage

Sur la base d'une marge d'erreur de 5% et d'un niveau de confiance de 95%, une population de 110 00 (cible en 2024/2025 pour les 2 saisons) donne un échantillon de 382, soit un taux de sondage minimal de 0,347%. On applique ce taux de sondage sur les cibles de chaque année. L'échantillon sera proportionnellement distribué selon la taille en agriculteurs bénéficiaires de chaque province comme indiqué dans le tableau 9 ci-dessous.

Tableau 9 : Taille de l'échantillon des agriculteurs bénéficiaires pour l'enquête sur la production

N°	PROVINCE	2024	2025	2026	2027	TOTAL
1	KWILU	-	172	172	94	437
2	KASAI CENTRAL	-	95	95	52	243
3	KASAI	-	115	115	62	291
	TOTAL		382	382	208	972

L'échantillon de chaque province sera ensuite **réparti proportionnellement** dans chaque **territoire**, puis par **secteur**, par **groupement**, et enfin **village**, en fonction du nombre de bénéficiaires dans chaque unité administrative. Le processus se déroulera comme suit :

- **Répartition dans les territoires** : Une fois l'échantillon provincial défini, il est à son tour réparti entre les **territoires** de la province, toujours en fonction du nombre de bénéficiaires dans chaque localité.
- **Répartition par secteur** : Ensuite, dans chaque territoire, l'échantillon est réparti parmi les **secteurs** selon le nombre de bénéficiaires présents dans chaque secteur ou groupement.
- **Répartition par groupement** : Ensuite, dans chaque secteur, l'échantillon est réparti parmi les **groupements**.
- **Répartition au niveau des villages** : Finalement, au sein de chaque secteur ou groupement, l'échantillon est distribué proportionnellement parmi les **villages**, en tenant compte des bénéficiaires dans chaque village

3) Détermination des rendements à partir des échantillons de cultures

Il est crucial que les données sur le rendement soient précises et fiables pour établir une corrélation entre la fertilité des sols et la production agricole. Pour garantir la qualité des données, **les enquêteurs seront assistés par au moins un technicien formé en agriculture pour l'échantillonnage des cultures**.

Pour garantir des données précises et fiables sur le rendement, la procédure suivante sera appliquée :

Étape 1 : Sélection de l'échantillon représentatif

- Sélectionner une surface typique de 10 m x 10 m (100 m²) ;
- Choisir le nombre de carrés proportionnel à la superficie totale du champ de l'agriculteur ;
- Délimiter les carrés dans les champs après les semis

Étape 2 : Récolte et pesée des cultures

- Récolter la production sur les carrés délimités, puis peser la récolte en respectant le protocole spécifique à chaque culture.
- Assurer une traçabilité rigoureuse des données.
- La récolte sera supervisée par un technicien agronome, formé aux procédures spécifiques à chaque culture.

Étape 4 : Techniques de mesure des rendements par culture

1. Maïs (unité : kg)
 - Sécher le maïs et retirer les grains des épis avant pesée.
 - Suivre rigoureusement les quantités récoltées pour mesurer les rendements ultérieurement.
 - Le délai entre la récolte et le pesage doit être de 1 à 2 semaines pour un séchage complet.
2. Arachide (unité : kg en coque)
 - Sécher les arachides avec les gousses, ça prend environ 1 à 2 semaines
 - Mesurer le rendement une fois les arachides sèches.
3. Manioc (unité : kg)
 - Peser le manioc immédiatement après récolte sans appliquer de facteur de conversion, le poids mesuré étant définitif.

Notes supplémentaires :

- Les enquêteurs et techniciens doivent suivre les protocoles spécifiques pour garantir l'exactitude des mesures.
- Les outils de mesure (balances, unités de pesée) doivent être vérifiés et calibrés régulièrement.

4) Établissement de l'inventaire de production agricole par l'OT

- Énumérer les dimensions de tous les champs cultivés par les agriculteurs échantillonnés.
- Identifier les cultures pour chaque champ, en notant les cultures mixtes (par exemple, maïs et manioc) et les types de variétés cultivées pour assurer la précision dans le calcul des rendements.
- Enregistrer les données dans un formulaire approprié (ex. : feuille Excel) contenant les informations suivantes :
 - Numéro de l'agriculteur (identifiant unique).
 - Province, ville/territoire, secteur, groupement, quartier.

- Nom de l'enquêteur et date de collecte.
- Dimension du champ.
- Cultures cultivées sur chaque champ, avec indication des cultures mixtes.
- Types de variétés utilisées.
- Observations complémentaires sur les pratiques de culture.
- Production totale et rendement.

5) Les formules pour calculer les indicateurs

$\text{Rendement (tonnes/ha)} = \left(\frac{\sum \text{Quantité récoltée dans le carré (kg)}}{\sum \text{Surface du carré (m}^2\text{)}} \right) \times 10\,000$	
IODP2.3 Hausse du rendement de maïs à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	$\frac{(\text{Rendement moyen maïs pendant la période} - \text{Rendement moyen maïs avant PNDA})}{\text{Rendement moyen manioc avant PNDA}} \times 100$
IODP2.4 Hausse du rendement de manioc à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	$\frac{(\text{Rendement moyen manioc pendant la période} - \text{Rendement moyen manioc avant PNDA})}{\text{Rendement moyen manioc avant PNDA}} \times 100$
IODP2.5 Hausse du rendement de l'arachide à travers l'incorporation de pratiques/technologies intelligentes face au climat	$\frac{(\text{Rendement moyen arachide pendant la période} - \text{Rendement moyen arachide avant PNDA})}{\text{Rendement moyen arachide avant PNDA}} \times 100$

V.1.2.2 Taux d'adoption des nouvelles technologies

Données à collecter :

- **Nombre total d'exploitants agricoles** dans la zone d'intervention.
- **Nombre d'exploitants utilisant les nouvelles technologies** (par ex. semences améliorées, techniques de gestion intégrée des cultures – AIC, techniques de gestion intégrée des nutriments – AIN).
- **Description des technologies adoptées** (types de semences, nouvelles pratiques culturales, utilisation de l'irrigation ou du compost, etc.)

Méthode de collecte :

- Enquête auprès des exploitants pour identifier ceux qui utilisent des technologies innovantes.
- Observation directe sur le terrain pour vérifier l'utilisation de ces technologies.
- Discussions avec des experts et des agents de terrain pour valider l'adoption effective.

Formule :

$$\text{Taux d'adoption de la technologie AIC} = \left(\frac{\text{Nombre d'exploitants utilisant la nouvelle technologie AIC}}{\text{Nombre total d'exploitants agricoles}} \right) \times 100$$

$$\text{Taux d'adoption de la technologie AIN} = \left(\frac{\text{Nombre d'exploitants utilisant la nouvelle technologie AIN}}{\text{Nombre total d'exploitants agricoles}} \right) \times 100$$

V.1.2.3 Taux de mortalité animale

Données à collecter auprès des enquêtés :

- **Nombre total d'animaux** détenus par les petits exploitants enquêtés avant les interventions du Programme et au début de la période.
- **Nombre d'animaux morts** au cours d'une période donnée (avant et après l'intervention du Programme, ie durant la période).
- **Causes principales de la mortalité animale** (maladies, malnutrition, accidents, etc.).
- **Interventions spécifiques** réalisées dans le cadre du Programme pour améliorer la santé animale (vaccinations, traitements vétérinaires, formation des exploitants).

Autres données

- **Taux de mortalité animale** dans la zone d'intervention avant PNDA

Méthode de collecte :

- Enquête auprès des éleveurs pour recueillir les données sur les animaux détenus et les mortalités survenues.
- Collecte des données vétérinaires auprès des services d'encadrement rural.
- Observation directe des animaux lors de visites de terrain.

Méthode de calcul

- Calculer le taux de mortalité pendant la période

$$\text{Taux de mortalité de la période} = \left(\frac{\sum \text{Nombre d'animaux morts pour tous les éleveurs}}{\sum \text{Nombre total d'animaux au début de la période pour tous les éleveurs}} \right) \times 100$$

- Calculer la variation du taux de mortalité entre la période d'avant PNDA et la période pendant le Programme

L'indicateur **IODP2.6** « Réduction du taux de mortalité animale au niveau des petits exploitants cibles » est obtenu en calculant la différence en % entre le taux de mortalité avant le Programme et le taux de mortalité pendant le Programme

$$\begin{aligned} & \text{Réduction du taux de mortalité animale} \\ &= \frac{(\text{Taux de mortalité avant PNDA} - \text{Taux de mortalité de la période})}{\text{Taux de mortalité avant PNDA}} \end{aligned}$$

V.1.2.4 Vente des produits agricole sur le marché

L'indicateur à renseigner est **IODP1.1**

Hausse des ventes de produits agricoles et alimentaires sur les marchés formels par les petits exploitants bénéficiaires du Programme

$$= \frac{\text{Ventes des produits agricoles pendant la période} - \text{Ventes des produits agricoles avant PNDA}}{\text{Ventes des produits agricoles avant PNDA}} \times 100$$

L'objectif est de mesurer l'augmentation des revenus générés par les ventes des produits agricoles et alimentaires sur les marchés formels grâce à l'appui du Programme. Voici les étapes principales pour calculer cet indicateur.

1. Collecte des données pour chaque exploitant

- Quantité vendue pour chaque produit agricole et chaque produit alimentaire (avant et après l'intervention du Programme).
- Prix de vente pour chaque produit agricole et produit alimentaire (avant et après) sur les marchés formels. Ces données sont collectées pour **chaque exploitant** et pour **chaque produit** (maïs, manioc, arachide, etc.).

2. Calcul du revenu global pour chaque exploitant

Pour chaque exploitant et pour chaque produit., le revenu généré par les ventes est calculé en multipliant la quantité vendue par le prix de vente. Le prix de vente est la moyenne des prix sur les marchés formels.

Le revenu total d'un exploitant est la somme des revenus de chaque produit.

$$\begin{aligned} & \text{Revenu total de l'exploitant avant le programme} \\ &= \sum (\text{Quantité vendue avant} \times \text{Prix moyen avant}) \\ \\ & \text{Revenu total de l'exploitant pendant la période} \\ &= \sum (\text{Quantité vendue pendant la période} \times \text{Prix moyen pendant la période}) \end{aligned}$$

3. Calcul de la hausse des revenus

Pour tous les exploitants, on fait la somme des revenus totaux avant Programme et la somme des revenus totaux pendant la période

$$\text{Revenu total avant le programme} = \sum \text{Revenus totaux de tous les exploitants avant le programme}$$

$$\text{Revenu total pendant la période} = \sum \text{Revenus totaux de tous les exploitants pendant la période}$$

$\text{Hausse des revenus} = \frac{(\text{Revenu total pendant la période} - \text{Revenu total avant le programme})}{\text{Revenu total avant le programme}} \times 100$

V.1.2.5 Calendrier

Le calendrier de collecte des données sur la production s'articule autour des deux principales saisons agricoles : la saison A (généralement de juin à décembre) et la saison B (de décembre à juin). La collecte des données sur la production agricole se fera après chaque récolte, c'est-à-dire à la fin de chacune de ces deux saisons.

Après chaque récolte des 2 saisons, l'OT avec la SNSA, les moniteurs agricoles du ministère de l'agriculture, les techniciens vétérinaires du ministère de la Pêche et de l'élevage, et les agronomes procèdera à la collecte des données sur les rendements agricoles pour évaluer la quantité produite pour chaque culture. Les données recueillies incluront le type de culture, les données de rendements des carrés de champs prédéfinis à l'échantillonnage.

Une enquête auprès des exploitants agricoles sera également organisée après la deuxième saison, c'est à dire à la fin de l'année agricole, soit juste après la récolte de la saison A. Cette enquête permettra d'évaluer la performance sur l'ensemble de l'année, en couvrant les deux saisons agricoles. Les exploitants seront interrogés sur les pratiques adoptées au cours des deux saisons (par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies AIN et AIC), les défis rencontrés, les ventes réalisées sur le marché formel, et la perception de l'impact des interventions du Programme...

En résumé, ce processus structuré assure que les données collectées reflètent l'ensemble de l'année agricole, tout en permettant une évaluation globale de la performance du Programme sur plusieurs indicateurs tels que les rendements, les adoptions technologiques et les ventes des produits agricoles.

Figure 5 : Calendrier de la collecte des données sur les rendements et de l'enquête sur la production

	déc	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	octobre	nov	déc	janvier	février	mars
	Année 1												Année 2			
	Saison B												Saison A			
	Préparation terrain	Séances				Recolte							Préparation terrain	Séances		
							Préparation terrain	Séances				Recolte				
Collecte des données sur la production																
Enquête sur la production																
Révision des outils et méthodologie																
Formation des agents de terrain																
Collecte des données																
Exploitation des données																

V.1.3 Enquête auprès des bénéficiaires

L'enquête de satisfaction des bénéficiaires directs consiste à recueillir des retours sur l'expérience et la perception des bénéficiaires par rapport au Programme. Cette enquête permet d'évaluer leur niveau de satisfaction et d'identifier les améliorations potentielles.

Elle permet de renseigner les indicateurs sur le niveau de satisfaction des agriculteurs par rapport à l'accès aux technologies, aux marchés, et aux services de soutien.

Méthodologie

La **population cible** comprend les bénéficiaires du Programme, notamment les petits exploitants agricoles, les utilisateurs des infrastructures rurales, les MPME agro-industrielles.. Ces bénéficiaires peuvent être divisés en sous-groupes pour des analyses plus détaillées en fonction de critères tels que l'âge, le sexe et la localisation géographique.

En ce qui concerne l'**échantillonnage**, deux méthodes principales peuvent être utilisées : l'échantillonnage aléatoire et l'échantillonnage stratifié. Avec l'échantillonnage aléatoire, chaque bénéficiaire a une chance égale d'être sélectionné pour l'enquête. En revanche, l'échantillonnage stratifié permet de sélectionner des échantillons spécifiques au sein de sous-groupes de bénéficiaires, garantissant ainsi une représentation équitable de chaque catégorie.

Le **questionnaire** pourrait inclure des questions portant sur la qualité des semences reçues, la facilité d'accès aux nouvelles technologies, l'effet perçu sur le rendement, ainsi que le soutien technique reçu lors de l'utilisation des semences. Les types de questions utilisées pourraient inclure des **échelles de Likert** (allant de "très satisfait" à "très insatisfait"), des **questions fermées** (oui/non, par exemple "satisfait" ou "pas satisfait"), ainsi que des **questions ouvertes** permettant aux répondants de formuler des **commentaires libres** ou de faire des **suggestions d'amélioration**.

La **fréquence** de l'enquête pour la composante 1 peut être fixée à la fin de la saison A, soit en janvier (après la récolte), mais l'enquête couvre les 2 saisons agricoles. Quant aux composantes 2 et 3, cette enquête pourrait se faire 2 fois le long du cycle de la composante, soit à mi-parcours et à la fin de la composante.

Des exemples de questionnaires se trouvent en annexe.

V.1.4 Les observations directes (descentes sur terrain)

Les observations directes consistent à observer les pratiques agricoles, les conditions de vie, et les événements sur le terrain, nécessitant ainsi une présence physique dans les zones d'intervention du Programme. Ce mode de collecte de données permet une évaluation objective des éléments observables, tels que la mise en œuvre des nouvelles technologies AIC et AIN, ainsi que l'état des exploitations agricoles.

Contrairement aux méthodes basées sur les déclarations des participants, les observations directes offrent l'avantage de recueillir des informations non biaisées par les perceptions des exploitants, en garantissant une vérification visuelle et concrète. Par exemple, l'observateur pourra constater directement l'adoption effective ou non des techniques recommandées (rotations de cultures, conservation des sols, utilisation de semences améliorées, etc...) et l'amélioration des infrastructures agricoles comme les systèmes d'irrigation.

Cette méthode est complémentaire aux autres outils de collecte de données tels que les enquêtes auprès des agriculteurs et les groupes de discussion. **Elle permet de valider ou de corriger les réponses obtenues lors des questionnaires en confrontant les données déclarées avec les faits observés sur le terrain.** Ainsi, les observations directes renforcent la fiabilité des résultats en apportant une dimension objective et qualitative à l'évaluation des impacts du PNDA.

V.1.5 Groupe de discussion (Focus Group)

Le focus group est un outil qualitatif essentiel dans le cadre du suivi-évaluation du PNDA. Il consiste à organiser des discussions de groupe avec un ensemble restreint de participants, souvent entre 8 et 12 personnes, sélectionnées parmi les bénéficiaires directs du Programme (agriculteurs, représentants des MPME, ou autres acteurs concernés). Ces discussions permettent de recueillir des perceptions, des opinions, des expériences, et des suggestions sur les différents aspects du programme.

Les focus groups peuvent être utilisés pour :

- **Comprendre les expériences des bénéficiaires** : Les participants peuvent partager leurs vécus concernant l'adoption des nouvelles technologies agricoles, leur accès aux marchés et aux services fournis par le Programme, ainsi que l'impact du Programme sur leurs revenus et conditions de vie.
- **Évaluer la perception des services fournis** : Le focus group permet d'obtenir des informations détaillées sur la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de l'assistance technique, des formations, des intrants agricoles fournis, ou encore de l'accès au financement. Les participants peuvent discuter des points forts et des aspects à améliorer dans l'exécution du PNDA.
- **Explorer les obstacles rencontrés** : Cet outil permet de mieux cerner les défis auxquels les petits exploitants agricoles ou les MPME font face. Les discussions peuvent révéler des problèmes d'accès aux ressources, des difficultés liées à l'adoption des pratiques climato-intelligentes, ou des retards dans l'acheminement des intrants agricoles.
- **Collecter des idées pour des améliorations** : Le focus group offre un espace où les bénéficiaires peuvent proposer des solutions ou des recommandations pour améliorer l'efficacité du programme, que ce soit en termes de communication, de mécanismes de soutien, ou de distribution des ressources.

Les résultats des focus groups permettent d'enrichir les données quantitatives obtenues par les enquêtes auprès des ménages ou les observations directes. Ils offrent une perspective plus nuancée sur les perceptions et attentes des acteurs impliqués, et aident les gestionnaires du Programme à ajuster les interventions en fonction des retours du terrain. Ces discussions, facilitant une interaction plus libre et interactive, favorisent aussi l'émergence de problématiques non identifiées par d'autres méthodes de collecte de données.

V.1.6 Enquête socio-économique auprès des ménages

L'objectif principal de cette enquête est d'évaluer l'impact socio-économique du Programme sur les ménages des petits exploitants agricoles. L'enquête se concentrera sur plusieurs aspects clés pour déterminer les effets directs et indirects du programme. Voici un détail plus approfondi :

(i) Objectifs de l'enquête

- **Revenus des ménages** : Mesurer si les revenus agricoles et non-agricoles des ménages ont augmenté grâce à l'adoption de nouvelles technologies, à l'accès aux marchés, et à l'assistance du PNDA.
- **Sécurité alimentaire** : Évaluer si les interventions du Programme ont permis d'améliorer l'accès à une alimentation adéquate et la capacité des ménages à se nourrir de manière stable tout au long de l'année.
- **Niveau de pauvreté** : Mesurer les changements dans les indicateurs de pauvreté, tels que les actifs possédés, l'accès aux services de base, et la capacité des ménages à faire face aux chocs économiques ou climatiques.
- **Bien-être général** : Inclure des indicateurs sur la qualité de vie des ménages, tels que la santé, l'éducation, et l'accès aux infrastructures (eau, électricité, routes, etc.).

(ii) Échantillonnage

Pour garantir des résultats représentatifs, un échantillonnage stratifié sera réalisé. Cet échantillonnage inclura :

- **Ménages participants** : Ceux qui bénéficient directement des activités du Programme y compris ceux ayant adopté les pratiques agricoles promues par le programme ou reçu des intrants agricoles.
- **Ménages témoins** : Sélection d'un groupe de ménages similaires aux participants mais qui ne bénéficient pas du programme, afin de permettre une comparaison des résultats et d'identifier les impacts spécifiques du Programme.

L'échantillon sera tiré des différentes provinces d'intervention du programme (Kwilu, Kongo-Central, Kasai-Central, Kasai) pour capturer les divers contextes socio-économiques et agro-écologiques.

(iii) Méthodologie de collecte des données

- **Questionnaires structurés** : Des questionnaires normalisés seront utilisés pour recueillir des informations sur les revenus, les dépenses, la sécurité alimentaire, les pratiques agricoles, et les conditions de vie.
- **Interviews individuelles** : Les chefs de ménage seront principalement ciblés pour obtenir des données fiables sur les changements économiques et sociaux qu'ils ont vécus grâce au programme.
- **Utilisation d'outils de mesure de la pauvreté** : Des indicateurs spécifiques, comme les scores de pauvreté ou les mesures de consommation alimentaire, seront utilisés pour évaluer avec précision les niveaux de bien-être.

(iv) Analyse des résultats

- **Comparaison avant-après** : Comparer les données collectées avec les informations de référence pour mesurer les changements.

- **Analyse comparative entre ménages participants et témoins** : Identifier les différences significatives entre les ménages bénéficiant du programme et ceux qui n'en bénéficient pas, afin de mieux comprendre l'impact du PNDA.

Les résultats de cette enquête socio-économique seront cruciaux pour informer les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, et les autres parties prenantes sur l'efficacité du PNDA dans l'amélioration des conditions de vie des petits exploitants agricoles. Ils serviront également à ajuster les interventions du programme pour accroître son impact.

V.2 Outils de collecte d'informations

Pour assurer un suivi-évaluation efficace du Programme National de Développement Agricole (PNDA), l'utilisation d'une gamme diversifiée d'outils de collecte de données est essentielle. Ces outils permettent d'obtenir des informations quantitatives et qualitatives sur les bénéficiaires, les pratiques agricoles, et les impacts du programme. Voici une présentation détaillée des principaux outils utilisés.

V.2.1 Les questionnaires

Les **questionnaires structurés** constituent l'un des outils clés pour la collecte de données quantitatives. Ils peuvent être administrés de manière standardisée à un large échantillon de participants et permettent de collecter des informations précises et comparables. Voici les points clés concernant leur utilisation :

- **Administration** : Les questionnaires peuvent être administrés par des enquêteurs formés ou, dans certains cas, remplis directement par les participants eux-mêmes. L'administration par des enquêteurs garantit une meilleure compréhension des questions et réduit le risque de réponses incomplètes ou erronées.
- **Contenu** : Les questionnaires couvrent une variété de sujets, allant des aspects socio-économiques des ménages (revenus, sécurité alimentaire, accès aux services) à l'adoption de nouvelles pratiques agricoles promues par le PNDA.
- **Exemples en annexes** : Les questionnaires types, disponibles en annexe, montrent comment les questions sont structurées pour mesurer des indicateurs spécifiques du programme, tels que la productivité agricole, les pratiques climato-intelligentes, et l'accès au marché.

V.2.2 La cartographie et les systèmes d'Information Géographique (SIG)

Cet outil sert à mesurer les superficies des champs de culture. L'outil sert surtout à renseigner l'indicateur IR1.1. 6 « Superficie sous pratiques agricoles intelligentes face au climat dans les provinces ». C'est la Superficie totale emblavée sous pratique AIC et AIN sous le Programme. La mesure est faite tous les 6 mois.

Données à collecter

- Superficie totale des terres agricoles emblavées sous pratique AIC
- Superficie totale des terres agricoles emblavées sous pratique AIN

- Type de cultures pratiquées sur ces terres (avant et après les interventions).

Méthode de collecte

- Cartographie et relevés GPS pour mesurer les parcelles cultivées

Utilisation du GPS pour mesurer les superficies des champs

Pour la mesure des superficies des champs, il est recommandé d'utiliser des GPS compatibles avec des applications sur smartphones, telles que **GPS Fields Area Measure** (voir en annexe 5 pour la description, les caractéristiques des GPS compatibles, les avantages et les coûts). Cette approche permet d'obtenir un calcul instantané des surfaces, facilitant ainsi la collecte de données précises et fiables. L'utilisation de ces outils modernes optimise la gestion des exploitations agricoles, particulièrement pour les petits exploitants, en leur fournissant des informations essentielles pour une prise de décision éclairée et un meilleur accès à des financements basés sur des données fiables.

Pour calculer la surface cultivée d'un champ agricole à l'aide du GPS, voici les étapes à suivre.

(i) Équipement GPS

Utiliser un récepteur GPS externe capable de fournir des données précises, idéalement avec une précision submétrique ou centimétrique. Pour le PNDA où les surfaces agricoles des petits exploitants ne sont pas grandes, mais où une précision élevée est essentielle, il est recommandé particulièrement l'Emlid Reach RS2+. Il offre une précision centimétrique à un coût relativement abordable, et est compatible avec GPS Fields Area Measure via Bluetooth. Il convient aux relevés agricoles de précision tout en étant facile à utiliser avec un smartphone (voir en annexe la description et d'autres modèles recommandés).

(ii) Marquer les points de contour

Connecter le GPS avec l'application et se déplacer autour du périmètre du champ en suivant ces étapes :

- À chaque changement de direction ou angle, marquer un point en enregistrant les coordonnées GPS (latitude et longitude) à l'aide de l'application.
- Pour les champs ayant une forme irrégulière, il est essentiel de marquer suffisamment de points pour obtenir une représentation fidèle de la surface. Utilisez un espacement régulier entre les points pour plus de précision.

(iii) Enregistrement des données

Utiliser le récepteur GPS connecté à l'application **GPS Fields Area Measure** sur un smartphone ou une tablette pour recueillir et enregistrer les coordonnées des points marqués.

(iv) Calcul de la surface

Une fois les coordonnées GPS obtenues, deux méthodes peuvent être utilisées pour calculer la surface :

- **Utilisation de l'application GPS Fields Area Measure** : Cette application permet de tracer les points directement sur le terrain et de calculer automatiquement la surface.

- **En cas de non-utilisation de GPS Fields Area Measure**
 - **Utilisation d'une application SIG (Système d'Information Géographique) :** Importer les coordonnées dans un logiciel comme QGIS, ArcGIS ou Google Earth pour générer le périmètre du champ et calculer la surface.
 - **Outils en ligne :** Des plateformes comme Google Earth ou des calculatrices en ligne permettent d'importer les points GPS et de calculer la surface en mètres carrés ou hectares.

(v) Vérification et correction

Si possible, comparer les résultats obtenus avec des méthodes traditionnelles (comme un relevé cadastral) pour vérifier la précision des mesures. Cela peut inclure la validation des données en effectuant des mesures manuelles sur le terrain.

V.2.3 Les applications mobiles : KoboCollect

L'application **KoboCollect**, intégrée à la plateforme **KoboToolbox**, est un outil moderne et pratique pour la collecte de données sur le terrain dans le cadre du suivi-évaluation du Programme. Voici un aperçu détaillé de son utilisation et de ses fonctionnalités clés :

(i) Collecte de données mobile


Matériel utilisé : KoboCollect permet la collecte de données via des téléphones portables ou des tablettes. Les enquêteurs utilisent des appareils équipés de l'application pour accéder à un questionnaire numérique préalablement défini.

Utilisation hors ligne : L'une des principales forces de KoboCollect est sa capacité à fonctionner hors connexion. Cela le rend idéal pour les enquêtes dans des zones rurales ou éloignées, où les réseaux téléphoniques et internet sont souvent inexistantes ou instables.

(ii) Création du questionnaire

Conception sur KoboToolbox : Avant la phase de collecte, le questionnaire à utiliser est d'abord conçu sur la plateforme KoboToolbox. Ce questionnaire inclut tous les indicateurs clés à mesurer, tels que la productivité agricole, le revenu des ménages, la sécurité alimentaire, et la perception des services du PNDA.

Validation et partage : Une fois créé, le questionnaire peut être partagé avec d'autres utilisateurs, comme les opérateurs techniques et les parties prenantes. Ces derniers peuvent examiner le contenu, apporter des modifications ou des suggestions, puis valider le questionnaire final.

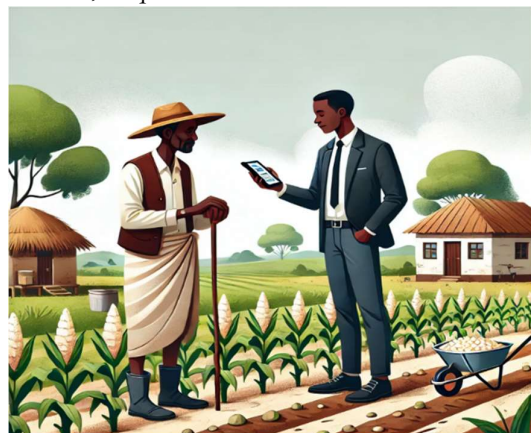

(iii) Téléchargement et collecte des données

Accès et téléchargement : Les enquêteurs accèdent à leur compte sur KoboToolbox et téléchargent le questionnaire directement sur leurs appareils mobiles via l'application KoboCollect.

Saisie sur le terrain : Les données sont ensuite saisies directement sur le terrain, ce qui évite les retards liés aux formulaires papier et minimise les erreurs de transcription. KoboCollect permet aussi l'ajout d'éléments multimédias (photos, vidéos, coordonnées GPS), pour enrichir les données collectées.

(iv) Synchronisation et centralisation des données

Synchronisation hors ligne/en ligne : Même lorsque les enquêtes sont menées hors connexion, les données sont stockées localement sur l'appareil. Dès qu'une connexion Internet est disponible, les informations sont automatiquement synchronisées avec la plateforme KoboToolbox.

Disponibilité immédiate : Une fois synchronisées, les données sont centralisées et immédiatement accessibles pour les opérateurs techniques. Cela permet une visualisation rapide et une analyse en temps réel des informations collectées.

(v) Analyse et visualisation des données

Visualisations intégrées : KoboToolbox offre des outils de visualisation simples, permettant de créer des graphiques et des tableaux de bord pour interpréter rapidement les résultats de l'enquête. Les gestionnaires du PNDA peuvent ainsi suivre les tendances ou les problèmes émergents.

Suivi du progrès : L'interface en ligne de KoboToolbox permet aux opérateurs techniques de suivre l'état d'avancement de la collecte de données en temps réel, grâce aux soumissions centralisées des enquêteurs sur le terrain.


Exportation des données : Pour des analyses plus poussées, les données collectées peuvent être exportées dans différents formats, notamment **Excel** ou **CSV**, facilitant leur traitement statistique ou l'intégration dans d'autres systèmes d'analyse.

(vi) Étapes de création du questionnaire

Les étapes détaillées pour la création d'un questionnaire sur KoboToolbox, allant de la conception à la validation, sont décrites en annexe 6.

Grâce à KoboCollect, la collecte de données dans le cadre du suivi-évaluation du PNDA est plus rapide, plus fiable, et adaptée aux contraintes du terrain, offrant des informations essentielles pour l'évaluation en temps réel des impacts du programme.

Figure 6 : Les étapes de la collecte des données via KoboCollect

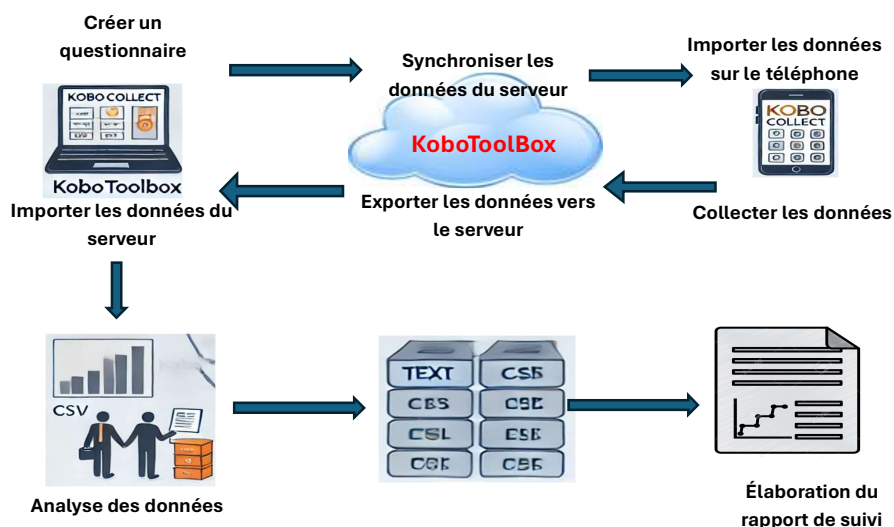

V.2.4 Les photographies et vidéos

L'utilisation de photographies et de vidéos pour suivre l'évolution des situations agricoles représente un outil puissant pour l'évaluation des impacts et des performances. En prenant des images à différents niveaux, qu'ils soient terrestres ou aériens (avec des drones), les responsables du suivi-évaluation peuvent obtenir une représentation visuelle dynamique des changements sur le terrain.

Cette méthode peut être utilisée pour cibler des indicateurs de performance spécifiques, tels que l'augmentation des surfaces cultivées, la qualité des récoltes, ou les améliorations dans les infrastructures rurales. Par exemple, des séquences vidéo montrant l'évolution d'un champ avant et après l'introduction de nouvelles technologies agricoles peuvent illustrer l'impact direct du Programme sur la productivité.

De plus, une approche plus participative consiste à impliquer les acteurs locaux en leur fournissant des caméras pour qu'ils documentent eux-mêmes les changements qu'ils jugent significatifs. Cette méthode engage les communautés, renforçant leur sentiment d'appartenance et d'appropriation des initiatives du Programme. Elle permet également d'obtenir des perspectives locales sur les transformations observées, enrichissant ainsi les données qualitatives disponibles et apportant un éclairage sur des aspects que les chiffres seuls pourraient négliger.

En intégrant ces éléments visuels dans le suivi-évaluation, le Programme peut non seulement quantifier les résultats mais aussi raconter une histoire plus complète et nuancée des impacts du Programme sur la vie des agriculteurs et des communautés rurales.

V.2.1 Les drones

L'utilisation des drones constitue une avancée technologique majeure pour améliorer le suivi et l'évaluation des cultures dans le cadre du Programme. Cette technologie innovante permet de

collecter des données visuelles précises et en temps réel, offrant aux responsables des informations essentielles pour orienter les interventions agricoles avec efficacité.

Collecte de données aériennes en temps réel

Les drones, équipés de caméras haute résolution et de capteurs spécialisés, survolent les champs et prennent des images aériennes détaillées. Ces images permettent de :

- **Analyser la santé des cultures** : Grâce aux images multispectrales et infrarouges, les drones peuvent détecter des problèmes invisibles à l'œil nu, tels que le stress hydrique, les carences en nutriments, ou les maladies des plantes.
- **Identifier les zones à risque** : Les zones nécessitant des soins particuliers (irrigation, fertilisation, traitement contre les ravageurs) sont rapidement localisées, facilitant ainsi une intervention ciblée.

Optimisation des ressources et des interventions

L'un des avantages clés des drones est leur capacité à optimiser la gestion des ressources agricoles. En fournissant une vue d'ensemble des champs, ils permettent de :

- **Réduire les pertes agricoles** : En intervenant rapidement sur les zones identifiées comme problématiques, les agriculteurs peuvent minimiser les pertes et améliorer les rendements.
- **Gagner du temps et de l'efficacité** : Les drones couvrent rapidement de grandes surfaces, ce qui permet d'effectuer des inspections plus fréquentes et plus précises que par des moyens traditionnels.

Intégration dans le système de suivi-évaluation

Les données collectées par les drones peuvent être intégrées aux systèmes de suivi et d'évaluation existants du Programme. Les images et vidéos sont :

- **Analysées avec des outils de cartographie géospatiale** pour produire des cartes des cultures en temps réel, fournissant des informations détaillées sur la production agricole.
- **Complétées par des données au sol** recueillies via des questionnaires ou des observations directes, ce qui permet de croiser les données quantitatives et qualitatives pour évaluer de manière holistique les performances du Programme.

Réactivité aux défis agricoles

En intégrant les drones dans les processus de suivi-évaluation, le Programme renforce sa capacité à répondre rapidement aux défis émergents sur le terrain :

- **Surveillance proactive des maladies** : En repérant rapidement les signes de maladies ou de parasites, les responsables peuvent prendre des mesures préventives ou correctives avant que les dégâts ne s'étendent.
- **Réponse aux changements climatiques** : Les drones aident à suivre les impacts climatiques sur les cultures (sécheresse, inondations) et à ajuster les stratégies agricoles en conséquence.

Encadré 1 : Les avantages d'utilisation des drones en agriculture

Le drone, outil de l'agriculture de précision, est mis au service de la gestion agricole car il mesure la variation inter-parcellaire et intra-parcellaire dans les cultures et l'élevage et y apporte des solutions. Il ne s'agit pas de simple application de nouvelles technologies, mais d'une révolution de l'information, qui peut aboutir à des systèmes de gestion agricole plus précis et plus efficaces. Les drones, aussi appelés « véhicules aériens sans pilote » (UAV) ou « systèmes aériens sans pilote » (UAS) – cette dernière dénomination incluant le capteur, les logiciels et d'autres composantes –, ont de nombreuses applications : cartographie et arpentage, régime foncier et aménagement du territoire, inspection, suivi et surveillance, livraison de marchandises, recherche scientifique, gestion des actifs agricoles, assurances, évaluation des dommages causés aux cultures/infrastructures, etc...

La technologie des UAS a plusieurs applications importantes dans l'agriculture : dépistage/surveillance des cultures, évaluations du volume et de la vigueur des cultures, inventaire des cultures (ou comptage des plants individuels), production de cartes de prescription (comme des recommandations relatives au dosage d'engrais azoté pour des emplacements spécifiques), pulvérisation de précision, inspection des infrastructures agricoles (y compris des systèmes d'irrigation), cartographie en haute résolution et arpentage des différents champs (définition des limites des exploitations et calcul des superficies cultivées, par exemple), évaluation des dommages causés aux cultures et analyse des déclarations de sinistre. Les drones équipés des capteurs appropriés sont capables de produire des données de télédétection presque en temps réel sur le terrain, sans le retard lié à l'acquisition de données par imagerie satellite et aérienne.

Source : « Des drones à l'horizon, transformer l'agriculture en Afrique » Union Africaine, NEPAD Transformer l'Afrique¹

V.3 Analyse des données

L'analyse des données est le processus par lequel les données collectées sont transformées en informations exploitables. Cette étape est cruciale dans le cadre de la planification du suivi-évaluation, car elle détermine la qualité des informations rapportées et leur utilisation future. L'analyse des données peut être réalisée dès la collecte, mais aussi à partir des rapports de données.

L'analyse des données consiste à sortir les tendances, évaluer les résultats par rapport aux objectifs, aux cibles, formuler les conclusions, définir les solutions en cas des écarts et orienter les décisions pour l'atteinte des objectifs finaux.

V.3.1 Types de données à analyser

Les **données quantitatives** incluent des indicateurs mesurables tels que le rendement des cultures grâce aux technologies AIN et AIC, le nombre de petits exploitants bénéficiaires du Programme, les augmentations des produits vendus sur le marché formel, ou encore la longueur des pistes réhabilitées. Ces données sont essentielles pour évaluer l'impact direct et chiffré des interventions.

Les **données qualitatives**, quant à elles, se concentrent sur des aspects non mesurables comme la satisfaction des bénéficiaires, les changements dans les pratiques agricoles, l'amélioration des conditions de vie, ainsi que les problèmes rencontrés. Ces informations permettent de comprendre les perceptions et les impacts à long terme du Programme sur les communautés locales.

V.3.2 Différentes techniques d'analyse des données

L'**analyse descriptive** est utilisée pour résumer les données collectées et offrir une vue d'ensemble des bénéficiaires et leurs caractéristiques socio-économiques. Les statistiques descriptives, telles que les moyennes, les médianes et les écarts-types, permettent de dégager des tendances générales et de comprendre la distribution des données par sexe, par province, et permettent de mieux comprendre la répartition des performances agricoles entre les bénéficiaires.

¹ [Des-Drones-à-l'-Horizon-Transformer-L-'Agriculture-En-Afrique-fr.pdf \(afgoesdigital.com\)](#)

L'**analyse comparative** permet de comparer les résultats avant et après l'intervention, ou entre différents groupes, par exemple entre les exploitants bénéficiaires du PNDA et les non-bénéficiaires, afin d'évaluer l'impact du Programme.

L'**analyse de variance (ANOVA)** est utilisée pour déterminer si les différences observées entre différents groupes, (par exemple, les exploitants de différentes provinces) ou sur différentes périodes (avant et après le Programme) sont statistiquement significatives. En identifiant ces différences, le PNDA peut mieux comprendre les facteurs de succès ou de limitation des différentes composantes du Programme et ajuster les stratégies d'intervention en conséquence.

Pour les **données qualitatives** telles que les perceptions et les expériences des petits exploitants bénéficiaires, l'utilisation des **études de cas** peut fournir des insights approfondis. En examinant des situations approfondies, comme l'adoption de pratiques innovantes par un groupe d'exploitants ou les défis rencontrés dans certaines localités, ces études peuvent illustrer des points critiques. L'**analyse thématique**, quant à elle, permet d'identifier les motifs récurrents dans les réponses aux interviews ou aux questionnaires, notamment sur les avantages perçus des interventions du Programme ou les obstacles à l'amélioration des rendements.

V.3.3 Logiciels

Excel est un outil simple mais efficace pour effectuer des **analyses de base** et les **tableaux de bord**. Il reste un outil simple mais puissant pour des analyses de données basiques. Dans le cadre du PNDA, il peut être utilisé pour traiter les données des exploitants agricoles (rendement des cultures, ventes de produits, etc.). Les **tableaux croisés dynamiques** permettent de synthétiser rapidement les informations, tandis que les **graphiques** facilitent la visualisation des tendances des indicateurs clés (comme la croissance des rendements ou des ventes). Excel permet également de créer des **tableaux de bord interactifs**, utiles pour suivre les progrès des interventions du Programme en temps réel.

Power BI permet d'avoir une **visualisation plus avancée**. Power BI offre des fonctionnalités de visualisation plus complexes. Par exemple, pour le PNDA, il permet de **transformer les données brutes** en **tableaux de bord interactifs** en temps réel. Il est possible de suivre les progrès par **province, localité ou bénéficiaires** (sexe, âge, etc.), ou de comparer les **rendements agricoles** entre différentes régions grâce à des **cartes géographiques interactives**. Power BI facilite aussi l'**automatisation des rapports**, ce qui assure une communication précise des résultats tout en économisant du temps.

NVivo ou **ATLAS.ti** sont des logiciels spécialisés dans l'**analyse des données qualitatives** et mixtes. Ils permettent d'extraire des informations à partir de données non structurées, telles que des **interviews**, des **observations** ou des **rapports de terrain**. Ils permettent de **coder et analyser** les retours des bénéficiaires du PNDA (agriculteurs, organisations paysannes, MPME agro-industrielles...) pour extraire des tendances ou thèmes communs sur leurs appréciations, leurs recommandations et les problèmes qu'ils ont rencontré, notamment en ce qui concerne l'adoption des nouvelles technologies, ou les défis liés à l'accès aux marchés etc...

L'**Intelligence Artificielle (IA)** et le **Machine Learning** jouent un rôle important dans la prédiction des rendements. Les algorithmes de Machine Learning analysent les données historiques et actuelles pour **prédire les rendements agricoles, optimiser les ressources et identifier les**

risques. De plus, le Machine Learning peut être utilisé pour **analyser les commentaires et les retours des agriculteurs (analyse des sentiments)**, afin d'évaluer la satisfaction et d'adapter les interventions du Programme en conséquence.

VI. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION


Les rapports de suivi-évaluation pour un Programme sont des outils essentiels pour la gestion, l'évaluation et la prise de décisions. Ils fournissent des informations régulières sur l'état d'avancement, les réalisations, les défis et les impacts du Programme.

VI.1 Mécanisme de rapportage

Le mécanisme de S&E du Programme comprend trois étapes clés, comme illustré par la Figure 5. La première étape est l'élaboration du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA), où les objectifs et les activités sont définis, budgétisés, et un plan de passation de marché est établi. Cela garantit une planification rigoureuse et une allocation adéquate des ressources pour l'exécution des activités prévues.

La deuxième étape est l'exécution des activités, accompagnée d'un suivi continu pour s'assurer que les interventions se déroulent comme prévu. Enfin, la troisième étape est la production des rapports à des intervalles réguliers (trimestriels, semestriels, annuels), les rapports d'évaluation (mi-parcours et finale) permettant d'évaluer les progrès réalisés et de proposer des ajustements et d'évaluer les impacts du Programme. Ce processus alimente une boucle de rétroaction, intégrant les recommandations et les mesures d'ajustement dans les futurs cycles de planification du PTBA.

Figure 7 : Le mécanisme de suivi évaluation du PNDA

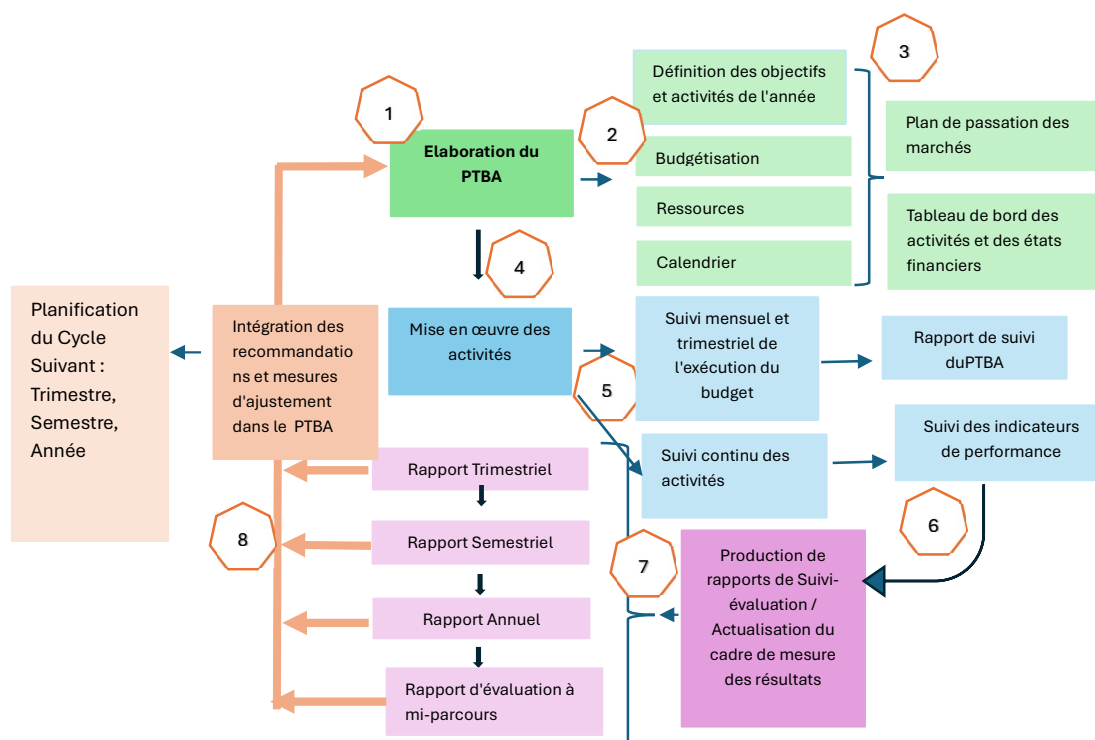

VI.2 Planification et le rapportage

VI.2.1 Le plan de travail et budget annuel et les rapports de gestion connexes

Des planifications sont établies pour prévoir dans le temps la mise en œuvre de toutes les activités.

Les démarches à suivre pour élaborer le PTBA et les rapports financiers y rattachés se trouvent dans le manuel des opérations du PNDA (2021).

Tableau 10: Instruments de planification et de rapportage

Instruments de planification et de Suivi Evaluation	Fréquence	Date limite de remises	Portées	Responsables	Destinations
Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)	Annuel	30/11/N Début de l'élaboration : au moins 6 mois avant l'exercice financier de la mise en œuvre	- Le bilan d'exécution au 30 septembre du PTBA précédent ; - La description des activités et les objectifs visés ; - Les Programmes d'activités budgétisés par composante et sous-composante ; - Le plan de financement des activités par source de financement ; - Le plan de passation des marchés ; - Le plan de formation ; - L'des risques ; - Le chronogramme des activités.	UPEP : Préparer le plan/programme annuel de travail, le budget de performance et les résultats à atteindre et les soumettre à l'UNCP CPCS : Approuver le PTBA niveau provincial en collaboration avec les UPEP pour leur soumission à l'UNCP UNCP : Consolider, vérifier, traiter et présenter au CTN pour validation. CTN : Valider le document	Comité du Pilotage Banque mondiale

Instruments de planification et de Suivi Evaluation	Fréquence	Date limite de remises	Portées	Responsables	Destinations
Plan de décaissement (PDD)	Annuel	30/11/N	Plan financier indiquant les prévisions de décaissement de fonds de chaque composante d'activité, selon les catégories de dépense.	Responsable Administratif et Financier : élaboration canevas, coordination et synthèse du PDD	Banque mondiale
Plan de Passation des Marchés (PPM)	Annuel	30/11/N	Liste des marchés à passer par composante d'activités, avec la quantité, la méthode de sélection, le mode de passation, le montant estimatif, les dates de lancement, etc.	Responsable passation des marchés : élaboration canevas, coordination et synthèse du PPM	Banque mondiale

Plan de communication	Annuel	30/11/N	Définit les objectifs de communication, liste des actions de communication, les publics cibles, et les messages clés à diffuser tout au long de l'année. Il précise les canaux à utiliser, le calendrier des actions à mener, et le budget alloué, tout en intégrant des indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité. Ce plan assure une communication cohérente et coordonnée tout au long de l'année.	Spécialiste en gestion du savoir	UNCP -UPEP
Rapport de Suivi Financier trimestriel (RSF) ²	Trimestriel	45 jours après la fin du trimestre	Rapport financier (y compris Tableau des ressources et des emplois, Tableau de l'utilisation des fonds par composante ou activité, Etat de rapprochement bancaire), Rapport d'avancement technique, Rapport sur la passation de marchés, Rapport sur la gestion environnementale et sociale, Plan de trésorerie pour les prochains trimestres, Etats de dépenses prévisionnelles, Prévisions techniques pour les prochaines périodes.	- Responsable de Suivi Evaluation : consolidation, vérification et traitement - Direction Administrative et Financière : traite la partie financière - Directions opérationnelles : contribue au traitement de la partie technique - Responsable de la Passation de Marchés : traite la partie passation de marchés	Banque mondiale

² Selon le format convenu avec la Banque mondiale

VI.2.2 Les rapports de suivi

Les rapports de suivi jouent un rôle capital dans la gestion efficace et le suivi efficace du Programme. **Les rapports trimestriels** offrent des mises à jour régulières et détaillées, permettant un suivi réactif et la possibilité d'ajustements rapides des activités en cours. **Les rapports semestriels**, quant à eux, fournissent une évaluation intermédiaire plus approfondie, permettant d'examiner les tendances émergentes et de réajuster les stratégies opérationnelles avec une perspective à moyen terme. Enfin, **le rapport annuel** compile l'ensemble des données et analyses accumulées au cours de l'année pour offrir une vue d'ensemble exhaustive, évaluant l'atteinte des objectifs de développement du Programme. Chacun de ces rapports contribue à assurer la transparence, la responsabilité, et l'amélioration continue des initiatives, répondant ainsi aux attentes des bailleurs de fonds et des parties prenantes.

Les rapports trimestriels et annuels diffèrent principalement en termes de portée, de profondeur d'analyse, de contenu, et d'objectif. Voici un résumé des différences clés entre les trois types de rapports, ainsi que leurs destinataires et usages

Tableau 11: Les rapports de suivi

Caractéristique	Rapport Trimestriel	Rapport Semestriel	Rapport Annuel
Fréquence	Tous les trois mois	Tous les six mois	Une fois par an
Période Couverte	Trois mois	Six mois	1an
Dates limites de remise	30 jours après la fin de chaque trimestre	15 Août	45 jours après la fin de la saison A
Objet	Mise à jour régulière et opérationnelle des activités	Évaluation intermédiaire et ajustements à moyen terme	Synthèse complète de l'année, évaluation de stratégie des réalisations de l'année et perspectives de l'année suivante
Portée et profondeur	Plus concis ; focus sur les activités récentes et résultats immédiats, et ajustement à court terme	Analyse plus approfondie des tendances émergentes et ajustements	Vue d'ensemble exhaustive avec analyse détaillée des tendances, contributions cumulées aux indicateurs de développement du PNDA
Contenu			
<i>Mise en œuvre</i>	Progrès (évaluation des activités planifiées versus réalisées sur le trimestre, et des succès ou défis immédiats), défis immédiats, ajustements courts. Évaluation des activités planifiées versus réalisées sur le trimestre	Progressions semi-annuelles, mises à jour stratégiques	Résultats annuels globaux (Synthèse complète des activités et réalisations de toute l'année), impacts sur les objectifs de développement incluant des comparaisons avec des années précédentes
<i>Financier</i>	Aperçu des dépenses trimestrielles et performance budgétaire à court terme	Aperçu des dépenses semestrielles et performance budgétaire à moyen terme	Analyse financière détaillée de l'année entière, avec des recommandations budgétaires futures.
<i>Stratégie future</i>	Prochaine période, avec un focus sur le trimestre suivant	Prochaine période, avec un focus sur le semestre suivant	Planification stratégique pour l'année suivante et intégration des leçons apprises.

Destinataires	Banque Mondiale, Gouvernement de la RDC	Les équipes interne, Banque Mondiale, certaines parties prenantes, Gouvernement	Équipes PNDA, Banque Mondiale, Gouvernement, partenaires, décideurs, parties prenantes
Usages	Mises à jour régulières pour prendre des décisions rapides et ajuster la mise en œuvre, suivi constant	Révisions intermédiaires	Utilisé pour l'évaluation de la réalisation annuelle et préparation du PTBA de l'année suivante

Calcul des taux d'exécutions physique et financiers du Programme

Les rapports de suivi évaluent la progression du Programme, les deux indicateurs utilisés pour cette évaluation sont le taux d'exécution financière et le taux d'exécution physique.

Le taux d'exécution financière

Ce taux mesure la proportion du budget dépensé par rapport au budget total alloué. Il se calcule en comparant les dépenses réelles engagées à une période donnée avec le budget prévu pour cette même période. Il permet de s'assurer que les fonds disponibles sont bien utilisés selon les prévisions budgétaires et dans les délais impartis.

$$\text{Taux d'exécution financière de la période} = \left(\frac{\text{Dépenses réelles de la période}}{\text{Budget prévu pour la période}} \right) \times 100$$

Le taux d'exécution physique

Le taux d'exécution physique mesure la proportion des activités programmées qui ont été effectivement réalisées. Il se base sur les résultats tangibles des actions menées par le Programme (par exemple, le nombre de pistes rurales réhabilitées, la distribution de semences, le nombre des petits exploitants agricoles formés etc...). Il permet de vérifier si les actions prévues dans le Programme sont bien réalisées, en conformité avec le calendrier et les objectifs fixés.

$$\text{Taux d'exécution physique (\%)} = \left(\frac{\text{Nombre de produits réalisés pour l'activité}}{\text{Nombre de produits attendus pour l'activité}} \right) \times 100$$

Exemple : L'objectif pour une période donnée est de réhabiliter 50 km de pistes rurales. Sur cette période, 40 km ont été effectivement réhabilités.

$$\text{Taux d'exécution physique} = \left(\frac{40}{50} \right) \times 100 = 80\%$$

Pondération des activités pour le calcul du taux d'exécution pour une composante pendant une période donnée

Contrairement au taux d'exécution financière, le calcul du taux d'exécution physique pour l'ensemble est un peu complexe. Les activités ne sont pas toutes de même importance, donc il faut utiliser les coefficients de pondérations pour faire la somme des taux. Pour chaque activité on attribue un poids relatif selon son impact ou son importance dans la composante ou dans le Programme.

$$\text{Taux d'exécution physique global (\%)} = \sum (\text{Taux d'exécution physique de l'activité } A_i \times \text{Pondération de l'activité})$$

La méthode de pondération par les coûts

Il existe plusieurs méthodes de pondération des activités pour le calcul du taux d'exécution physique telle que la pondération basée sur l'importance, la pondération par contribution aux objectifs spécifiques, la pondération basée sur la durée, la pondération basée sur les coûts etc.. La dernière méthode de pondération (par les coûts) reflète l'importance économique de chaque activité dans le Programme. C'est la méthode la plus simple à appliquer.

Cette méthode consiste à attribuer un poids à chaque activité en fonction de son coût par rapport au budget total du Programme. Plus une activité est coûteuse, plus elle aura un poids élevé dans le calcul du taux d'exécution physique. Cela reflète l'idée que les activités les plus coûteuses sont souvent plus complexes et cruciales pour la réussite du Programme.

$$\text{Poids d'une activité} = \frac{\text{Coût de l'activité}}{\text{Coût total de la composante ou du Programme}}$$

Exemple : Composante 1 pour année N

- Produits attendus de l'activité A₁ : 20 000 petits exploitants souscrits à une police d'assurance agricole
- Produits attendus de l'activité A₂ : 20 000 petits exploitants enregistrés bénéficiaires des e-vouchers pour l'adoption des paquets techniques AIC et AIN
- Produits attendus de l'activité A₃ : 20 000 petits exploitants enregistrés bénéficiaires des incitations.

Les réalisations à la fin de l'année N

- Activité A₁ : 17 000 Coût : 500 000 \$
- Activité A₂ : 15 000 Coût : 250 000 \$
- Activité A₃ : 16 000 Coût : 32 000 \$

Total coût de la composante 1 pour l'année N : 782 000 \$

$$\text{Taux d'exécution physique de } A_1 = \frac{17\,000}{20\,000} = 85\% \quad \text{Poids de } A_1 = \frac{500\,000}{782\,000} = 63,94\%$$

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution physique global} &= (85 \times 63,94) + (75 \times 23,98) + (80 \times 4,09) \\ &= 54,35 \% + 23,98 \% + 3,27 \% \\ &= \mathbf{81,60 \%} \end{aligned}$$

Tableau 12: Exemple de calcul de taux d'exécution physique global d'une composante

Activité	Produits attendus	Réalisations	Taux d'exécution physique	Coût	Poids	Taux d'exécution physique relatif
Activité 1	20 000	17 000	85%	500 000 \$	63,94%	54,35%
Activité 2	20 000	15 000	75%	250 000 \$	31,97%	23,98%
Activité 3	20 000	16 000	80%	32 000 \$	4,09%	3,27%
Taux d'exécution physique de la composante 1 à l'année N						81,60%

Calcul de la moyenne annuelle pour le Programme

On applique la même méthode de pondération de chaque activité sur les composantes. Il s'agit d'attribuer un poids à chaque composante en fonction du budget alloué à la composante

$$\text{Poids de la composante pour l'année N} = \frac{\text{Coût total de la composante}}{\text{somme des coûts de toutes les composantes}}$$

Taux d'exécution physique global de l'année N = (Taux d'exécution physique global Composante 1 x Poids de la composante 1) + (Taux d'exécution physique global Composante 2 x Poids de la composante 2) + (Taux d'exécution physique global Composante 3 x Poids de la composante 3)
--

Calcul du taux d'exécution physique du Programme

On peut appliquer la moyenne simple des taux d'exécution physique de toutes les années. Mais si les années ont des poids relativement différents (des budgets différents pour chaque année), on applique la même méthode de pondération sur les années. On attribue un poids à chaque année du Programme.

$$\text{Poids de l'année N} = \frac{\text{Coût total de l'année N}}{\text{somme des coûts du Programme}}$$

Taux d'exécution physique du programme = $\sum (\text{Taux d'exécution physique global de l'année N} \times \text{Poids de l'année N})$
--

Exemple :

Tableau 13: Exemple de calcul de taux d'exécution physique global du Programme

Composante	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Poids de la composante
Composante 1	50%	70%	72%	55%	75%	40%
Composante 2	65%	50%	60%	75%	65%	35%
Composante 3	55%	65%	70%	60%	70%	25%
Poids de l'année	10%	20%	22%	23%	25%	
Taux d'exécution physique global de l'année	56,5%	61,8%	67,3%	63,3%	70,3%	
Taux d'exécution physique global du Programme						64,9%

Taux d'exécution physique global de l'Année 1 = (50% x 40%) + (65% x 35%) + (55% x 25%) = 56,5%

Taux d'exécution physique du Programme = (56,5% x 10%) + (61,8% x 20%) + (67,3% x 22%) + (63,3% x 23%) + (70,3% x 25%) = 64,9%

Les tableaux de suivi et de calcul des taux d'exécution se trouvent en annexe 13

VI.2.3 Production des rapports

Les responsabilités des différents experts dans le cadre du suivi et de l'évaluation du Programme reflètent une approche collaborative et multidisciplinaire. La **Responsable Suivi-Évaluation** joue un rôle central en initiant les séances de planification, en établissant le système de S&E, et en coordonnant la collecte et l'analyse des données. Elle assure la validité et l'accessibilité des données, rédige des rapports de performance, et propose des recommandations pour l'amélioration des actions basées sur une analyse approfondie des écarts observés. Ce rôle est crucial pour garantir que les activités du Programme soient mises en œuvre efficacement et respectent les normes attendues.

Les **Experts Techniques**, qu'ils soient en agronomie ou en génie civil, contribuent à la collecte de données spécifiques liées à leurs domaines d'expertise, supervisant les capacités des infrastructures et les pratiques agricoles. Parallèlement, les **Experts de Sauvegarde**, y compris ceux en environnement, genre et sociale, veillent à l'intégration des mesures de sauvegarde dans toutes les activités du Programme. Leur fonction comprend la validation des documents, la formation et l'assistance aux parties prenantes, tout en s'assurant que les préoccupations sociales, environnementales et de genre sont correctement prises en compte dans la mise en œuvre et l'évaluation des projets.

Chacun des experts thématiques de chaque composante contribue à la rédaction de rapports sur les résultats des activités de la composante concernée, à l'organisation de formations et à la mise en place de mécanismes de suivi pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place. Grâce à cette approche coordonnée et intégrée, le suivi et l'évaluation du Programme peuvent non seulement refléter les résultats obtenus mais également permettre une adaptation continue des stratégies pour atteindre les objectifs fixés.

Au niveau provincial, il est essentiel d'adopter une approche structurée pour la production de rapports par les UPEP afin d'optimiser la coordination et la compréhension des progrès réalisés. Les **rapports régionaux**, préparés selon une fréquence harmonisée (trimestrielle, semestrielle et annuelle), permettent de mettre en lumière les spécificités locales – y compris des facteurs culturels, géographiques et socio-économiques – tout en s'alignant sur les objectifs généraux du Programme. Ces rapports offrent une analyse des résultats, des défis rencontrés et des recommandations spécifiques à chaque province. En parallèle, le **rapport central** compile et synthétise les données provinciales, offrant ainsi une vue d'ensemble cohérente des succès et des leçons apprises, et permettant aux décideurs d'ajuster les stratégies à la fois au niveau central et local. Cette organisation favorise non seulement la transparence et la responsabilité, mais elle renforce également la gestion des projets en assurant que les enjeux de sauvegarde environnementale, de genre et de participation communautaire sont intégrés tout au long du processus. Grâce à cette méthodologie, le suivi et l'évaluation peuvent non seulement refléter de manière précise les résultats obtenus, mais également permettre des ajustements stratégiques proactifs pour maximiser l'impact du Programme.

Pour traiter efficacement des thématiques transversales telles que l'environnement et le genre, gérées par des experts au niveau central, il est crucial de développer un cadre cohérent qui intègre ces aspects tout au long du processus de rapportage. Dans un premier temps, il est essentiel d'**intégrer ces thématiques dans les rapports régionaux** en fournissant des directives claires

aux équipes régionales sur l'utilisation d'indicateurs spécifiques et de méthodologies d'évaluation pertinentes. Chaque rapport régional devrait inclure une section dédiée qui analyse comment les activités du Programme prennent en compte les enjeux d'environnement et de genre à un niveau local, tout en assurant un suivi des indicateurs spécifiques pour mesurer les progrès et les défis liés à ces thématiques.

Ensuite, au niveau central, les **rapports thématiques transversaux** doivent compiler et synthétiser les informations récoltées dans les rapports provinciaux pour produire une analyse globale des impacts du Programme sur les questions environnementales et de genre. Cela inclut une évaluation des stratégies mises en place et leur alignement avec les normes nationales et internationales, ainsi que des recommandations stratégiques pour renforcer l'intégration de ces thématiques dans les activités futures.

Le rôle des **experts au niveau central** est également fondamental, car ils fournissent des conseils techniques et un soutien continu aux équipes provinciales et locales. Ils assurent l'harmonisation des efforts entre les différentes régions, facilitant ainsi le partage d'expériences et d'outils. De plus, ces experts doivent conduire des audits réguliers et des évaluations pour garantir que les thématiques transverse sont bien intégrées et pour évaluer l'efficacité des interventions. Grâce à cette approche structurée, les thématiques transversales peuvent être pleinement prises en compte dans le suivi et l'évaluation, assurant ainsi un impact maximal du Programme

VII. GESTION DU SUIVI-ÉVALUATION

VII.1 Gestion du système de S&E

La gestion du suivi-évaluation peut être facilitée à l'aide d'applications de gestion de projet avancées, telles que Microsoft Planner, ou encore Teams et Outlook.

Microsoft Planner est un outil puissant pour le suivi des tâches et des projets. Il se distingue par son intégration fluide avec Microsoft Teams, Outlook et d'autres outils de Microsoft 365. Il offre une interface simple basée sur les tableaux Kanban, permettant ainsi de :

- **Créer des tâches** pour chaque étape du Programme ;
- **Suivre les tâches** en temps réel et vérifier leur avancement ;
- **Définir des échéances** de chaque unité (UPEP, thématique, composante) pour s'assurer que les activités se déroulent comme prévu ;
- **Attribuer des responsabilités** à différents membres de l'équipe, favorisant ainsi une collaboration efficace ;
- **Partager des informations et des plannings**, ce qui améliore la communication entre les équipes de suivi-évaluation ;
- **Générer des tableaux de bord** pour une visualisation instantanée du S&E, par exemple des indicateurs de performance, les cibles atteints, les retards, les écarts...

En intégrant cet outil dans le cadre du PNDA, les équipes de suivi-évaluation peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les risques de retards, et assurer une transparence accrue

dans la gestion des activités du Programme. Cela contribue non seulement à une meilleure gestion des ressources, mais aussi à une amélioration des résultats du Programme, en permettant aux décideurs de prendre des décisions éclairées basées sur des données à jour et fiables.

VII.2 Système d'information automatisé (SIA)

Un système d'information automatisé est un système de gestion plus avancé, dans lequel un grand nombre de processus sont exécutés automatiquement par des technologies informatiques, avec moins d'intervention humaine. L'objectif principal ici est de remplacer les tâches manuelles par des processus automatisés pour gagner en efficacité, rapidité, et réduction des erreurs humaines.

Des tâches comme le calcul des résultats, la production de rapports, et les alertes si certains indicateurs montrent des écarts significatifs, sont effectuées automatiquement par le système avec le moins d'intervention humaine régulière.

Les processus automatisés réduisent les erreurs liées à l'intervention humaine. Et les alertes et notifications automatiques permettent de prendre des décisions plus rapidement en cas de problème.

Sur la base des principes généraux décrits dans le présent manuel de S&E, il est recommandé que l'UNCP instaure un SIA à triple finalité :

- La gestion informatisée des bases de données qui permettra de disposer et consulter facilement et à tout moment des informations sur les moyens utilisés et les réalisations du Programme sur les plans technique, financier et comptable ;
- L'évaluation des résultats et de l'impact du Programme ;
- La production régulière et automatisée des rapports de suivi des indicateurs du Programme

Le SIA sera développé par le/la consultant(e) en S&E avec l'aide d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) notamment en informatique. Ils seront appuyés par des spécialistes en gestion, en passation de marchés et des techniciens de l'UNCP.

Le système informatique devra permettre de rentrer tous les éléments des instruments suivants :

- La matrice de suivi des indicateurs d'impact et des résultats
- Le Programme de Travail et Budget Annuel
- La fiche mensuelle de suivi des composantes
- Les données comptables et budgétaires relatives aux prévisions, les engagements et les paiements, les demandes de réapprovisionnement et les décaissements.

Par ailleurs ce système devra permettre d'éditer les documents suivants :

- Le rapport de suivi financier (RSF)
- Le rapport trimestriel d'activités

Les programmes de saisie, de traitement de données, d'édition et d'impression de rapport seront élaborés et intégrés de telle manière que l'utilisateur n'aura qu'à travailler avec les menus.

VII.3 Système de gestion des données et des documents

La gestion des données englobe l'ensemble des processus et des systèmes que le Programme met en place pour stocker, organiser et accéder aux données de suivi et d'évaluation de manière structurée et fiable. Elle constitue un élément central du système de suivi-évaluation, en assurant la liaison entre la collecte des données, leur analyse et leur utilisation pour la prise de décisions. Une gestion inefficace des données peut entraîner des pertes importantes de temps, d'argent et de ressources. Les données mal enregistrées ou égarées compromettent non seulement la qualité et la fiabilité des analyses, mais aussi l'efficacité des efforts investis dans leur exploitation.

VII.3.1 Format de données

Les données collectées lors des différentes enquêtes seront organisées et stockées sous divers formats, notamment des feuilles de calcul Excel et des fichiers SPSS, ce qui permet une flexibilité d'analyse. Chaque fichier sera clairement identifié par le nom de l'enquête correspondante, facilitant ainsi son accès et son utilisation pour les analyses ultérieures.

Les tableaux et graphiques dérivés de ces données seront également enregistrés dans des feuilles Excel, avec une ventilation par sexe si cela est possible et pertinent.

Les fiches des indicateurs suivront le même format Excel pour standardiser le stockage et l'analyse des indicateurs clés.


Enfin, les rapports narratifs et analytiques seront rédigés et stockés sous format Word, permettant ainsi une présentation claire et professionnelle des résultats du Programme.

VII.3.2 Organisation des données et des documents

Pour assurer une gestion efficace des informations recueillies, un répertoire distinct sera créé pour chaque composante du projet. À l'intérieur de chaque répertoire, les fichiers seront organisés de manière à attribuer une feuille spécifique à chaque sous-composante, contenant les tableaux et graphiques associés.

Concernant les rapports, des sous-répertoires seront créés en fonction du type de rapport, tels que : rapport trimestriel, rapport semestriel, ou rapport annuel. Chaque document devra être enregistré avec un nom explicite et une date d'identification (par exemple : "Rapporttrim09092024"). En cas de multiples versions d'un même document, il est recommandé d'utiliser les dates plutôt que des numéros de version (par exemple : "Rapporttrim01", "Raptrim02", etc.).

Les versions finales de chaque document seront classées dans un répertoire spécifique, distinct des versions de travail. L'organisation des données et des documents suivra un ordre chronologique afin de faciliter l'accès et la traçabilité des informations.

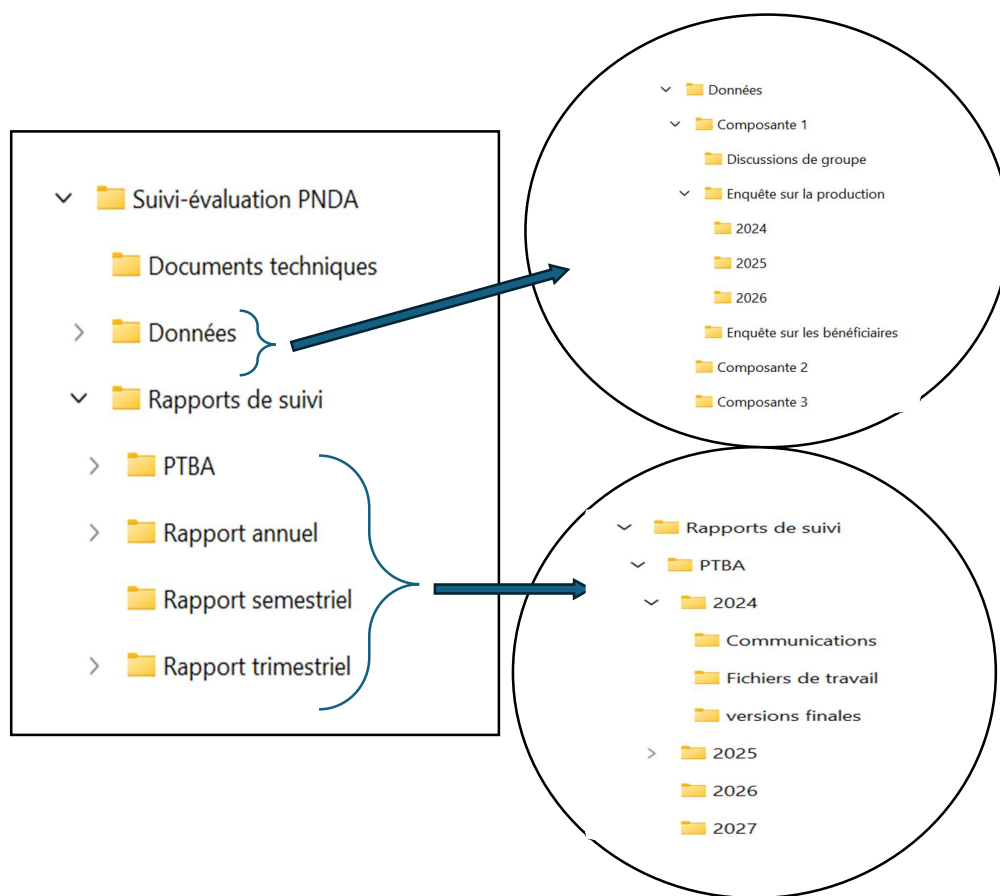

VII.3.3 Stockage de données sur drive

En S&E, **un système de stockage de données et de documents cloud** est nécessaire. Il permet de centraliser, stocker, gérer, et partager des données collectées ainsi que des documents liés au Programme en ligne. Ceci garantit l'accès rapide et sécurisé aux informations par tous les acteurs du Programme, quel que soit leur emplacement.

Le système permet de stocker toutes les données recueillies au cours du suivi-évaluation, qu'il s'agisse des données d'enquêtes, des tableaux de bord, des rapports, des questionnaires ou des résultats d'analyses. Cela centralise toutes les informations nécessaires à la gestion du projet, facilitant l'accès et la gestion des données.

Toute l'équipe, ainsi que les consultants et partenaires, peuvent avoir accès à ces données, tout en évitant la dispersion des informations sur différents supports. Les accès peuvent être restreints ou spécifiques selon les besoins, offrant la possibilité d'attribuer des permissions comme la lecture seule ou la possibilité de commenter, en fonction des responsabilités de chaque membre.

Il est important d'attribuer des permissions spécifiques à chaque membre de l'équipe ou des parties prenantes en fonction de leurs rôles, afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données. Ce contrôle d'accès permet de maintenir un haut niveau de protection, en évitant les modifications non autorisées.

Les données et documents stockés sur le cloud sont accessibles en temps réel, ce qui permet aux acteurs de suivi-évaluation de collaborer de manière fluide, sans délai. Les modifications et mises à

jour peuvent être effectuées instantanément et partagées avec toute l'équipe, ce qui améliore l'efficacité et la transparence dans le processus de gestion des informations.

Un bon système de stockage cloud garantit également la sécurité des données, grâce à des protocoles de protection avancés. Les données sont automatiquement sauvegardées, réduisant ainsi les risques de perte d'information en raison de défaillances matérielles ou d'erreurs humaines.

Enfin, l'utilisation du cloud permet de s'affranchir des coûts liés à l'investissement dans des serveurs physiques coûteux et leur maintenance. Cela réduit aussi les dépenses liées à la gestion des données et des infrastructures informatiques sur site, tout en offrant une solution plus flexible et évolutive.

Les plateformes populaires de stockage de données cloud

Google Drive : Cette plateforme offre un stockage cloud sécurisé et gratuit jusqu'à un certain volume. Elle permet la collaboration en temps réel sur des documents Google (Docs, Sheets, Slides), le partage de fichiers avec des autorisations spécifiques, et l'organisation simple des documents. Elle est idéale pour les petites équipes de suivi-évaluation.

Dropbox : Ce système de stockage et de partage de fichiers propose une interface simple et des fonctionnalités avancées, telles que la synchronisation automatique des fichiers sur plusieurs appareils et un système de récupération de fichiers supprimés. Dropbox est particulièrement utile pour partager des documents volumineux, tels que des rapports d'évaluation ou des bases de données.

OneDrive : Intégré à la suite Microsoft 365, OneDrive permet le stockage et la gestion des documents pour les utilisateurs de logiciels Microsoft, comme Excel et Power BI. Il facilite la collaboration pour les équipes utilisant ces outils pour l'analyse de données.

VII.4 Capacité de suivi-évaluation : Renforcement et planification des compétences

Pour garantir la réussite du suivi-évaluation, il est essentiel de renforcer les capacités de toutes les équipes impliquées. Les formations sont décrites ci-dessous selon les thématiques et les cibles.

VII.4.1 Formations de mise à niveau

La formation de mise à niveau devrait permettre à l'ensemble des acteurs du système de suivi évaluation de maîtriser les développements récents en matière de suivi-évaluation, surtout l'utilisation des nouveaux outils. Deux cadres de l'UNCP dont le responsable en suivi évaluation et les responsables S&E dans les provinces seront formés dans des institutions de formations à l'étranger sur le système de suivi-évaluation. Quant aux experts au niveau provincial, des formations sur mesure seront données dans une des provinces.

Tableau 14 : Les formations de mise à niveau

Bénéficiaires	Domaine de formation	Lieu
Cadres de l'UNCP, S&E UPEP	Système de suivi-évaluation	À l'étranger ENAP, Québec, Canada
Cadres de l'UNCP	Gestion de projet automatisée	À l'étranger
UPEP, DEP, SNSA	Suivi-évaluation	RDC Un cabinet externe

Mise en place d'un système de suivi-évaluation

École d'administration publique (ENAP)

Lieu : Québec, Qc, Canada

Durée : 4 ou 5 jours

Coûts : 2 500 CAD

Cette courte formation fait partie des modules spécialisés en évaluation du développement du Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED). Elle est particulièrement dédiée aux personnes membres ou responsables d'une équipe de suivi-évaluation ou d'une mission de déploiement d'un système de suivi-évaluation au sein de leur organisation.

Un ensemble d'outils et de bonnes pratiques ainsi que des études de cas réelles sont mises à profit pour préparer les participants à être responsables de la mise en place de leurs propres systèmes de suivi-évaluation.

Objectifs :

- Comprendre ce qu'est un système de suivi-évaluation de Programmes/projets, d'une politique et d'une organisation et ses enjeux.
- Maîtriser différents les étapes clés de mise en place d'un système de suivi-évaluation (cadre de mesure de rendement, cadre de résultats, outils de collecte et analyse, indicateurs de performances, rapportage et diffusion d'informations, protocoles, etc.).

Gestion de projet automatisée avec MS Project

CODEV International

Lieu : Tunis

Coût : 3 600 Euros

Durée : 2 semaines

Objectifs :

- Disposer d'une méthodologie précise de planification et de suivi de projet
- Savoir utiliser Project pour planifier un projet et en suivre l'avancement
- Connaître les meilleures pratiques pour optimiser la gestion d'un projet et le temps consacré à son suivi grâce à MS Project 2016
- Comprendre comment consolider plusieurs projets et créer des tableaux de bord de suivi
- Savoir partager des rapports percutants

VII.4.2 Formations spécifiques

Un élément clé du renforcement des capacités en S&E est la maîtrise des outils informatiques. Les formations devraient ainsi inclure :

- *Outils de gestion de données* : Formation sur les logiciels de gestion de bases de données (comme Excel, SPSS, Stata, ou des outils spécialisés en S&E comme KoboToolbox).
- *Technologies de collecte de données* : Utilisation de tablettes, téléphones portables, pour la collecte et la transmission de données en temps réel.
- *Analyse et visualisation des données* : Utilisation de logiciels pour analyser les données collectées et les présenter sous forme de rapports ou de visualisations compréhensibles (Excel, Power BI).

Tableau 15 : Les formations spécifiques

Bénéficiaires	Domaine de formation	Objectifs
Unité de suivi-évaluation de l'UNCP et de l'UPEP, DEP, SNSA	Analyse des données sur Excel	Maîtriser analyser des données de suivi-évaluation, interpréter les résultats, et générer des visualisations pertinentes
Unité de suivi-évaluation de l'UNCP, UPEP, SNSA, DEP	Power BI	Maîtriser Power Bi
Unité de suivi-évaluation de l'UNCP et UPEP	Les bases des méthodes d'évaluation de Programme	Comprendre les notions des évaluations de Programme
Unité de S&E UNCP et UPEP	KoboToolBox	Maîtriser la création d'un questionnaire, la collecte des données, le traitement des données avec KoboToolBox
UNCP, UPEP, DEP, OT	KoboCollect	Utilisation de tablettes, téléphones portables, pour la collecte et la transmission de données en temps réel.
L'informaticien	Gestion des données en cloud	Maîtriser les systèmes de gestion de données cloud
L'informaticien, Unité S&E UNCP, UPEP	Système d'information automatisé	Maîtriser le SIA
L'informaticien, la responsable de S&E, le spécialiste en gestion de savoir	Système d'information intégré	Maîtriser le SII

VII.4.3 Renforcement continu des compétences

En plus des formations ponctuelles, il est crucial de mettre en place un système de renforcement continu des capacités pour garantir une amélioration continue. Ce système peut inclure plusieurs éléments clés.

Tout d'abord, il est important d'organiser des **ateliers réguliers**. Ces ateliers permettent de réviser et d'approfondir les compétences acquises, ainsi que d'introduire de nouveaux concepts ou outils. En offrant des sessions de formation périodiques, on s'assure que les compétences des participants restent à jour et que les nouvelles tendances et pratiques sont intégrées.

Ensuite, il est recommandé de mettre en place **un système de coaching et de mentorat**. Ce Programme permet aux experts en suivi-évaluation (S&E) d'encadrer les membres de l'équipe moins expérimentés. Le coaching personnalisé aide à résoudre les problèmes spécifiques et à développer des compétences pratiques adaptées aux besoins individuels.

Enfin, **le partage de connaissances** doit être encouragé. Les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les équipes de S&E peuvent se faire à travers des réunions régulières ou des plateformes en ligne. Ce partage permet non seulement d'apprendre des expériences des autres, mais aussi d'améliorer les pratiques en cours en se basant sur des expériences concrètes et réussies.

Tableau 16 : Ateliers sur le renforcement continu des compétences

Participants	Thèmes	Formateur/Présentateur	Fréquence
Cadres UNCP, UPEP, parties prenantes	Cadre logique, la théorie des changements, les indicateurs	Consultant externe	1
UNCP, UPEP, DEP' OT	Nouveaux outils technologiques	Consultant externe	2x
UNCP, UPEP	Ateliers d'évaluation des projets : Ces ateliers se concentrent sur les présentations des études de cas des leçons tirées de projets agricoles antérieurs, permettant de partager des expériences concrètes et d'améliorer les méthodes de travail en fonction des erreurs ou succès passés.	Consultants internes	1x
Unité de S&E UNCP et UPEP	Réunions inter-équipes : Des réunions régulières peuvent être organisées entre les différentes équipes ou unités de suivi-évaluation pour discuter des défis rencontrés, partager les succès, et élaborer ensemble des solutions. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les nouvelles approches ou outils adoptés.	Équipe PNDA	2x (semestrielle)
Unité de S&E UNCP et UPEP, DEP	Séminaires ou webinaires thématiques : Ces sessions sont organisées sur des sujets spécifiques tels que l'évaluation de l'impact d'un Programme, l'analyse des données géospatiales, ou la gestion des risques en S&E. Ces séminaires permettent à différents experts de partager leur expertise avec un public plus large.	Externe, en ligne	Selon calendrier
Unité de S&E UNCP et UPEP, DEP	Ateliers d'analyse de données : Comment utiliser des outils comme Excel, SPSS ou Power BI pour analyser des données de suivi-évaluation, interpréter les résultats, et générer des visualisations pertinentes.	Consultant externe	1x
UNCP, UPEP, OT	Atelier de renforcement des capacités en rédaction de rapports : Formation aux techniques de rédaction claire et concise, adaptation des rapports aux attentes des différentes parties prenantes.	Consultant externe	1x

Unité de S&E UNCP et UPEP, OT	Atelier sur les méthodes qualitatives : Approfondir les méthodes d'enquêtes qualitatives comme les focus groupes, les entretiens semi-directifs et l'analyse thématique.	Consultant externe	1x
UNCP, UPEP, OT	Atelier sur la gestion des données en info nuage (cloud)	L'informaticien du PNDA	1x
UNCP, UPEP, services étatiques	Team Building	PNDA	1x

VIII. Communication et gestion des connaissances

Responsables : les unités de S&E de l'UNCP et des UPEP et les unités de communication et gestion de savoir de l'UNCP et des UPEP

Cette section concerne les méthodes de communication des données de suivi et des résultats d'évaluation, de tous les rapports sur le Programme. Les leçons tirées du Programme et les bonnes pratiques identifiées doivent être partagées, non seulement à l'interne, mais aussi avec une communauté plus large. Cela permet non seulement d'influencer les politiques agricoles à plus grande échelle, mais aussi d'améliorer d'autres programmes/projets similaires en adoptant des stratégies éprouvées et adaptées.

VIII.1 Capitaliser les expériences et ressortir les bonnes pratiques

La capitalisation d'expériences est un processus qui permet d'analyser, de valoriser et de partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les réussites du Programme. Cette démarche est particulièrement utile dans le domaine du développement agricole et peut impliquer plusieurs outils et méthodes. Voici quelques-uns des outils de capitalisation les plus couramment utilisés et qui sont adaptés au PNDA pour documenter les bonnes pratiques.

Tableau 17 : Les outils de capitalisation adaptés au PNDA

Outils de capitalisation	Faire ressortir les bonnes pratiques
Etudes de cas	Rédaction d'études de cas détaillées qui décrivent des situations spécifiques, les défis rencontrés, les solutions apportées et les résultats obtenus. Ces études servent à illustrer des pratiques efficaces et peuvent être partagées avec d'autres acteurs. <u>Exemple :</u> Témoignages des agriculteurs sur l'adoption des variétés améliorées de manioc, arachides ou maïs Transformation post-récoltes ou la pratique des cultures mixtes
Récits et témoignages	Collecte de témoignages et d'histoires de participants (agriculteurs, techniciens, etc.) qui ont vécu des expériences significatives. Cela permet de mettre en lumière les impacts réels des pratiques adoptées. <u>Exemples :</u> Témoignage d'un formateur local sur les pratiques de conservation de l'eau pour le manioc. Témoignage d'un responsable de coopérative sur l'augmentation des revenus grâce à la culture des arachides
Ateliers de réflexion et de partage	Organisation d'ateliers ou de séminaires où les acteurs concernés se réunissent pour discuter des expériences, échanger des idées et identifier des pratiques à capitaliser.

Observation participative	Implication des acteurs dans des processus d'observation pour recueillir des données sur les pratiques, les interactions et les résultats. Cela peut inclure des visites de terrain et des échanges entre pairs. <u>Exemples</u> : Techniques de Semis : Observer les techniques de semis direct et de semis traditionnel pour évaluer leur impact sur la germination et la croissance des plants d'arachides. Noter les différences dans les rendements et la santé des cultures. Surveillance de la Croissance : Observer la croissance des plants de manioc dans différentes conditions de culture pour évaluer les effets des pratiques culturelles sur la santé et le rendement des plants. Évaluation de l'Impact Environnemental : Participer à l'observation des effets environnementaux de la culture du manioc, tels que l'érosion des sols et la biodiversité, et identifier les pratiques durables qui minimisent ces impacts
Documentation systématique	Mise en place de systèmes pour documenter régulièrement les pratiques, les processus et les résultats du Programme. Cela inclut l'utilisation de journaux de bord, de tableaux de suivi, et d'autres outils de gestion de l'information.
Évaluation et retour d'expériences	Réalisation d'évaluations formelles ou informelles pour analyser les résultats d'un projet, identifier les leçons apprises et formuler des recommandations pour l'avenir. <u>Exemple</u> : Récit d'un agriculteur utilisant des semences améliorées d'arachides. Récit d'une agricultrice adoptant des techniques de rotation de cultures pour le manioc

VIII.2 Diffusion des rapports et partage des bonnes pratiques

VIII.2.1 Diffusion des rapports de suivi et d'évaluation

La diffusion des rapports de S&E est une étape clé pour assurer la transparence, l'appropriation des résultats par les parties prenantes et la prise de décisions éclairées. Elle peut prendre plusieurs formes, telles que des séminaires, des ateliers, et des sessions d'information. Ces événements permettent de partager les résultats des évaluations, les résultats atteints, les impacts et les recommandations, tout en favorisant un dialogue entre les acteurs du Programme.

Il est essentiel d'adopter une approche proactive dans la communication des résultats des rapports. Les **séminaires et ateliers** sont des événements formels qui réunissent des parties prenantes variées (bailleurs de fonds, ministères, bénéficiaires, ONG, représentants des agriculteurs, organisation paysanne...) et peuvent inclure une communauté plus élargie.

Pour une meilleure compréhension, il est important de fournir des exemplaires imprimés des rapports de suivi-évaluation, des résumés exécutifs ou des fiches techniques afin que les participants puissent suivre les présentations de manière plus efficace. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir la mise à disposition de ces rapports en version numérique via des plateformes en ligne, telles que des **sites internet** ou des **drives partagés**. Ceci garantit une large diffusion et facilite l'accès aux informations pour ceux qui ne peuvent être présents physiquement.

Dans certains cas, l'organisation d'une retransmission en direct (streaming) peut s'avérer utile pour permettre aux participants ne pouvant pas se déplacer de suivre les discussions en temps réel. De plus, l'enregistrement des sessions permet de conserver une trace des échanges pour d'éventuelles consultations ultérieures.

VIII.2.2 Partage des bonnes pratiques

Se contenter de documenter une bonne pratique n'est pas suffisant, il est également important de la diffuser et de la partager avec un public varié, qui peut être composé de décideurs politiques, d'organisations paysannes, d'individus, d'agents de vulgarisation et d'organisations partenaires. Une

bonne pratique doit donc être présentée sous différents formats en fonction du public ciblé (format écrit, audio, vidéo, etc.).

La diffusion et le partage, qui impliquent l'interaction et le dialogue, peuvent avoir lieu à travers divers outils et méthodes, notamment :

- **Foires aux savoirs** : Espaces de rencontre pour partager des connaissances et des expériences.
- **Ateliers** : Séances de travail collaboratif pour approfondir les sujets.
- **Bulletins d'information** : Publications régulières sur les bonnes pratiques et les résultats.
- **Visites d'échange** : Rencontres sur le terrain pour observer des pratiques efficaces.
- **Radios rurales** : Programmes radio pour atteindre un large public, en particulier dans les zones rurales.
- **Sites web et blogs** : Plateformes pour publier des articles et des études de cas sur les bonnes pratiques.
- **Réseaux et communautés de pratique** : Groupes d'échanges permettant aux membres de partager leurs expériences et connaissances.
- **Téléphonie mobile et microblogs** : Outils pour partager des mises à jour rapides et engageantes.
- **Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp...)**: Outils permettent de partager instantanément les bonnes pratiques à une audience plus large, de faciliter l'accès à l'information et favoriser l'engagement des parties prenantes.
- **Intranet et courriel** : Canaux internes pour la diffusion d'informations au sein des équipes.

La décision relative aux méthodes et outils pour le partage et la diffusion des bonnes pratiques devrait faire l'objet de discussions avec les parties prenantes associées au processus de capitalisation. Cette approche collaborative garantit que les formats choisis répondent aux besoins et aux attentes des différentes audiences.

VIII.3 Gestion des connaissances (Knowledge management) et système d'information intégré

Le Knowledge Management correspond au processus d'identification, d'organisation, de stockage et de diffusion des informations au sein d'une équipe. Il s'agit d'un système de gestion des connaissances, qui garantit un accès à l'information à l'ensemble des acteurs du Programme.

Le système d'information intégré (SII) est un outil pour le système de gestion de connaissances³. La gestion des connaissances en suivi et évaluation consiste à organiser, capturer, et diffuser les informations et le savoir acquis tout au long du cycle de vie du Programme. Elle permet aux parties prenantes de tirer des leçons des expériences passées, d'améliorer la prise de décision, et de

³ Voir « Manuel des opérations du PNDA, 2021 »

maximiser l'impact des interventions. Elle favorise une culture d'apprentissage continu au sein des équipes de l'UNCP et des UPEP.

VIII.3.1 Le système d'information intégré (SII)

Le **Système d'Information Intégré (SII)** du PNDA peut fonctionner comme un **outil de gestion des connaissances** (ou CMS⁴) au sein du Programme. Il permet d'organiser, capturer et diffuser des informations et des savoirs acquis tout au long du cycle de vie du Programme, facilitant ainsi le partage des leçons apprises et l'amélioration de la prise de décision. Ce système joue un rôle clé dans la gestion des connaissances en suivi et évaluation en assurant une meilleure communication des résultats, un apprentissage continu et une collaboration fluide entre les parties prenantes, de l'**UNCP** aux **UPEP**.

Le **SII** est conçu comme un **ensemble de technologie, de processus et de personnes** qui permet de collecter, stocker, traiter, analyser, et partager des informations de manière cohérente et centralisée. Tout comme un CMS classique, il regroupe des informations provenant de différentes sources et les rend accessibles à tous les acteurs concernés qu'ils soient locaux ou à distance, et à différents niveaux de responsabilité (local, provincial, national ou international).

Il permet la circulation et la gestion de l'information au sein du Programme ainsi qu'avec le secteur agricole. Chaque acteur jouera un rôle actif dans la production, l'analyse et l'échange des informations générées par le cycle annuel de mise en œuvre du Programme.

Toutes les informations sont centralisées car elles sont stockées dans une base de données unique ou connectée, accessible à plusieurs utilisateurs.

Il permet une **interconnexion des systèmes** en regroupant différents outils ou systèmes qui étaient auparavant séparés (par exemple, gestion des données agricoles, rapports financiers, rapports de suivi des indicateurs) pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière harmonisée.

Les utilisateurs, qu'ils soient dans différents départements ou régions, peuvent accéder à des informations communes, actualisées en temps réel, depuis un seul point d'accès (par exemple, via **un portail en ligne**).

Le système permet une **analyse et visualisation des données en temps réel**. En effet, il offre des outils d'analyse (comme des tableaux de bord ou des graphiques) pour aider les utilisateurs à interpréter les informations de manière visuelle et simplifiée. Les outils d'analyse permettront de télécharger des données, de construire des tableaux personnalisés, et de comparer les évolutions dans le temps, grâce à une visualisation graphique simplifiée.

Les agents sur le terrain pourraient **entrer les informations en temps réel**, et ces données seraient immédiatement disponibles pour les gestionnaires du Programme à Kinshasa, les bailleurs de fonds internationaux, ou les parties prenantes.

Par exemple :

⁴ Un **CMS (Content Management System)**, ou **Système de Gestion de Contenu**, est une plateforme logicielle qui permet de créer, gérer et modifier des contenus numériques sur un site web sans nécessiter de compétences techniques approfondies en programmation. Il facilite la publication et l'organisation de contenus, comme des articles, des images, des vidéos ou des documents, en offrant une interface utilisateur intuitive

- Les informations sur les productions agricoles de Kwilu pourraient être comparées avec celles de Kasai en un clic.
- Des rapports automatiques sur l'impact des nouvelles technologies agricoles distribuées par le Programme pourraient être générés régulièrement.
- Les acteurs du Programme, qu'ils soient à Kasai-Central ou à Kinshasa, pourraient accéder aux mêmes informations mises à jour.

Un système d'information intégré favorise donc une gestion plus fluide, collaborative et efficace des données, facilitant ainsi la **communication des résultats**, le **suivi-évaluation**, et la **gestion des projets complexes** comme le PNDA.

Pour les **contenus**, le SII doit inclure plusieurs modules interconnectés qui répondent aux différents aspects de la gestion des connaissances, du suivi-évaluation, et de la gestion des données agricoles. Voici une structure possible :

1. Module de collecte de données sur le terrain

- Un module qui permet aux agents de **saisir des données directement sur le terrain** (via des tablettes ou smartphones) concernant les récoltes, les techniques agricoles, ou la distribution des intrants. Ce module devrait inclure des **formulaires dynamiques** avec des champs obligatoires pour assurer la cohérence des données.
- **Exemple** : Un formulaire numérique pour capturer les données sur le rendement agricole par culture et par région.

2. Module de gestion des documents

- Un espace centralisé pour **stocker et organiser les documents** (fiches de bonnes pratiques, rapports d'évaluation, études d'impact, etc.). Il serait similaire à un **CMS** avec des fonctionnalités de recherche avancée, de filtres et de classement par projet, par région, ou par type de document.
- **Exemple** : Un dossier partagé contenant des études de cas et des fiches méthodologiques classées par province.

3. Tableaux de suivi des indicateurs de performance

- Ce module permet de **suivre en temps réel les indicateurs de performance** clés pour chaque composante ou région. Il pourrait inclure des indicateurs liés à la production agricole, l'impact des technologies, ou l'utilisation des intrants.
- **Exemple** : Un tableau montrant le rendement agricole comparé aux objectifs fixés pour l'année.

4. Analyse et visualisation des données

- Ce module offre des **outils d'analyse des données** pour générer des rapports, des graphiques, et des cartes. Les utilisateurs peuvent construire leurs propres tableaux personnalisés ou exporter des données pour un traitement ultérieur.

- **Exemple** : Un outil d'analyse qui permet de comparer les rendements agricoles de différentes régions sur plusieurs années.

5. Module de génération de rapports automatiques

- Le système doit pouvoir générer des **rapports automatiques** basés sur les données collectées et les indicateurs de performance. Les rapports peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins des gestionnaires, des bailleurs de fonds, ou des décideurs.
- **Exemple** : Un rapport trimestriel automatique sur l'avancement du Programme agricole avec des visualisations de données.

VIII.3.2 La gestion des connaissances (Knowledge Management)

Pour développer un système de gestion des connaissances (GC) pour le Programme, en s'appuyant sur le SII, il est essentiel d'incorporer divers éléments qui facilitent la collecte, le partage, et l'utilisation des connaissances acquises. En intégrant ces éléments dans ce système de gestion des connaissances, le Programme peut maximiser son impact à travers une meilleure synergie entre S&E et GC. Cette approche garantit que les résultats des évaluations, les leçons apprises et les meilleures pratiques sont non seulement documentés, mais également diffusés de manière efficace, renforçant ainsi la prise de décision, l'apprentissage organisationnel et la résilience des bénéficiaires.

Le système de GC du PNDA repose sur plusieurs éléments interconnectés, visant à faciliter le partage, la diffusion et l'utilisation des informations générées au cours du Programme. Le système pourra contenir les composantes suivantes.

Plateforme de collaboration et de partage

C'est une plateforme intégrée au système d'information pour faciliter la collaboration entre les équipes de suivi-évaluation et de gestion des connaissances. Cette plateforme permet le partage des données, des résultats d'enquêtes, des histoires de succès et d'autres produits de connaissances. De plus, un forum de discussion ou des groupes de discussions peuvent être créés pour permettre aux équipes et aux bénéficiaires de partager leurs meilleures pratiques et retours d'expérience. Ces échanges d'information enrichissent les connaissances de tous les participants.

Planification conjointe

Un calendrier intégré des activités S&E et GC sera élaboré pour synchroniser les moments clés de la collecte de données, la production de rapports et l'organisation des ateliers de partage de connaissances. Cela permet d'assurer une allocation efficace des ressources matérielles et humaines. Des réunions régulières, bimensuelles par exemple, seront mises en place entre les équipes de S&E et de GC pour discuter des activités en cours et des synergies possibles.

Produits de connaissance et capitalisation des connaissances

Plusieurs produits de connaissance pourront être développés. Des brochures sur les bonnes pratiques agricoles pour les cultures d'arachide, de manioc ou de maïs seront distribuées lors des formations ou ateliers. De plus, des guides pratiques détaillant les étapes de la culture, de l'entretien et de la récolte seront accessibles en format imprimé et numérique. Le Programme produira également des rapports, des bulletins d'information et des études de cas documentant les réussites et les enseignements du Programme, ainsi que des récits basés sur des témoignages d'agriculteurs

pour renforcer l'engagement des parties prenantes. Un exemple de rapport de capitalisation de connaissances se trouve en annexe.

Tableau 18 : Les différents types de documents résultant de la capitalisation

Produits de connaissances	Contenus
Policy Brief	Un document qui présente les grandes lignes et les objectifs du Programme ou d'une initiative dans le cadre du PNDA, en expliquant le contexte, les enjeux, et les bénéficiaires ciblés. Ce policy brief sert souvent à communiquer des idées à des partenaires externes ou des bailleurs de fonds, tout en offrant des recommandations pratiques
Fiche d'Information	Un document concis qui fournit des données essentielles sur un projet, une initiative ou une bonne pratique. Il inclut des éléments tels que les objectifs, les acteurs impliqués et les résultats attendus. Ce type de fiche est utile pour des présentations rapides ou des résumés pour les parties prenantes.
Fiche d'Expérience	Documentation d'une expérience qui met en évidence la démarche utilisée pour sa mise en œuvre, ainsi que les enseignements tirés après l'analyse des contraintes et des facteurs clés de succès. Elle permet de partager des leçons apprises et d'informer d'autres projets similaires
Fiche de Bonne Pratique	Elles documentent les pratiques validées et répétées, en mettant en avant les facteurs clés de succès. Elles fournissent des modèles reproductibles pour des initiatives futures. Elle inclut la description complète de la pratique, le contexte dans lequel elle a été appliquée, les méthodes utilisées (ex. : méthodologie, outils), les étapes détaillées de mise en œuvre, les indicateurs de performance, les résultats et leçons tirées, et les facteurs favorables et obstacles rencontrés.
Fiche Méthodologique	Documentation de la méthodologie participative, souvent sensible au genre, utilisée lors d'une action ou d'une série d'activités sur un même thème. Elle inclut des éléments pratiques et théoriques, servant de guide aux praticiens sur le processus à suivre.
Etude de cas	Analyse détaillée d'une pratique ou d'une situation spécifique, permettant d'illustrer l'efficacité d'une intervention ou d'une méthodologie et de démontrer son impact. Les études de cas peuvent être utilisées pour former des arguments en faveur d'une bonne pratique ou pour évaluer son efficacité.
Note de Bonnes Pratiques	Un document récapitulatif qui met en exergue les points saillants d'une expérience ou d'une bonne pratique. Il ne doit pas être exhaustif, mais il contient des informations techniques et d'autres éléments pertinents qui peuvent être utiles pour les décideurs et les praticiens : les objectifs de la pratique, les enseignements clés, les recommandations, les facteurs de succès principaux et les impacts observés
Documentation Opérationnelle	Description des détails opérationnels liés à la mise en œuvre des objectifs stratégiques et des énoncés de politique. Cela inclut les processus, les ressources nécessaires et les indicateurs de succès, servant de référence pour les opérations quotidiennes.

Communication cohérente et multicanaux

Une stratégie de communication unifiée sera élaborée pour assurer la cohérence dans la présentation des résultats de S&E et des produits de connaissance. Cette stratégie utilisera une variété de médias, y compris les réseaux sociaux, les médias traditionnels et les radios communautaires, pour maximiser la portée des informations auprès des diverses parties prenantes.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Personnes rencontrées lors de la 1ère mission

ANNEXE 2 : Chronogramme du S&E



Calendrier S&E.xlsx

ANNEXE 3 : Exemple de questionnaire pour l'enquête sur la production

ANNEXE 4 : Les étapes de la création d'un questionnaire sur Kobotoolbox

ANNEXE 5 : Les GPS pour le calcul des superficies des champs agricoles

ANNEXE 6 : Exemple de guide d'entretiens auprès des agriculteurs bénéficiaires

ANNEXE 7 : Exemple de guide d'entretiens auprès des utilisateurs des infrastructures rurales

ANNEXE 8 : Exemple de guide d'entretiens auprès des MPME agro-industrielles bénéficiaires

ANNEXE 9 : Exemple de guide d'entretiens auprès des organisations paysannes bénéficiaires

ANNEXE 10 : Exemple de questions pour les focus group

ANNEXE 11 : Cadre de mesure des résultats et fiches des indicateurs



CMR et Fiches
Indicateurs PNDA.xlsx

ANNEXE 12 : Canevas du PTBA



Rapport PTBA

ANNEXE 13 : Tableau de bord du PTBA



tableaux de bords de
suivi activités PNDA.xl

ANNEXE 14: Canevas du rapport de suivi trimestriel



Rapport de suivi
Trimestriel PNDA.doc

ANNEXE 15 : Canevas du rapport annuel



Rapport_Annuel S&E
PNDA.docx

ANNEXE 16 : Exemple de rapport de capitalisation de connaissances

ANNEXE 1 : PERSONNES RENCONTRÉES LORS DE LA 1^{ÈRE} MISSION

19 août 2024	
UNCP	
Jean de Dieu Mbey	Coordonnateur national
Nathalie Kapunga	Responsable du S&E
Lazare Milambo	Expert agronome
OT	
Lawrence Mvika	Coordonnateur Technique de l'OT du Kwilu - Groupement CCM Worldwide et Cie
Philippe Nzita	Coordonnateur de l'ONG AMAR, Chef de file du Groupement AMAR -FRMi – AGRISUD - OT du Kasai Central
Addmore Mufanechiya	Chargé de Suivi Evaluation de HPP-Congo, OT du Kasai
Yassine Eleuch	CCM, OT Kwulu
UPEP	
Carnel Messa Kimvita	Coordonnateur UPE Kwulu
Grégoire Maponoko Adzadza	Coordonnateur de UPE du Kasai
Fidèle Balimo	Expert en Recherche Agronomique et Appliquée, UPEP Kasai Central
Véronique Baka	Coordonnatrice UPEP Kasai Central
Sarah Pangasudi Amina	Assistante en Communication et Gestion des Savoirs, UPEP Kwilu
Lazare Milambo Bwimba	Expert Agronome/UNCP
Jeaney Kabeya	Assistant en Communication
Delphin Kukupula Pezo	Expert en Recherche Agronomique et Appliquée, UPEP Kwilu
Alex Paku	Responsable Provincial S/E, UPEP Kasai
20 août 2024	
OT	
François Kata	Coordonnateur Technique du Groupement AMAR & Cie, Kasai Central
Services étatiques	
Dany Nkutua	Expert et Point Focal du Comité des DANTIC
Désiré Musanjji	Coordonnateur National du SENAPEFIC (Service National de Promotion de l'Elevage Familial et Intrants Connexes)
Rubens Ekofa	Coordonnateur National du SNSA (Service National des Statistiques Agricoles)
Salomon Siyangoli	Coordonnateur du Comité des DANTIC
Pius Kitwanda Lusala	Directeur Chef des Services d'Etudes et de Planification/Ministère National de la Pêche et Elevage
Eulalie Kashwantale	Chef de Bureau Direction d'Etudes et Planification/Ministère de la Pêche et Elevage
Kibukusa Mukunda	Directeur Chef des Services d'Etudes et Planification/Ministère National du Développement Rural
Kandu Kasongo	Coordonnateur National du SENASEM (Service National de Semences)
Daniel Dibwe Munkamba	Chercheur INERA (Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques)
Freddy Bakaka	Freddy Bakaka, Inspecteur Semencier National/SENASEM

21 Août 2024	
Équipe de la sauvegarde	
Jean Paul Mukadi Wa Mukadi	Spécialiste national en sauvegarde environnemental
Crispin Lumbombo Musolo	Expert national en développement social
Philemon Ngongo Kilongozi	Expert Violence Basée sur le Genre
Gérard Bafuka Masembo	(Expert technique national en infrastructures)
Communication	
Dominique-Roger Kadimamuya	Expert national en gestion de savoir
Banque Mondiale	
Reid Cooper	Consultant de la Banque Mondiale

ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME DU S&E

	déc	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	octobre	nov	déc	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet		
	Année 0	Année 1												Année 2								
	Saison B													Saison B								
	Préparation terrain	Séances				Recolte							Préparation terrain	Séances				Recolte				
							Saison A													Saison A		
							Préparation terrain	Séances				Recolte								Préparation terrain		
Planification des activités S&E pour l'année																						
Plan de travail et de budget annuel																						
Réunion préparatoire pour le PBTA N+1, lettre de cadrage (orientations et priorités)																						
Consultation des parties prenantes																						
Élaboration du PTBA par chaque UPEP																						
Validation par le CPCS																						
Consolidation par UNCP																						
Validation par UNCP et CTN																						
Validation par COPIL																						
Transmis à la BM et au gouvernement																						
Mise en place du système de gestion financière																						
COLLECTE DES DONNÉES																						
Enquête sur la production																						
Collecte des données sur la production																						
Révision des outils et méthodologie																						
Formation des agents de terrain																						
Collecte des données																						
Exploitation des données																						
Groupes de discussion																						
Enquête auprès des bénéficiaires																						
Révision des outils et de la méthodologie																						
Formation des enquêteurs																						
Enquête																						

	déc	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	octobre	nov	déc	janvier	février	mars	avril
	Année 0	Année 1												Année 2			
	Saison B												Saison B				
	Préparation terrain	Séances			Recolte								Préparation terrain	Séances			
							Saison A										
							Préparation terrain	Séances				Recolte					
Rapport trimestriel																	
Collecte des données sur les activités en cours																	
Analyse des progrès par rapport aux objectifs (UPEP)																	
Consolidation par l'UNCP																	
Transmis à la BM et au gouvernement																	
Ajustments nécessaires																	
Rapport de performance semestriel																	
Préparation du rapport semestriel																	
Consolidation par l'UPEP																	
Consolidation par l'UNCP																	
Validation par CTN																	
Transmis à la BM et au gouvernement																	
Réunion de planification pour le second semestre																	
Suivi des recommandations et mise en oeuvre des actions correctives																	
Rapport annuel																	
Préparation du rapport annuel																	
Consolidation par l'UPEP																	
Consolidation par l'UPEP																	
Consolidation par l'UNCP																	
Validation par CTN																	
Transmis à la BM et au gouvernement																	
Analyse des leçons apprises et ajustements des stratégies pour le prochain cycle																	

ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE TYPE POUR L'ENQUÊTE SUR LA PRODUCTION

Voici un exemple de questionnaire pour collecter des données sur la production dans le cadre du suivi des indicateurs de performance du Programme

Date : [Date de la collecte]

Province : ☐ Kwilu ☐ Kasai-Central ☐ Kasai

Composante : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Saison : ☐ A ☐ B

Responsable de la Collecte : [Nom du collecteur]

I. Informations Générales

1. Nom du Producteur : [Nom du producteur]
2. Localité : [Village/Commune]
3. Surface Cultivée (en hectares) : [Nombre d'hectares]
4. Type de Culture : [Liste des cultures, par exemple : "Maïs, Manioc, Arachide"]

II. Données de Production

1. Quantité Totale de Production (en tonnes) pour la Période : [Quantité totale produite]
2. Rendement Moyen par Hectare (en tonnes/ha) : [Rendement moyen]

Détail par Culture (si applicable) :

- Culture 1 :
 - Quantité Produite (en tonnes) : [Quantité]
 - Surface Cultivée (en hectares) : [Surface]
 - Rendement (en tonnes/ha) : [Rendement]
- Culture 2 :
 - Quantité Produite (en tonnes) : [Quantité]
 - Surface Cultivée (en hectares) : [Surface]
 - Rendement (en tonnes/ha) : [Rendement]

III. Adoption de nouvelles technologies AIN et AIC

1. Utilisation de Techniques Recommandées :
 - ☐ Oui
 - ☐ Non
 - Si non, pourquoi ? [Réponse libre]
2. Connaissez-vous les nouvelles technologies agricoles d'Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) ?
 - ☐ Oui
 - ☐ Non

3. Avez-vous adopté des pratiques d'AIC cette année ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

4. Si oui, lesquelles ?

- _____

5. Connaissez-vous les nouvelles technologies agricoles d'Agriculture Intelligente en Nutrition (AIN) ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

6. Avez-vous adopté des pratiques d'AIN cette année ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

7. Si oui, lesquelles ?

- _____

IV. Ventes des produits agricoles sur le marché formel

1. Quantité de produits vendue cette année sur le marché formel (en kilogrammes/tonnes) :

- Maïs : _____
- Manioc : _____
- Arachide : _____
- Autres : _____

2. Prix de vente moyen sur le marché formel (en FCFA ou USD) :

- Maïs : _____
- Manioc : _____
- Arachide : _____
- Autres : _____

3. Comment évaluez-vous l'accès au marché formel pour vos produits agricoles ?

- ☐ Facile
- ☐ Moyennement facile
- ☐ Difficile

4. Avez-vous bénéficié d'un appui pour accéder aux marchés formels ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

24. Si oui, de quel type d'appui avez-vous bénéficié ? (Cochez tout ce qui s'applique)

- ☐ Transport
- ☐ Accès à des acheteurs formels
- ☐ Mise en relation avec des commerçants
- ☐ Autres : _____

V. Section E : Mortalité animale

1. Combien d'animaux élevez-vous actuellement ? (précisez pour chaque espèce)

- Bovins : _____
- Ovins : _____
- Caprins : _____
- Volaille : _____
- Autres : _____

2. Combien d'animaux avez-vous perdus cette année (mortalité) ? (précisez pour chaque espèce)

- Bovins : _____
- Ovins : _____
- Caprins : _____
- Volaille : _____
- Autres : _____

3. Par rapport à l'année précédente, avez-vous constaté une réduction de la mortalité animale ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

4. Si oui, de combien estimez-vous la réduction de la mortalité animale cette année (en pourcentage) ?
_____ %

Problèmes Rencontrés

1. Quels sont les principaux problèmes ou défis que vous avez rencontrés au cours de la période de production ?

- [Réponse libre]

2. Comment ces problèmes ont-ils impacté votre production ?

- [Réponse libre]

ANNEXE 4 : LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'UN QUESTIONNAIRE SUR KOBOTOOLBOX

Lien : [Guide de formation KoBoToolbox en français - Google Slides](#)

Pour intégrer un questionnaire dans KoboToolbox, voici les étapes pour créer, déployer et gérer le questionnaire.

1. Planification du questionnaire

- Définir les objectifs du questionnaire
- Identifier les types de questions (ouverte, fermée, etc.)
- Déterminer les indicateurs à mesurer

2. Création du projet sur KoBoToolbox (aller sur [KoboToolbox](#))

- Se connecter à KoBo Toolbox
- Créer un nouveau projet : Cliquer sur “New Project”
- Nommer le projet et ajouter une description si nécessaire, puis cliquez sur “Create Project”.

3. Création d'un questionnaire

Il y a deux options principales pour créer un questionnaire :

- FormBuilder (Interface visuelle) :
 - Cliquer sur "Build from scratch" pour démarrer avec un formulaire vide.
 - Ajouter des questions en sélectionnant des types de questions comme texte, choix multiples, sélection unique, date, photo, vidéo, géopoint, etc.
 - Configurer les options pour chaque question (par exemple, rendre une question obligatoire, ajouter des validations).
 - Utiliser la fonction "Logic" pour ajouter des conditions (jumps logiques) qui dirigent les utilisateurs vers différentes questions en fonction de leurs réponses précédentes.
- À partir d'un fichier excel (XLSForm) : Télécharger un modèle de formulaire Excel (XLSForm) depuis KoboToolbox.
 - Remplir le questionnaire dans Excel en suivant la structure XLSForm, qui permet des configurations avancées comme les groupes, les répétitions, les conditions complexes (comment utiliser XLSForm : [Overview \(im-portal.org\)](#))
Utiliser la feuille de calcul XLSForm pour créer des questionnaires complexes, surtout si vous avez besoin de fonctions avancées comme des boucles, des logiques conditionnelles multiples, ou des validations spécifiques.
 - Télécharger votre fichier Excel rempli dans KoboToolbox pour générer le formulaire.

4. Prévisualiser le Formulaire

- Utiliser la fonction "Preview" (Prévisualisation)
- Faire un test en répondant aux questions pour vérifier que les logiques conditionnelles et les validations sont correctes.
- Apporter des corrections et ajustements si nécessaire

5. Déployer le Formulaire

- Une fois le questionnaire finalisé, cliquer sur "Deploy" pour le rendre actif.

- Partager le lien avec les enquêteurs, ou télécharger le questionnaire sur des appareils mobiles via l'application KoboCollect

6. Collecte de Données

- Les enquêteurs peuvent accéder au questionnaire sur leurs appareils mobiles via un lien web ou l'application KoboCollect.
- Les données peuvent être saisies hors ligne si nécessaire et synchronisées plus tard lorsque l'appareil est connecté à Internet.

7. Suivi et Gestion des Données

- Accéder aux données collectées via l'interface de KoboToolbox en temps réel.
- Visualiser les données sous forme de tableaux, graphiques, ou cartes, et exportez-les dans divers formats pour une analyse plus approfondie.

8. Analyser et Exporter les Données

- KoboToolbox permet d'exporter les données collectées au format CSV, Excel, SPSS, etc.
- Analyser les réponses selon les indicateurs définis
- Utiliser des outils comme Power BI, Tableau, ou Excel pour des analyses plus détaillées, ou directement travailler dans KoboToolbox pour des analyses basiques.

ANNEXE 5 : LES GPS POUR LE CALCUL DES SUPERFICIES DES CHAMPS AGRICOLES

GPS Fields Area Measure

GPS Fields Area Measure est une application mobile populaire utilisée pour mesurer les surfaces agricoles et d'autres terrains en extérieur. Elle est disponible sur **Android** et **iOS**, et permet de calculer facilement la superficie d'un champ en marchant autour de son périmètre ou en définissant des points GPS manuellement. C'est une solution simple et efficace, souvent utilisée dans le domaine agricole, de la construction, et dans des projets nécessitant des relevés topographiques rapides.

Fonctionnalités clés

1. **Mesure de surface et de distance** : L'application permet de calculer les surfaces en marchant le long des contours ou en entrant des points GPS. Elle est aussi capable de mesurer des distances entre des points spécifiques.
2. **Enregistrement des données** : Une fois les relevés effectués, il est possible d'enregistrer les résultats pour les exporter sous différents formats (CSV, KML, GPX).
3. **Précision** : Bien que l'application utilise le GPS intégré des smartphones, elle peut être améliorée en se connectant à des récepteurs GPS externes (comme les systèmes RTK) pour des mesures plus précises.
4. **Support de différents formats d'exportation** : Vous pouvez exporter les résultats en formats compatibles avec d'autres logiciels (par exemple, Google Earth, QGIS) pour une analyse plus approfondie.
5. **Mode hors ligne** : Vous pouvez travailler dans des zones sans couverture Internet, l'application continuera à enregistrer vos points GPS pour les calculs.
6. **Planification des points manuellement** : Si vous ne pouvez pas parcourir physiquement la zone, l'application permet de marquer des points directement sur la carte pour calculer la surface.

Coût

L'application propose plusieurs versions, chacune avec des fonctionnalités différentes :

1. **Version gratuite** :
 - La version de base est gratuite et offre les fonctionnalités principales comme la mesure de surface et de distance. Cependant, certaines fonctionnalités avancées, telles que les options d'exportation, peuvent être limitées dans cette version.
2. **Version Pro** (achat in-app ou abonnement) :
 - La version Pro inclut des fonctionnalités avancées telles que la sauvegarde illimitée, l'exportation dans plusieurs formats (CSV, KML, GPX), et la possibilité de travailler avec plus de détails. Cela coûte environ **10 à 15 USD** pour un achat unique.
 - D'autres options sont disponibles sous forme d'abonnement pour environ **5 à 8 USD par mois**, ou **30 à 50 USD par an**, en fonction des fonctionnalités choisies (comme la mesure avec une précision plus élevée, le support des récepteurs GPS externes, ou des cartes spécialisées).

Comment l'acheter

1. **Android** : Vous pouvez télécharger et acheter l'application sur le **Google Play Store**.
 - Lien vers l'application : [GPS Fields Area Measure - Google Play](#)
 - Une fois l'application installée, vous pouvez effectuer un achat in-app pour passer à la version Pro.
2. **iOS** : Disponible sur l'**App Store** d'Apple.
 - Lien vers l'application : [GPS Fields Area Measure - App Store](#)

- Comme pour la version Android, vous pouvez opter pour des achats in-app pour accéder à la version Pro.

Avantages

- Facilité d'utilisation avec une interface intuitive.
- Précision raisonnable avec la possibilité d'utiliser des récepteurs GPS externes pour une meilleure précision.
- Adaptée aux travaux agricoles, forestiers, et même pour des relevés topographiques simples.

Inconvénients

- La précision dépend du type de GPS utilisé, donc l'utilisation du GPS intégré des smartphones peut ne pas être suffisante pour des mesures très précises.
- Certaines fonctionnalités avancées nécessitent l'achat de la version Pro.

C'est une application idéale pour des agriculteurs ou des techniciens souhaitant mesurer rapidement des surfaces, mais pour des besoins professionnels nécessitant une grande précision, il peut être nécessaire d'investir dans un GPS de haute précision (comme RTK)

Quelques GPS compatible avec GPS Fields Area Measure

Voici quelques suggestions de récepteurs GPS externes compatibles avec **GPS Fields Area Measure** via Bluetooth et adaptés pour des projets nécessitant une précision centimétrique ou submétrique :

1. *Emlid Reach RS2+*

- **Précision** : Centimétrique en mode RTK.
- **Compatibilité** : Compatible avec l'application GPS Fields Area Measure via Bluetooth. Il peut se connecter à un smartphone Android ou iOS pour améliorer la précision des mesures.
- **Caractéristiques** :
 - Multi-bandes GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).
 - Connexion Bluetooth et Wi-Fi pour une intégration facile avec des applications SIG et agricoles.
 - Durée de la batterie : Environ 22 heures, idéal pour les relevés sur le terrain.
 - Support pour correction RTK en temps réel.
- **Prix** : Environ **1 900 à 2 300 USD**, ce qui en fait une solution abordable pour une précision centimétrique.

2. *Trimble R2 GNSS Receiver*

- **Précision** : Centimétrique avec RTK, submétrique sans RTK.
- **Compatibilité** : Compatible avec des smartphones/tablettes Android et iOS via Bluetooth.
- **Caractéristiques** :
 - Précision ajustable (selon les besoins du projet) : du submétrique au centimétrique.
 - Prise en charge de plusieurs systèmes satellites (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).
 - Compact, robuste et conçu pour un usage sur le terrain.
- **Prix** : Approximativement **4 000 à 6 000 USD**, en fonction des options (très fiable, mais plus cher).

3. *SXBlue Platinum*

- **Précision** : Submétrique avec SBAS (Satellite-Based Augmentation System), et centimétrique avec RTK.

- **Compatibilité** : Peut se connecter aux appareils Android et iOS via Bluetooth. Compatible avec GPS Fields Area Measure pour des relevés précis.
- **Caractéristiques** :
 - Fonctionne avec plusieurs constellations GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS).
 - Correction par SBAS, L-Band, ou RTK pour une précision maximale.
 - Longue autonomie et conçu pour des environnements difficiles.
- **Prix** : Environ **2 500 à 3 500 USD**.

4. *Topcon HiPer VR*

- **Précision** : Centimétrique avec RTK, submétrique avec des corrections différentielles.
- **Compatibilité** : Connecté via Bluetooth à un smartphone ou une tablette, compatible avec des applications comme GPS Fields Area Measure.
- **Caractéristiques** :
 - Multi-GNSS pour une précision maximale dans différentes conditions.
 - Robuste et conçu pour les environnements extérieurs difficiles (résistant à l'eau et à la poussière).
 - Peut être utilisé en mode mobile ou station de base RTK.
- **Prix** : **6 000 à 8 000 USD**, option haut de gamme avec des fonctionnalités très avancées.

5. *Bad Elf GNSS Surveyor*

- **Précision** : Submétrique (1 à 2 mètres) sans correction, mais peut atteindre une précision centimétrique avec des corrections RTK.
- **Compatibilité** : Fonctionne avec les appareils Android et iOS via Bluetooth. Compatible avec GPS Fields Area Measure.
- **Caractéristiques** :
 - Léger et portable, facile à utiliser.
 - Idéal pour des relevés de terrain où la précision n'a pas besoin d'être millimétrique, mais reste plus élevée que celle d'un smartphone standard.
- **Prix** : Environ **500 à 600 USD**, ce qui en fait une solution très abordable pour une précision améliorée.

Recommandation globale

Pour le PNDA où les surfaces agricoles des petits exploitants ne sont pas grandes, mais où une **précision élevée est essentielle**, il est recommandé particulièrement l'**Emlid Reach RS2+**. Il offre une précision centimétrique à un coût relativement abordable, et est compatible avec **GPS Fields Area Measure** via Bluetooth. Il convient aux relevés agricoles de précision tout en étant facile à utiliser avec un smartphone.

Comment acheter

- Ces récepteurs GPS sont disponibles auprès de divers distributeurs et peuvent être commandés en ligne via des sites spécialisés comme :
 - **Emlid Store** (pour Reach RS2+)
 - **Trimble Distributors**

- **Amazon** ou **eBay** pour certaines marques comme Bad Elf.

Facteurs à considérer

- **Précision** : Si la précision centimétrique est impérative (RTK), privilégiez des options comme l'Emlid Reach RS2+ ou le Trimble R2.
- **Budget** : Le coût des récepteurs RTK peut être élevé, donc choisissez en fonction des exigences du projet.
- **Connectivité** : Vérifiez que le récepteur GPS externe choisi est compatible avec votre smartphone ou tablette pour une intégration facile avec l'application GPS Fields Area Measure.

ANNEXE 6 : EXEMPLE DE GUIDE D'ENTRETIENS AUPRÈS DES AGRICULTEURS BÉNÉFICIAIRES

Un guide d'entretien est un outil structuré utilisé pour collecter des informations qualitatives lors des entretiens. Il aide à garantir que toutes les questions pertinentes sont posées et que les données sont collectées de manière systématique et cohérente.

Guide d'entretien avec les bénéficiaires

Date :

Lieu :

Nom de l'enquêteur :

Nom du participant :

Durée estimée :

1. Introduction

1.1. Salutation et introduction

Bonjour, je m'appelle [Nom] et je fais partie de l'équipe de suivi et évaluation du Programme PNDA. Merci de prendre le temps de participer à cet entretien.

1.2. Objectif de l'entretien

L'objectif de cet entretien est de recueillir des informations sur [le sujet de l'entretien, par exemple : les pratiques agricoles, les résultats du Programme, etc.]. Vos réponses nous aideront à évaluer l'impact du Programme et à améliorer ses interventions.

1.3. Confidentialité et consentement

Toutes les informations que vous fournissez seront traitées de manière confidentielle. Avec votre permission, cet entretien sera enregistré pour assurer l'exactitude des données. Acceptez-vous que nous enregistrions cet entretien ? [Obtenir le consentement]

2. Questions d'introduction

2.1. Pouvez-vous me parler brièvement de votre rôle dans le cadre du Programme PNDA ?

- [Réponse libre]

2.2. Depuis combien de temps participez-vous au Programme ?

- [Réponse libre]

3. Questions sur les activités et les pratiques

3.1. Quelles activités spécifiques avez-vous réalisé dans le cadre du Programme ?

- [Réponse libre]

3.2. Comment avez-vous intégré les recommandations ou les technologies proposées par le Programme dans vos pratiques agricoles ?

- [Réponse libre]

3.3. Avez-vous rencontré des difficultés pour mettre en œuvre ces pratiques ? Si oui, lesquelles ?

- [Réponse libre]

4. Questions sur les résultats et les impacts

4.1. Quels résultats avez-vous observé depuis que vous avez commencé à participer au Programme ?

- [Réponse libre]

4.2. Comment évalueriez-vous l'impact du Programme sur votre production ?

- ☐ Très positif
- ☐ Positif
- ☐ Neutre
- ☐ Négatif
- ☐ Très négatif
- Détails : [Réponse libre]

4.3. Avez-vous observé des changements dans vos revenus ou votre qualité de vie en conséquence de votre participation au Programme ?

- [Réponse libre]

5. Questions sur le soutien et les ressources

5.1. Avez-vous reçu un soutien ou une formation du Programme pour vous aider dans vos activités ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- Si oui, comment évaluez-vous la qualité de ce soutien ?
 - ☐ Excellente
 - ☐ Bonne
 - ☐ Moyenne
 - ☐ Insuffisante
 - ☐ Très insuffisante

5.2. Quelles ressources supplémentaires auriez-vous souhaité recevoir pour améliorer vos activités ?

- [Réponse libre]

6. Questions sur les améliorations et les suggestions

6.1. Quelles améliorations suggéreriez-vous pour le Programme afin de mieux répondre à vos besoins ?

- [Réponse libre]

6.2. Y a-t-il d'autres aspects du Programme que vous aimeriez voir développés ou modifiés ?

- [Réponse libre]

7. Conclusion

7.1. Résumé des points clés

Récapituler brièvement les points principaux abordés au cours de l'entretien.

7.2. Remerciements

Merci beaucoup pour votre temps et vos précieuses informations. Votre retour est essentiel pour l'amélioration continue du Programme.

7.3. Questions supplémentaires

- Avez-vous des questions ou des points supplémentaires que vous aimeriez discuter ?
- [Réponse libre]

ANNEXE 7 : EXEMPLE DE GUIDE D'ENTRETIENS AUPRÈS DES UTILISATEURS DES INFRASTRUCTURES RURALES

I. Informations générales

1. **Sexe :**
 - ☐ Homme
 - ☐ Femme
2. **Âge :**
 - ☐ Moins de 25 ans
 - ☐ 25 à 40 ans
 - ☐ 41 à 60 ans
 - ☐ Plus de 60 ans
3. **Province :**

(Nom de la province où l'infrastructure réhabilitée est située)
4. **Communauté / Village :**

(Nom de la communauté ou du village de résidence)
5. **Statut :**
 - ☐ Exploitant agricole
 - ☐ Commerçant
 - ☐ Transporteur
 - ☐ Autre (précisez) : _____

II. Utilisation des infrastructures

6. **À quelle fréquence utilisez-vous les routes/pistes rurales réhabilitées ?**
 - ☐ Tous les jours
 - ☐ 1 à 2 fois par semaine
 - ☐ 1 à 2 fois par mois
 - ☐ Rarement
7. **Pour quelles raisons principales utilisez-vous ces infrastructures ?** (Plusieurs réponses possibles)
 - ☐ Transport de produits agricoles vers les marchés
 - ☐ Transport de marchandises
 - ☐ Accès aux services de santé
 - ☐ Accès à l'école (des enfants)
 - ☐ Visites familiales ou sociales
 - ☐ Autres (précisez) : _____

8. **Avant la réhabilitation des routes, combien de temps preniez-vous pour atteindre le marché le plus proche ?**
- Moins de 30 minutes
 - Entre 30 minutes et 1 heure
 - Entre 1 heure et 2 heures
 - Plus de 2 heures
9. **Après la réhabilitation des routes, combien de temps prenez-vous pour atteindre le marché le plus proche ?**
- Moins de 30 minutes
 - Entre 30 minutes et 1 heure
 - Entre 1 heure et 2 heures
 - Plus de 2 heures

III. Impact économique

10. **Avez-vous constaté une amélioration de vos revenus depuis la réhabilitation des pistes rurales ?**
- Oui
 - Non
 - Ne sait pas
11. **Si oui, pouvez-vous estimer l'augmentation de vos revenus ?**
- Moins de 10 %
 - 10 à 25 %
 - 25 à 50 %
 - Plus de 50 %
 - Je ne sais pas
12. **Depuis la réhabilitation des routes, avez-vous observé une augmentation des prix de vente de vos produits agricoles ?**
- Oui
 - Non
 - Pas applicable
13. **Avez-vous pu accéder à de nouveaux marchés grâce aux routes réhabilitées ?**
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
14. **Avez-vous pu diversifier vos activités économiques (nouveaux produits, services, etc.) grâce à l'amélioration des infrastructures ?**

- Oui
- Non

IV. Perception de la qualité des infrastructures

15. **Comment évaluez-vous la qualité des routes réhabilitées ?**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Mauvaise

16. **Avez-vous observé des dégradations sur les pistes rurales réhabilitées ?**

- Oui
- Non
- Ne sait pas

17. **Si oui, quelles sont les dégradations observées ?**

- Nids de poule
- Éboulements ou glissements de terrain
- Inondations
- Détérioration des ponts
- Autres (précisez) : _____

V. Impact social

18. **L'amélioration des routes a-t-elle facilité l'accès aux services suivants ?** (Cochez toutes les réponses applicables)

- Écoles
- Centres de santé
- Marchés
- Autres (précisez) : _____

19. **Avez-vous observé une augmentation de la fréquentation des marchés locaux depuis la réhabilitation des pistes ?**

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

20. **L'amélioration des routes a-t-elle eu un impact positif sur votre communauté (ex. : augmentation des échanges, nouvelles opportunités d'emploi) ?**

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

VI. Suggestions et recommandations

21. **Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir sur les infrastructures actuelles ?**
(Précisez vos suggestions)
22. **Avez-vous des recommandations pour améliorer l'accès aux marchés pour les petits exploitants agricoles ?**
(Précisez vos recommandations)

ANNEXE 8 : EXEMPLE DE GUIDE D'ENTRETIENS AUPRÈS DES MPME AGRO-INDUSTRIELLES BÉNÉFICIAIRES

Informations générales sur l'entreprise

1. Nom de l'entreprise :
2. Secteur d'activité principal :
 - Fourniture de semences
 - Fourniture d'intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires, etc.)
 - Autres (précisez) : _____
3. Localisation de l'entreprise :
(Province et Ville/Village) _____
4. Année de création de l'entreprise : _____
5. Taille de l'entreprise :
 - Micro (moins de 5 employés)
 - Petite (5 à 10 employés)
 - Moyenne (10 à 20 employés)

Participation au PNDA

7. Depuis combien de temps votre entreprise bénéficie-t-elle du PNDA ?
 - Moins d'un an
 - 1 à 2 ans
 - 2 à 3 ans
 - Plus de 3 ans
8. Quels types de soutien avez-vous reçus du PNDA ? (Cochez toutes les réponses applicables)
 - Financement (subventions, crédits)
 - Formations techniques
 - Assistance pour le développement de produits
 - Autres (précisez) : _____
9. Quels types de semences ou intrants agricoles fournissez-vous dans le cadre du PNDA ?
10. Avez-vous constaté une augmentation de la demande pour vos produits depuis que vous êtes bénéficiaire du PNDA ?
 - Oui
 - Non
 - Ne sait pas

Impact économique du PNDA

11. Le PNDA a-t-il contribué à l'augmentation de vos ventes ?

- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
12. Si oui, pouvez-vous estimer l'augmentation de vos ventes grâce au PNDA ?
- Moins de 10 %
 - 10 à 25 %
 - 25 à 50 %
 - Plus de 50 %
 - Je ne sais pas
13. Le PNDA a-t-il facilité votre accès à de nouveaux marchés ?
- Oui
 - Non
14. Avez-vous diversifié votre offre de produits grâce au soutien du PNDA ?
- Oui
 - Non
15. Depuis que vous êtes bénéficiaire du PNDA, avez-vous pu augmenter vos effectifs (nombre d'employés) ?
- Oui
 - Non
16. Le Programme vous a-t-il permis d'améliorer vos capacités de production (ex. : modernisation des équipements, augmentation de la capacité de stockage) ?
- Oui
 - Non

Renforcement des capacités

17. Avez-vous bénéficié de formations ou de renforcement des capacités dans le cadre du PNDA ?
- Oui
 - Non
18. Si oui, quelles formations avez-vous reçues ? (Cochez toutes les réponses applicables)
- Techniques de production
 - Gestion financière et administrative
 - Accès aux marchés et réseaux de distribution
 - Développement de la chaîne de valeur
 - Autres (précisez) : _____
19. Le PNDA a-t-il facilité l'accès à des financements ou crédits pour votre entreprise ?
- Oui

- Non

Satisfaction et défis

20. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du soutien reçu du PNDA ?
- Très satisfait
 - Satisfait
 - Peu satisfait
 - Pas du tout satisfait
21. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du PNDA ? (Précisez)
22. Avez-vous rencontré des difficultés dans la livraison des semences ou intrants agricoles dans le cadre du PNDA ?
- Oui
 - Non
 - Pas applicable
23. Si oui, quelles sont les principales difficultés rencontrées ?
(Précisez)

Suggestions et recommandations

24. Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir dans le cadre du soutien du PNDA aux MPME agro-industrielles ?
25. Avez-vous des recommandations pour améliorer la fourniture de semences et d'intrants agricoles dans le cadre du PNDA ?

ANNEXE 9 : EXEMPLE DE GUIDE D'ENTRETIENS AUPRÈS DES ORGANISATIONS PAYSANNES BÉNÉFICIAIRES

Informations générales sur l'organisation paysanne (OP)

1. Nom de l'organisation paysanne (OP) :
2. Province :
3. Communauté / Village :
4. Année de création de l'OP :
5. Nombre de membres dans l'OP :
 - Moins de 20
 - 20 à 50
 - 51 à 100
 - Plus de 100
6. Statut légal de l'OP :
 - Enregistrée officiellement
 - Non enregistrée
 - En cours d'enregistrement

Participation au PNDA

7. Depuis combien de temps votre OP bénéficie-t-elle du PNDA ?
 - Moins d'un an
 - 1 à 2 ans
 - 2 à 3 ans
 - Plus de 3 ans
8. Dans quelle(s) composante(s) du PNDA votre OP est-elle impliquée ? (Cochez toutes les réponses applicables)
 - Composante 1 : Amélioration de la productivité agricole
 - Composante 2 : Amélioration de l'accès aux marchés
 - Composante 3 : Fourniture de biens et services agricoles publics
 - Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles
9. Quels types de soutien votre OP a-t-elle reçus du PNDA ? (Cochez toutes les réponses applicables)
 - Formation technique
 - Semences améliorées et intrants agricoles
 - Équipement et matériel agricole
 - Accès à des financements ou subventions
 - Accès à des infrastructures (routes, marchés, etc.)
 - Autres (précisez) : _____

Impact du PNDA sur l'Organisation Paysanne

10. Le PNDA a-t-il permis d'améliorer la productivité agricole de votre OP ?

- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
11. Si oui, comment évaluez-vous l'augmentation de la productivité depuis la participation de votre OP au PNDA ?
- Moins de 10 %
 - 10 à 25 %
 - 25 à 50 %
 - Plus de 50 %
 - Je ne sais pas
12. Le Programme a-t-il facilité l'accès aux marchés pour votre OP ?
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
13. Depuis l'intégration de votre OP dans le PNDA, avez-vous constaté une augmentation du revenu moyen de vos membres ?
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
14. Si oui, pouvez-vous estimer l'augmentation des revenus ?
- Moins de 10 %
 - 10 à 25 %
 - 25 à 50 %
 - Plus de 50 %
 - Je ne sais pas
15. Avez-vous diversifié vos activités agricoles grâce au soutien du PNDA (par exemple, nouvelles cultures ou nouveaux produits) ?
- Oui
 - Non
 - Pas applicable

Renforcement des capacités

16. Le PNDA a-t-il contribué à renforcer les capacités de gestion et d'organisation de votre OP ?
- Oui
 - Non
17. Quels types de formations avez-vous reçus grâce au PNDA ? (Cochez toutes les réponses applicables)

- Gestion administrative et financière
- Techniques agricoles modernes
- Commercialisation et accès aux marchés
- Développement de la chaîne de valeur
- Autres (précisez) : _____

18. Votre OP a-t-elle renforcé ses liens avec d'autres organisations paysannes ou réseaux agricoles grâce au PNDA ?

Oui X Non X

19. Le soutien du PNDA vous a-t-il permis d'améliorer l'accès aux financements ou crédits agricoles ?

Oui X Non X

Satisfaction générale

20. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du soutien du PNDA à votre OP ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

21. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre des activités financées par le PNDA ? (Précisez) _____

22. Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir dans le cadre du soutien du PNDA ? (Précisez) _____

23. Recommanderiez-vous à d'autres organisations paysannes de participer au PNDA ?

Oui X Non X

24. Suggestions et recommandations supplémentaires

25. Avez-vous des suggestions pour améliorer le soutien aux organisations paysannes ? _____

ANNEXE 10 : EXEMPLE DE QUESTIONS POUR LES FOCUS GROUPE

Participants : agriculteurs, représentants du secteur public, organisations paysannes, autres parties prenantes...

Les questions suivantes peuvent être adaptées selon le groupe cible afin d'obtenir des retours diversifiés et complets sur l'impact du PNDA.

Amélioration de la productivité agricole

- Quelles nouvelles technologies ou pratiques agricoles avez-vous adoptées grâce au PNDA ?
- Ces nouvelles pratiques ont-elles eu un impact sur vos rendements agricoles ? Si oui, de quelle manière ?
- Avez-vous eu un accès suffisant aux financements agricoles grâce au PNDA ? Si non, quels ont été les principaux obstacles ?

Accès au marché

- Depuis la mise en œuvre du PNDA, avez-vous remarqué des améliorations dans votre accès aux marchés ? Si oui, quelles sont-elles ?
- Quels types de soutien avez-vous reçu pour faciliter la commercialisation de vos produits ?
- Avez-vous rencontré des défis dans la vente de vos produits sur les marchés locaux ou régionaux ?

Biens et services publics agricoles

- Avez-vous bénéficié des services publics agricoles (comme l'accès aux infrastructures, aux services de vulgarisation ou aux intrants) fournis par le PNDA ?
- Comment évaluez-vous la qualité de ces services ? Quelles améliorations suggéreriez-vous ?
- Pensez-vous que les services publics ont contribué de manière significative à améliorer votre production et vos revenus ?

Urgences agricoles

- Le PNDA vous a-t-il aidé à répondre aux urgences agricoles (sécheresses, inondations, infestations de ravageurs, etc.) ? Si oui, comment ?
- Quelles mesures d'urgence ont été prises par le PNDA dans votre région et quel a été leur impact ?
- Selon vous, que pourrait-on améliorer dans la réponse du PNDA face aux urgences agricoles ?

Renforcement des capacités du secteur public

- Avez-vous observé une amélioration dans l'accompagnement des agents des ministères de l'Agriculture, de la Pêche ou du Développement rural ?
- Comment évaluez-vous la coordination entre les acteurs publics et les producteurs agricoles ?
- Quels sont les défis rencontrés par les agents publics pour soutenir les agriculteurs dans le cadre du PNDA ?

Questions générales

- Quelles sont les principales réussites du PNDA dans votre communauté ?
- Quels défis avez-vous rencontrés dans la mise en œuvre du Programme ?
- Quels aspects du PNDA, selon vous, nécessitent des améliorations pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs ?

ANNEXE 11: CADRE DE MESURE DES RESULTATS ET FICHES DES INDICATEURS



CMR et Fiches
Indicateurs PNDA.xlsx

ANNEXE 12: CANEVAS DU PTBA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

**PROGRAMME NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE**



PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL

ANNEE 202X

PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE : 01 JANVIER 202X – 31 DÉCEMBRE 202X

DATE DE PUBLICATION : JJ-MOIS-ANNEE

Table des matières

Résumé exécutif.....	118
I. Le Programme.....	118
II. Réalisations au 31 décembre de l'année N-1.....	119
1. Composante 1 « améliorer la productivité agricole (y compris les cultures, l'élevage et la pêche) »	119
2. Composante 2 « améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles »	119
3. Composante 3 consiste à « fournir des biens et services publics agricoles ».	119
4. Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles	119
III. Le plan de travail et budget annuel 202X.....	122
III.1 Les objectifs et les activités prévues de l'année 202X.....	122
(i) Composante 1 : productivité agricole	122
(ii) Composante 2 : Accès au marché.....	124
(iii) Composante 3 : Biens et services publics agricoles	126
(iv) Composante 4 : Urgences agricoles.....	128
III.2 Le budget de 202X.....	128
IV. Plan de passation des marchés	129
Annexe.....	130
Annexe 1 : Cadre de mesure des résultats de 202X.....	130
Annexe 2 : Plan de trésorerie	130
Annexe 3 : Plan de formation	130
Annexe 4 : Plan de passation de marché.....	130

Liste des tableaux

TABLEAU 1: NIVEAU D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 202X.....	119
TABLEAU 2: SITUATION DE DECAISSEMENT DEPUIS LE DEMARRAGE DU PROJET	120
TABLEAU 3: SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUE ET FINANCIERE DEPUIS LE DEMARRAGE	121
TABLEAU 4: LES ACTIVITES PREVUES POUR L'ANNEE 202X POUR LA COMPOSANTE 1	123
TABLEAU 5: LES ACTIVITES PREVUES POUR L'ANNEE 202X POUR LA COMPOSANTE 2	125
TABLEAU 6: LES ACTIVITES PREVUES POUR L'ANNEE 202X POUR LA COMPOSANTE 3	127
TABLEAU 7: REPARTITION DU BUDGET PREVU POUR 202X PAR COMPOSANTE ET PAR CATEGORIE DES DEPENSES (EN USD).....	128
TABLEAU 8: SYNTHESE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PAR TYPE DE MARCHE ET PAR METHODE DE PASSATION.....	129

Liste des graphiques

FIGURE 1: REPARTITION DU BUDGET PAR CATEGORIE DE DEPENSES	128
FIGURE 2: REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE.....	128
FIGURE 3: REPARTITION DU BUDGET DE CHAQUE COMPOSANTE PAR CATEGORIE DE DEPENSES	129

Résumé exécutif

Longueur : 1 à 2 pages

Ce résumé exécutif vise à offrir une vue d'ensemble sur tous les Programmes d'activités et budgets pour l'année cible

Structure et Contenu du Résumé Exécutif

Ce rapport présente le plan de travail et le budget annuel du PNDA pour l'année 202X. Il met en lumière les objectifs clés, les activités prévues, le calendrier de mise en œuvre et les ressources financières nécessaires pour poursuivre le développement agricole dans les provinces de Kwilu, Kongo-Central, Kasai-Central, et Kasai.

Objectifs Clés :

Les objectifs pour l'année 202X sont de :

1. XX
2. XX
3. XX
4. XX
- 5.

Principales activités planifiées :

Les activités prioritaires pour 202X incluent :

- XX
- XX
- XX
- XX
- XX

Budget annuel :

Le budget total pour la mise en œuvre des activités en 202X est estimé à XX millions USD, répartis comme suit :

- Productivité agricole : XX millions USD
- Accès aux marchés : XX millions USD
- Services publics agricoles : XX millions USD
- Réponse aux urgences agricoles : XX millions USD

I. Le Programme

Brève description du Programme (1 – 2 pages)

- Objectifs principaux
- Les composantes

II. Réalisations au 31 décembre de l'année N-1

Cette section présente les exécutions techniques et financières pendant l'année N-1.

1. Composante 1 « améliorer la productivité agricole (y compris les cultures, l'élevage et la pêche) »

- Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants
- Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants

Les principales activités réalisées (avec photos si possible)

2. Composante 2 « améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles »

- Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales
- Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur

Les principales activités réalisées (avec photos si possible)

3. Composante 3 consiste à « fournir des biens et services publics agricoles ».

- Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles
- Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme

Les principales activités réalisées (avec photos si possible)

4. Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles

Les principales activités réalisées (avec photos si possible)

Récapitulatif des réalisations techniques et financières

Tableau 19: Niveau d'exécution physique et financière au 31 décembre 202X

Composante	Taux d'exécution physique (en %)	Exécution financière		
		Budget (en \$)	Réalisations (en \$)	Taux d'exécution en %
Composante 1 : productivité agricole				

Sous composante 1.1 : Soutien direct aux petits exploitants				
Sous composante 1.2: _Assistance technique et accès au financement des petits exploitants				
Sous composante 1.3 : Réponse rapide aux urgences agricoles				
Composante 2 : accès au marché pour les petits exploitants agricoles				
Sous composante 2.1 : Infrastructures rurales				
Sous composante 2.2: Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur				
Composante 3 : Biens et services publics agricoles				
Sous composante 3.1: Renforcement des capacités pour la livraison de services publics agricoles				
Sous composante 3.2. : Gestion, suivi et évaluation du Programme				
Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles				
<u>Total</u>				

Commentaires :

XXX

Réalisations cumulées au 31 décembre 202X (année N-1)

Tableau 20: Situation de décaissement depuis le démarrage du projet

Année	Montant en USD	Taux %
XX 2020		
Décembre 2021		

Décembre 2022		
Décembre 2023		
Décembre 2024		
Décembre 2025		

Commentaires

Tableau 21: Situation des réalisations physique et financière depuis le démarrage

Les principales activités	Réalisations techniques			Réalisations financières		
	Objectifs	Réalisations cumulées au 31 décembre 202X	Taux d'exécution (%)	Budget (en\$)	Réalisations cumulées au 31 décembre 202X (en \$)	Taux d'exécution (%)
Nombre de petits exploitants bénéficiaires						
Km de pistes rurales réhabilitées						

Commentaires :

XXX

III. Le plan de travail et budget annuel 202X

III.1 Les objectifs et les activités prévues de l'année 202X

Budget de l'année N: XX \$

(1) Composante 1 : productivité agricole

- *Présentez une vue d'ensemble des objectifs principaux et des attentes pour l'année entière.*
- **Révision et ajustements :** *Mentionnez si des ajustements ont été faits aux objectifs initiaux en réponse à des réalités nouvelles ou à des leçons apprises au cours du temps.*
- **Budget :** XXX \$
- **Activités prévues pour l'année 202X**
 1. **Activité 1.1 :** XX
Modalité de mise en œuvre
 2. **Activité 1.2 :** XX
Modalité de mise en œuvre
 3. **Activité 1.3 :** XX
Modalité de mise en œuvre
 4. **Activité 1.4 :** XX
Modalité de mise en œuvre
 5. **Activité 1.5 :** XX
Modalité de mise en œuvre
 6. **Activité 1.6 :** XX
Modalité de mise en œuvre
 7. **Activité 1.7 :** XX
Modalité de mise en œuvre

Tableau 22: Les activités prévues pour l'année 202X pour la Composante 1

Réf.	Activités prévues	Statut	Produits attendus	Coût (\$)	Mois prévu de réalisation											
					Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1.1	XXXX	N	XX	200 000												
1.2	XXXX	N-1	XX	55 000												
1.3																
1.4																
1.5																
1.6																
1.7																
1.8																

(ii) Composante 2 : Accès au marché

- Présentez une vue d'ensemble des objectifs principaux et des attentes pour l'année entière.
- **Révision et ajustements** : Mentionnez si des ajustements ont été faits aux objectifs initiaux en réponse à des réalités nouvelles ou à des leçons apprises au cours du temps.
- **Budget** : XXX \$
- **Activités prévues pour l'année 202X**

Tableau 23: Les activités prévues pour l'année 202X pour la Composante 2

Réf.	Activités prévues	Statut	Produits attendus	Coût (\$)	Mois prévu de réalisation											
					Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2.1	XXXX	N	XX	200 000												
2.2	XXXX	N-1	XX	55 000												
2.3	XXXX	N	XXXX	32 000												
2.4	XXX	N-1	X	176 000												
2.5																
2.6																
2.7																
2.8																

(iii) Composante 3 : Biens et services publics agricoles

- *Présentez une vue d'ensemble des objectifs principaux et des attentes pour l'année entière.*
- **Révision et ajustements** : *Mentionnez si des ajustements ont été faits aux objectifs initiaux en réponse à des réalités nouvelles ou à des leçons apprises au cours du temps.*
- **Budget** : XXX \$
- **Activités prévues pour l'année 202X**

Tableau 24: Les activités prévues pour l'année 202X pour la Composante 3

Réf.	Activités prévues	Statut	Produits attendus	Coût (\$)	Mois prévu de réalisation											
					Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
3.1	XXXX	N	XX	200 000												
3.2	XXXX	N-1	XX	55 000												
3.3	XXXXX															
3.4	XXXXXX															
3.5																
3.6																
3.7																
3.8																

(iv) Composante 4 : Urgences agricoles

- Présentez une vue d'ensemble des objectifs principaux et des attentes pour l'année entière.
- **Révision et ajustements** : Mentionnez si des ajustements ont été faits aux objectifs initiaux en réponse à des réalités nouvelles ou à des leçons apprises au cours du temps.
- **Budget** : XXX \$
- **Activités prévues pour l'année 202X**

1. **Activité 4.1** : XX

Modalité de mise en œuvre

III.2 Le budget de 202X

Tableau 25: Répartition du budget prévu pour 202X par composante et par catégorie des dépenses (en USD)

Composante Catégorie de dépenses		Composante 1	Composante 2	Composante 3	Composante 4	Total
Travaux de génie	En USD					
	En %					
Fournitures et équipements	En USD					
	En %					
Formations et ateliers	En USD					
	En %					
Services de consultants	En USD					
	En %					
Fonctionnement	En USD					
	En %					
Total	En USD					
	En %	100%	100%	100%	100%	100%

Insérer graphiques (en tarte)

Figure 8: Répartition du budget par catégorie de dépenses

TARTE

Figure 9: Répartition du budget par composante

TARTE

Figure 10: Répartition du budget de chaque composante par catégorie de dépenses

(BARRE _ mettre dans un seul graphique les 3 composantes)

IV. Plan de passation des marchés

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) adossé au présent PTBA 202X, sur la période de janvier à décembre 202X, est résumé dans le tableau 8.

Parler de la composition du PPM par catégorie de dépenses

Le tableau 8 ci-dessous fait la synthèse du PPM pour l'année 202X

Tableau 26: Synthèse du plan de passation des marchés par type de marché et par méthode de passation

(UN EXEMPLE)

Catégorie	Méthode de passation de marchés	Nombre de marchés	%	Montant prévu
Travaux de génie				
Total travaux de génie				
Fournitures et équipements				
Total Fournitures et équipements				
Services de consultants				
Total services de consultants				
Total général				

Commentaires

Annexe

Annexe 1 : Cadre de mesure des résultats de 202X

Les principaux indicateurs pour évaluer les résultats du Programme en 202X

Annexe 2 : Plan de trésorerie

Annexe 3 : Plan de formation

Annexe 4 : Plan de passation de marché

ANNEXE 13 : TABLEAU DE BORD DU PTBA



tableaux de bords de
suivi activités PNDA.xl

ANNEXE 14 : CANEVAS DU RAPPORT DE SUIVI TRIMESTRIEL

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PROGRAMME NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE



L'Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP)

RAPPORT TRIMESTRIEL DE SUIVI

UNITE PROVINCIALE D'EXECUTION DU PROGRAMME (UPEP) : **NOM DE**
L'UPEP(KASAÏ / KASAÏ -CENTRAL/ KWILU/ KONGO-CENTRAL)

XEME TRIMESTRE 202X

DATE DE PUBLICATION : JJ-MOIS-ANNEE

INSERER ICI UNE PHOTO CARACTERISTIQUE DE L'UPEP

Table des matières

Résumé exécutif.....	135
I. Introduction.....	136
I. Principales réalisations physiques du xème trimestre 202X.....	136
I.1 Les faits marquants de la période.....	136
I.2 Les réalisations techniques	136
1. La composante 1 - productivité agricole	136
2. La composante 2 - accès au marché.....	138
3. La composante 3 - biens et services publics agricoles	140
4. Composante 4 - urgences agricoles.....	142
I.3 Principales Difficultés et Mesures à Prendre.....	142
1. La composante 1 « améliorer la productivité agricole	142
2. La composante 2 « améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles »	143
3. La composante 3 « fournir des biens et services publics agricoles ».	143
4. Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles.....	143
I.4 Gestion financière.....	143
I.5 Prochaines étapes et actions à venir.....	143
Annexes.....	143

Liste des tableaux

TABEAU 1: LES ACTIVITES REALISEES AU TRIMESTRE X 202X POUR LA COMPOSANTE 1.....	137
TABEAU 2: LES ACTIVITES REALISEES AU TRIMESTRE X 202X POUR LA COMPOSANTE 2.....	139
TABEAU 3: LES ACTIVITES REALISEES AU TRIMESTRE X 202X POUR LA COMPOSANTE 3.....	141

Résumé exécutif

Longueur : Une à deux pages maximum (500 à 800 mots environ)

Ce résumé exécutif donne un aperçu succinct des principaux points du rapport, y compris les activités réalisées, les défis, et les recommandations clés. En gardant le résumé exécutif concis et structuré, il permet aux lecteurs de saisir rapidement l'essentiel du rapport, favorisant une compréhension rapide et pouvant guider les discussions et décisions nécessaires sans entrer dans le détail de chaque section du rapport.

Structure et contenu du résumé exécutif

- ✓ *Introduction (1-2 paragraphes)*
 - **Contexte :** Présentez brièvement le Programme, ses objectifs principaux, et le cadre du rapport trimestriel.
 - **Période couverte :** Mentionnez la période spécifique couverte par le rapport (par exemple, du 1^{er} janvier au 31 mars 2024).
- ✓ *Principaux progrès et accomplissements (3-4 paragraphes)*
 - **Réalisations :** Décrivez les principales activités et réalisations du trimestre par sous-composante, en mettant en évidence les progrès vers les objectifs du Programme.
 - **Indicateurs clés de performance :** Résumez les indicateurs clés atteints et comment ils se comparent aux objectifs prévus.
- Défis et problèmes rencontrés (1-2 paragraphes)*
 - **Obstacles :** Identifiez les problèmes majeurs ou obstacles rencontrés.
 - **Solutions apportées :** Décrivez les mesures correctives prises pour surmonter ces défis.
- ✓ *Analyse financière (1 paragraphe)*
 - **Dépenses :** Donnez un aperçu des dépenses par rapport au budget et le taux de décaissement, et mentionnez tout écart budgétaire significatif.
 - **Utilisation des ressources :** Commentez sur l'efficacité de l'utilisation des ressources.
- ✓ *Conclusions et perspectives (1-2 paragraphes)*
 - **Évaluation générale :** Donnez une évaluation globale du statut du Programme à la fin de ce trimestre.
 - **Actions futures :** Énumérez les priorités et les actions prévues pour le prochain trimestre.

I. Introduction

L'introduction d'un rapport trimestriel est essentielle pour situer le lecteur dans le contexte du Programme et le préparer à comprendre les détails qui suivront.

Longueur : L'introduction devrait généralement être d'une demi-page à une page (environ 200 à 300 mots)

Voici une structure typique pour l'introduction, ainsi que les éléments de contenu à inclure

- ✓ *Contexte synthétique du Programme (1 paragraphe)*
 - **Rappel succinct** : Mentionnez brièvement l'objectif général du Programme et sa justification, sans trop de détail.
 - **État actuel** : Indiquez toute évolution notable du Programme, du cadre de mise en œuvre ou de l'environnement externe depuis le dernier rapport.
- ✓ *Objectifs du Trimestre (1 paragraphe)*
 - **Objectifs spécifiques** : Détailler les objectifs ou résultats spécifiques que le Programme visait durant le trimestre couvert par le rapport.
 - **Focus du trimestre** : Soulignez toute priorité ou initiative nouvelle mise en œuvre pendant cette période.
- ✓ *Résumé des activités clés (1 paragraphe)*
 - **Résumé des activités** : Donnez un aperçu des principales activités entreprises pendant le trimestre.

I. Principales réalisations physiques du xème trimestre 202X

I.1 Les faits marquants de la période

Parlez des événements marquant de la période éventuellement, qui ont eu des conséquences notables ou qui sont importants pour le Programme

I.2 Les réalisations techniques

*Cette partie sert à rendre compte les réalisations techniques et physiques durant la période concernée, **par composante** (se référer au PBT A). Les annexes se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs*

1. La composante 1 - productivité agricole

- Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants
- Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants
 - *Description des activités planifiées vs réalisées*
 - *Observations* : Notez toutes les observations importantes sur l'activité. Ça peut être une analyse sur les écarts entre la réalisation et la prévision.
 - *Graphiques ou tableaux pour illustrer les progrès*

Tableau 27: Les activités réalisées au trimestre X 202X pour la composante 1

Activités	Prévisions xème trimestre (xx 202X à xx 202X) (A)	Réalisation xème trimestre (xx 202X à xx 202X) (B)	Résultats	Taux de réalisation (%) (C) = (B)/(A)	Observations
Enregistrer les petits exploitants agricoles dans la zone du PNDA	5 000	4 000	Environ 4 000 petits exploitants enregistrés durant le trimestre bénéficiaires des incitations. Ils ont pu bénéficier	80%	
Formation des petits exploitants agricoles	2 000	2 000	Les X petits exploitants ont reçu la formations sur	100%	

2. La composante 2 - accès au marché

- Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales
- Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur
 - *Description des activités planifiées vs réalisées*
 - *Observations : Notez toutes les observations importantes sur l'activité. Ça peut être une analyse sur les écarts entre la réalisation et la prévision.*
 - *Graphiques ou tableaux pour illustrer les progrès*

Tableau 28: Les activités réalisées au trimestre X 202X pour la composante 2

Activités	Prévisions xème trimestre (xx 202X à xx 202X) (A)	Réalisation xème trimestre (xx 202X à xx 202X) (B)	Résultats	Taux de réalisation (%) (C) = (B)/(A)	Observations

3. La composante 3 - biens et services publics agricoles

- Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles
- Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme
 - *Description des activités planifiées vs réalisées*
 - *Observations : Notez toutes les observations importantes sur l'activité. Ça peut être une analyse sur les écarts entre la réalisation et la prévision.*
 - *Graphiques ou tableaux pour illustrer les progrès*

Tableau 29: Les activités réalisées au trimestre X 202X pour la composante 3

Activités	Prévisions x ^{ème} trimestre (xx 202X à xx 202X) (A)	Réalisation x ^{ème} trimestre (xx 202X à xx 202X) (B)	Résultats	Taux de réalisation (%) (C) = (B)/(A)	Observations

4. Composante 4 - urgences agricoles

- Description des activités planifiées vs réalisées
- Observations : Notez toutes les observations importantes sur l'activité. Ça peut être une analyse sur les écarts entre la réalisation et la prévision.
- Graphiques ou tableaux pour illustrer les progrès

I.3 Principales Difficultés et Mesures à Prendre

Cette section fournit une mise à jour claire et concise sur les difficultés rencontrées et les efforts déployés pour y remédier, tout en offrant des conseils et recommandations pour l'avenir. Cela permettra aux gestionnaires et aux parties prenantes de bien comprendre l'état actuel du Programme et les actions nécessaires pour améliorer sa mise en œuvre

Les points suivants seront abordés pour chaque composante du Programme

- ✓ *Défis majeurs : Présentez les défis et obstacles rencontrés durant le trimestre.*

Cela pourrait inclure des

- Problèmes logistiques, de planification ou organisationnels.
- Difficultés liées à la participation des parties prenantes.
- Limites financières ou de ressources humaines.
- Facteurs externes (économiques, sociaux, environnementaux) affectant le Programme.

- ✓ *Analyse des écarts: Discutez des écarts entre les résultats escomptés et les résultats réels.*

- Identification des activités ou résultats qui n'ont pas été atteints et analyse des raisons de ces écarts.

- ✓ *Mesures à prendre : Décrivez les mesures correctives ou les ajustements qui ont été mis en place pour surmonter les difficultés identifiées.*

Cela peut inclure les

- Stratégies spécifiques développées pour adresser les défis logistiques ou d'engagement.
- Ajustements budgétaires ou réaffectations de ressources.
- Approches alternatives adoptées pour mieux atteindre les bénéfices escomptés.

- ✓ *Recommandations pour les prochains trimestres : Proposez des recommandations basées sur l'analyse des défis rencontrés.*

Cela peut inclure les

- Suggestions pour améliorer la mise en œuvre au cours des prochains trimestres.
- Propositions d'actions préventives pour éviter la récurrence des problèmes identifiés.

1. La composante 1 « améliorer la productivité agricole

- i. Défis Majeurs
- ii. Analyse des Écarts
- iii. Mesures à Prendre
- iv. Recommandations pour l'Avenir

2. La composante 2 « améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles »

- i. Défis Majeurs*
- ii. Analyse des Écarts*
- iii. Mesures à Prendre*
- iv. Recommandations pour l'Avenir*

3. La composante 3 « fournir des biens et services publics agricoles ».

- i. Défis Majeurs*
- ii. Analyse des Écarts*
- iii. Mesures à Prendre*
- iv. Recommandations pour l'Avenir*

4. Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles

- i. Défis Majeurs*
- ii. Analyse des Écarts*
- iii. Mesures à Prendre*
- iv. Recommandations pour l'Avenir*

I.4 Gestion financière

- Aperçu des dépenses financières par rapport au budget
- Tableaux financiers montrant les dépenses, les engagements, le taux de décaissement et les écarts budgétaires
- Commentaires sur la performance financière et la gestion des ressources

I.5 Prochaines étapes et actions à venir

- Activités prévues pour le prochain trimestre
- Ajustements nécessaires à la stratégie du Programme
- Priorités pour la période à venir

Annexes

- Données détaillées et analyses supplémentaires
- Cartes, diagrammes ou graphiques complétant les sections principales
- Documents de soutien comme les questionnaires d'évaluation

ANNEXE 15: CANEVAS DU RAPPORT ANNUEL

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PROGRAMME NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE



L'Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP)

RAPPORT SEMESTRIEL/ANNUEL

UNITE PROVINCIALE D'EXECUTION DU PROGRAMME (UPEP) : **NOM DE
L'UPEP(KASAÏ /KASAÏ -CENTRAL/KWILU/KONGO-CENTRAL)**

PÉRIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: **XXXX**

DATE DE PUBLICATION : **JJ-MOIS-ANNEE**

INSERER ICI UNE PHOTO CARACTERISTIQUE DE L'UPEP

Table des matières

Résumé exécutif	148
Introduction	150
I. Méthodologie de suivi et collecte des données	151
II. Progression des activités.....	151
Composante 1 : améliorer la productivité agricole	152
Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants.....	152
Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants	152
Composante 2 : améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles.....	152
Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales	152
Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur.....	152
Composante 3 : fournir des biens et services publics agricoles	152
Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles	152
Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme	152
Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles	152
III. Suivi des indicateurs de performance.....	153
Composante 1 : améliorer la productivité agricole	154
Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants.....	154
Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants	154
Composante 2 : améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles.....	154
Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales	154
Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur.....	154
Composante 3 : « fournir des biens et services publics agricoles ».....	154
Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles	154
Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme	154
Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles	154
IV. Principales difficultés et mesures à prendre.....	155
Composante 1 : améliorer la productivité agricole	156
Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants.....	156
Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants	156
Composante 2 : améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles.....	156
Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales	156
Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur.....	156
Composante 3 : fournir des biens et services publics agricoles	156
Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles	156
Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme	156

V. Réalisations et résultats spécifiques	157
VI. Gestion financière.....	157
VII. Prochaines étapes et actions à venir	157
VIII. Annexes	158

Résumé exécutif

Longueur : Deux à trois pages maximums

Ce résumé exécutif du rapport semestriel/ annuel vise à offrir une vue d'ensemble plus complète, intégrant une analyse rétrospective, une comparaison avec les objectifs annuels, et une perspective stratégique pour l'avenir. Cela aide les parties prenantes à se faire une idée claire des performances globales et des impacts à long terme du Programme.

Structure et Contenu du Résumé Exécutif

- ✓ *Introduction (1-2 paragraphes)*
 - **Résumé de la période écoulée :** *Contrairement à un rapport trimestriel, le rapport semestriel/ annuel devrait offrir un aperçu de l'année dans son ensemble, en mentionnant les grandes lignes du contexte dans lequel le Programme a évolué.*
 - **Objectifs semestriels/ annuels :** *Présentez les principaux objectifs fixés pour le Programme pour le semestre/ l'année entière, plutôt que de se limiter aux objectifs d'un seul trimestre.*
- ✓ *Principaux résultats et réalisations (3-4 paragraphes)*
 - **Réalisations** *Identifiez les réalisations majeures et les succès du Programme dans sa globalité sur l'année, en s'attardant sur les résultats et les impacts significatifs.*
 - **Indicateurs clés de performance / comparaison Année-année :** *Si pertinent, comparez les performances de l'année avec celles des années précédentes pour mettre en lumière l'évolution ou les améliorations.*
- ✓ *Défis et problèmes rencontrés (1-2 paragraphes)*
 - **Obstacles :** *Faites une synthèse des principaux défis de l'année, expliquant pourquoi ils ont été particulièrement significatifs.*
 - **Solutions apportées et leçons apprises :** *Discutez des actions prises pour relever ces défis, des résultats de ces interventions à moyen et long terme et les leçons apprises*
- ✓ *Analyse financière (1 paragraphe)*
 - **Dépenses :** *Présentez les principales catégories de dépenses et comment elles se comparent au budget alloué. Soulignez les variations significatives entre les dépenses programmées et les dépenses réelles*
 - **Écarts budgétaires :** *Identifiez les écarts notables entre le budget prévu et les dépenses réelles, en mentionnant brièvement les raisons principales de ces écarts. Indiquez si des ajustements budgétaires ont été nécessaires durant l'année.*
 - **Utilisation des ressources** *Discutez de l'efficacité de la gestion des ressources financières. Cela peut inclure des exemples de réduction des coûts ou d'optimisation des ressources qui ont eu un impact positif sur le Programme.*
- ✓ *Évaluation de l'Impact*
 - **Impact à long terme :** *Analysez l'impact cumulatif du Programme à travers l'année, en intégrant une vue claire sur comment il contribue aux objectifs généraux.*
- ✓ *Conclusions et perspectives (1-2 paragraphes)*

- **Évaluation générale** : Donnez une évaluation globale de la performance : à quel point les objectifs ont-ils été atteints ?
- **Orientations Stratégiques** : Proposez des recommandations stratégiques basées sur les leçons apprises durant l'année, indiquant les orientations futures pour améliorer la performance à l'avenir.

Introduction

Cette introduction prépare le lecteur à une compréhension contextualisée des réalisations et des défis tout en mettant en perspective les stratégies futures à envisager pour améliorer le Programme. Cela va au-delà de simplement gérer des résultats trimestriels et se concentre sur une vue d'ensemble semestriel/ annuelle et stratégique.

Longueur : L'introduction devrait généralement être de deux à trois pages (environ 600 à 900 mots)

Voici une structure typique pour l'introduction, ainsi que les éléments de contenu à inclure

- ✓ *Étendu du Programme (1-2 paragraphes)*
 - **Présentation** : Rappelez brièvement le but général du Programme, sa mission et sa portée, en introduisant tout changement significatif survenu depuis le début de l'année.
 - **Évolutions et tendances annuelles** : Discutez des évolutions remarquables dans le cadre de mise en œuvre, des faits marquants externes (comme des changements politiques, économiques ou sociaux), et comment ils ont influencé le Programme tout au long de l'année.
- ✓ *Objectifs de l'année (1 paragraphe)*
 - **Objectif annuel** : Présentez une vue d'ensemble des objectifs principaux et des attentes pour l'année entière.
 - **Révision et ajustements** : Mentionnez si des ajustements ont été faits aux objectifs initiaux en réponse à des réalités nouvelles ou à des leçons apprises au cours du temps.
- ✓ *Orientation et but du Rapport Annuel (1 paragraphe)*
 - **But du rapport** : Expliquez ce que le rapport annuel vise à fournir, tel qu'une évaluation globale de la performance du Programme, les analyses financières, et les stratégies futures.
 - **Questions clés** : Soulignez les questions majeures abordées dans le rapport, qui sont pertinentes pour l'évaluation du succès ou des ajustements stratégiques futurs.

I. Méthodologie de suivi et collecte des données

Cette section présente les sources de données utilisées dans ce rapport.

Outils de suivi : Quels sont les outils utilisés pour le suivi ? (Questionnaires, enquêtes, focus groups).

Sources d'information : Quelles sont les sources des données ? (Enquêtes de terrain, rapports des partenaires, statistiques des services publics).

Période et équipe responsable : Dates de la collecte de données et noms des équipes impliquées.

II. Progression des activités

Cette section devrait offrir une vue d'ensemble complète et nuancée des activités réalisés par le Programme sur une base semestrielle/annuelle.

Vue d'ensemble des activités semestrielles/annuelles par composante

- **Activités planifiées vs réalisées** : *Présentez un tableau ou un résumé des activités clés planifiées pendant le semestre/ tout au long de l'année et la mesure dans laquelle elles ont été réalisées. Soulignez les différences notables et le contexte qui les a influencées.*
- **Explication des écarts** : *Analysez les différences entre les prévisions et la réalité, et les raisons pour lesquelles certains objectifs n'ont pas été atteints.*
- **Initiatives majeures** : *Décrivez les initiatives significatives qui ont eu lieu pendant l'année, mettant en lumière les efforts continus et les ajustements en cours de route.*

Composante 1 : améliorer la productivité agricole

Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

Composante 2 : améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles

Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

Composante 3 : fournir des biens et services publics agricoles

Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles

- Activités planifiées vs réalisées
- Explications des écarts
- Initiatives majeures

III. Suivi des indicateurs de performance

Évaluation des résultats

- **Indicateurs de performance :** *Analysez les résultats obtenus en fonction des indicateurs de performance clés sur l'ensemble de l'année. Offrez une évaluation comparative pour montrer l'évolution par rapport aux années précédentes, si possible (hausse ou baisse). UTILISEZ LES FICHES D'INDICATEURS*
- **Analyse des écarts :** *Analysez les écarts avec les indicateurs cibles, expliquez les éventuels importants écarts.*
- **Impacts et réalisations significatives :** *Mettez en avant les impacts à court et moyen terme des activités effectuées, tout en fournissant des études de cas ou des témoignages pour illustrer les réussites. FOCUS GROUP, ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES*

Illustration des progrès

- **Graphiques et tableaux :** *Utilisez des graphiques, des tableaux, et des infographies pour représenter visuellement les progrès accomplis, montrant clairement les changements quantitatifs et qualitatifs.*
- **Comparatif Année-année :** *Incluez des comparaisons entre les différentes années si cela est pertinent, ce qui aide à contextualiser les progrès dans une perspective plus longue.*

Exemple de tableau d'illustration de progrès

Indicateur	Cible finale	Cible année N	Réalisé année N		Commentaire
Nombre d'organisations fermières et agro-MPME dirigées par des femmes	28	14	12	85,7%	

Composante 1 : améliorer la productivité agricole

Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

Composante 2 : améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles

Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

Composante 3 : « fournir des biens et services publics agricoles »

Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

Composante 4 : Réponse aux urgences agricoles

- Évaluation des résultats
- Illustration des progrès

IV. Principales difficultés et mesures à prendre

Cette section offre une analyse des défis rencontrés durant le semestre/l'année et explore comment le Programme a réussi à s'adapter et évoluer. Elle est essentielle pour informer la stratégie future du Programme, en assurant que les leçons sont effectivement appliquées pour améliorer l'efficacité et la durabilité du Programme à long terme.

Les points suivants seront abordés pour chaque composante du Programme

Problèmes rencontrés

- **Identification des défis clés :** *Présentez les principaux défis qui ont impacté le Programme au cours de l'année. Cela peut inclure des obstacles internes comme la gestion des ressources, les retards, les difficultés techniques, la coordination, des défis externes tels que des changements politiques ou économiques, et des imprévus environnementaux ou sociaux.*
- **Impact des défis :** *Discutez de l'ampleur de l'impact de ces défis sur le Programme et ses objectifs, précisant quels aspects du Programme ont été les plus affectés.*

Stratégies et solutions adoptées

- **Mesures correctives :** *Décrivez les actions et solutions mises en œuvre pour adresser ces défis. Cela peut inclure l'adoption de nouvelles approches, la réaffectation de ressources, ou la collaboration accrue avec les partenaires.*
- **Innovation et adaptation :** *Soulignez les innovations ou changements de stratégie qui ont été initiés pour faire face efficacement aux défis.*

Évaluation des résultats des solutions

- **Réussite des solutions :** *Discutez de l'efficacité des solutions mises en place et des résultats obtenus. Fournissez des exemples spécifiques de succès ou d'améliorations notables.*
- **Leçons tirées des solutions :** *Évaluez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré, pour mieux gérer des défis similaires à l'avenir.*

Leçons générales apprises

- **Analyse critique :** *Dégagez les leçons clés apprises au cours de l'année à partir des défis et solutions abordés, soulignant comment ces leçons influenceront la gestion future du Programme.*
- **Intégration des leçons :** *Proposez des recommandations sur comment intégrer ces leçons dans la planification stratégique future, afin d'améliorer l'efficacité et la résilience du Programme.*

Composante 1 : améliorer la productivité agricole

Sous-composante 1.1 : Appui direct aux petits exploitants

- Défis majeurs
- Stratégies et solutions
- Recommandations pour l'avenir

Sous-composante 1.2 : Assistance technique et accès au financement des petits exploitants

- Défis majeurs
- Stratégies et solutions
- Recommandations pour l'avenir

Composante 2 : améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles

Sous-composante 2.1 : Infrastructures rurales

- Défis majeurs
- Stratégies et solutions
- Recommandations pour l'avenir

Sous-composante 2.2 : Appui à l'inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur

- Défis majeurs
- Stratégies et solutions
- Recommandations pour l'avenir

Composante 3 : fournir des biens et services publics agricoles

Sous-composante 3.1: Renforcement des capacités pour la fourniture de services publics agricoles

- Défis majeurs
- Stratégies et solutions
- Recommandations pour l'avenir

Sous-composante 3.2 : Gestion, suivi et évaluation du Programme

- Défis majeurs
- Stratégies et solutions
- Recommandations pour l'avenir

V. Réalisations et résultats spécifiques

Réalisations par province

Description des résultats par province : *Analysez les résultats obtenus dans chaque province (Kwilu, Kongo-Central, Kasai-Central, et Kasai). Illustrez par des graphiques de comparaison*

Succès particuliers

Activités à fort impact : *Présentez les projets ou actions ayant eu un impact significatif.*

Études de cas

Donnez des exemples concrets, par exemple parlez des études de cas illustrant les réussites ou les défis sur le terrain.

VI. Gestion financière

Cette section est dédiée à l'analyse complète de la gestion financière du Programme. Elle vise à donner une image claire des flux financiers, des tendances des dépenses, et de la performance budgétaire au cours de la période concernée.

Vue d'ensemble Financière

Résumé général de la situation financière : Présentez un aperçu des dépenses totales comparées au budget annuel alloué. Discutez des tendances observées dans l'année, par exemple, des périodes de dépenses plus intenses.

Tableaux financiers annuels : Incluez des tableaux ou graphiques montrant les dépenses, les engagements, le taux de décaissement, et toute variance budgétaire notable. Cette analyse permettra de visualiser le flux financier dans le temps.

Écarts Budgétaires : Analysez les écarts entre le budget prévu et les dépenses réelles, avec des explications concernant les dépassements ou économies.

Performance et Gestion des Ressources

Commentaires et Insights : Fournissez des commentaires sur la performance financière globale. Discutez de l'efficacité de l'utilisation des ressources, en soulignant toute amélioration dans la gestion financière par rapport aux périodes précédentes.

Bilan et Recommandations : Concluez avec des recommandations pour améliorer la gestion financière à l'avenir, en fonction des observations effectuées durant l'année.

VII. Prochaines étapes et actions à venir

Plan d'actions prioritaires : Identifiez les actions prioritaires pour la prochaine période (ex. évaluation à mi-parcours, rapport trimestriel, ateliers de renforcement des capacités).

Jalons importants : Prévision d'événements clés à venir.

VIII. Annexes

- **Rapports de suivi détaillés** : Inclusion des données complètes collectées sur le terrain.
- **Outils utilisés** : Modèles de questionnaires, guides d'entretiens, etc.
- **Illustrations** : Photos des réalisations ou activités.
- **Tableaux détaillés** : Indicateurs ventilés par province.

ANNEXE 16: EXEMPLE D'UN RAPPORT DE CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

**PROGRAMME NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE**



RAPPORT DE CAPITALISATION DES EXPERIENCES

DATE DE PUBLICATION : JJ-MOIS-ANNEE

Résumé Exécutif

Objectif du rapport : Documentez et capitalisez les expériences, les succès, et les leçons apprises au cours de la mise en œuvre du PNDA

Résumé des expériences clés :

- Exemple : Mise en œuvre réussie des techniques améliorées d'arachide
- Exemple : Défis rencontrés dans l'amélioration des infrastructures pour améliorer l'accès au marché

Contexte et Objectifs

Contexte : Décrivez le contexte dans lequel les expériences ont été réalisées, par exemple : "Dans le cadre de l'amélioration des pratiques agricoles, le projet a introduit de nouvelles techniques dans les provinces ciblées."

Objectifs de la Capitalisation :

- Objectif 1 : Décrire les objectifs, par exemple : "Évaluer l'efficacité des nouvelles techniques agricoles."
- Objectif 2 : Décrire les objectifs

Description des Expériences

Expérience 1: [Nom ou titre de l'expérience]

Description : [Détail de l'expérience, par exemple : "Introduction de techniques de culture utilisant des semences améliorées et des pratiques de gestion de l'eau."]

Durée : [Date de début - Date de fin]

Résultats : [Résumé des résultats obtenus, par exemple : "Augmentation de la productivité agricole de 20%."]

Facteurs de succès : [Éléments qui ont contribué au succès, par exemple : "Formation adéquate des agriculteurs et soutien technique."]

Défis Rencontrés : [Difficultés rencontrées, par exemple : "Retards dans la livraison des semences."]

Leçons Apprises : [Leçons tirées, par exemple : "La planification précoce et la coordination sont essentielles pour éviter les retards."]

Expérience 2: [Nom ou titre de l'expérience]

Description : [Détail de l'expérience]

Durée : [Date de début - Date de fin]

Résultats : [Résumé des résultats]

Facteurs de Succès : [Éléments qui ont contribué au succès]

Défis Rencontrés : [Difficultés rencontrées]

Leçons Apprises : [Leçons tirées]

Analyse des Résultats

Analyse des Succès

- Analyse des succès rencontrés, par exemple : "Les techniques de culture ont montré des améliorations significatives en productivité grâce à l'application de pratiques adaptées aux conditions locales."

Analyse des Défis

- Analyse des défis rencontrés, par exemple : "Les défis liés aux infrastructures ont entravé l'accès aux marchés pour les produits agricoles."

Impact des Leçons Apprises

- Impact des leçons apprises sur le projet, par exemple : "Les leçons apprises ont conduit à une révision des stratégies de mise en œuvre et à une meilleure planification pour les phases suivantes."

Recommandations pour le Futur

Recommandation 1 : [Description de la recommandation, par exemple : "Renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation pour mieux anticiper les problèmes."]

Responsable : [Nom ou poste de la personne responsable de la mise en œuvre]

Date de Mise en Œuvre : [Date prévue ou effective]

Recommandation 2 : [Description de la recommandation]

Responsable : [Nom ou poste de la personne responsable de la mise en œuvre]

Date de Mise en Œuvre : [Date prévue ou effective]

Annexes

- Annexe 1 : Documents supplémentaires (Photographies, Tableaux de données)
- Annexe 2 : Autres documents supplémentaires

